

PIANO CANTIERI INAMOVIBILI SINO AL 30.06.2026

*Interventi di manutenzione e riqualificazione della rete
autostradale Ligure*

Tavolo di coordinamento del 12.02.2026



Concessioni del Tirreno



AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CANTIERI

- 03 ANALISI DELLE TURBATIVE AL TRAFFICO DAL 7 AL 30 GENNAIO 2026
- 04 NOTE GENERALI
- 05 PROGRAMMA CANTIERI DA MERCOLEDI' 12/02 A DOMENICA 15/02
- 06 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 16/02 A DOMENICA 22/02
- 07 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 23/02 A DOMENICA 01/03
- 08 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 02/03 A DOMENICA 08/03
- 09 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 09/03 A DOMENICA 15/03
- 10 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 16/03 A DOMENICA 22/03
- 11 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 23/03 A DOMENICA 29/03
- 12 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 30/03 ALLE 14.00 DI GIOVEDI' 2/04
- 13 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 2/04 ALLE ORE 12,00 DI MARTEDI' 7/04
- 14 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 12.00 DI MARTEDI' 7/04 A DOMENICA 12/04
- 15 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 13/04 A DOMENICA 19/04
- 16 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 20/04 A DOMENICA 26/04
- 17 PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 27/04 ALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 30/04
- 18 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 30/04 ALLE ORE 12.00 DI LUNEDI' 4/05
- 19 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 12.00 DI LUNEDI' 4/05 SINO ALLE ORE 14.00 DI VENERDI' 29/05
- 20 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI VENERDI' 29/05 SINO ALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDI' 3/06
- 21 PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDI' 3/06 A MERCOLEDI' 30/06
- 22-23 MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEI CANTIERI SUL TRAFFICO



GALLERIA FORNCI: ANALISI DELLE TURBATIVE AL TRAFFICO

DAL 7 AL 30 GENNAIO 2026

Dalla data di installazione del cantiere Fornaci (7.01.2026) al 30.01.2026 2026 si sono verificate turbative al traffico che hanno generato accodamenti di estensione massima (km) indicati nella tabella qui a fianco:



giorno	direzione Francia	direzione Italia
07/01/2026	0	0
08/01/2026	1	0
09/01/2026	2	0
10/01/2026	2,1	2
11/01/2026	0	4,7
12/01/2026	2	0,7
13/01/2026	2	0,9
14/01/2026	1	1,7
15/01/2026	2	0,8
16/01/2026	3	1,7
17/01/2026	0	0
18/01/2026	0	0
19/01/2026	4.4	1
20/01/2026	2	2
21/01/2026	3	1
22/01/2026	2	0,7
23/01/2026	1	0,7
24/01/2026	1	0
25/01/2026	0	3
26/01/2026	1	0,7
27/01/2026	2	2
28/01/2026	3,1	1
29/01/2026	2,6	1,5
30/01/2026	2	0

PROGRAMMA CANTIERI – NOTE GENERALI

N.B: nella grafica non sono indicate le chiusure notturne e piccoli cantieri giornalieri amovibili, in quanto gli stessi non sono ritenuti impattanti in termini di code. Nel piano rappresentato non sono inoltre indicate le segnaletiche di riduzione giornaliera amovibili in caso di criticità.

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

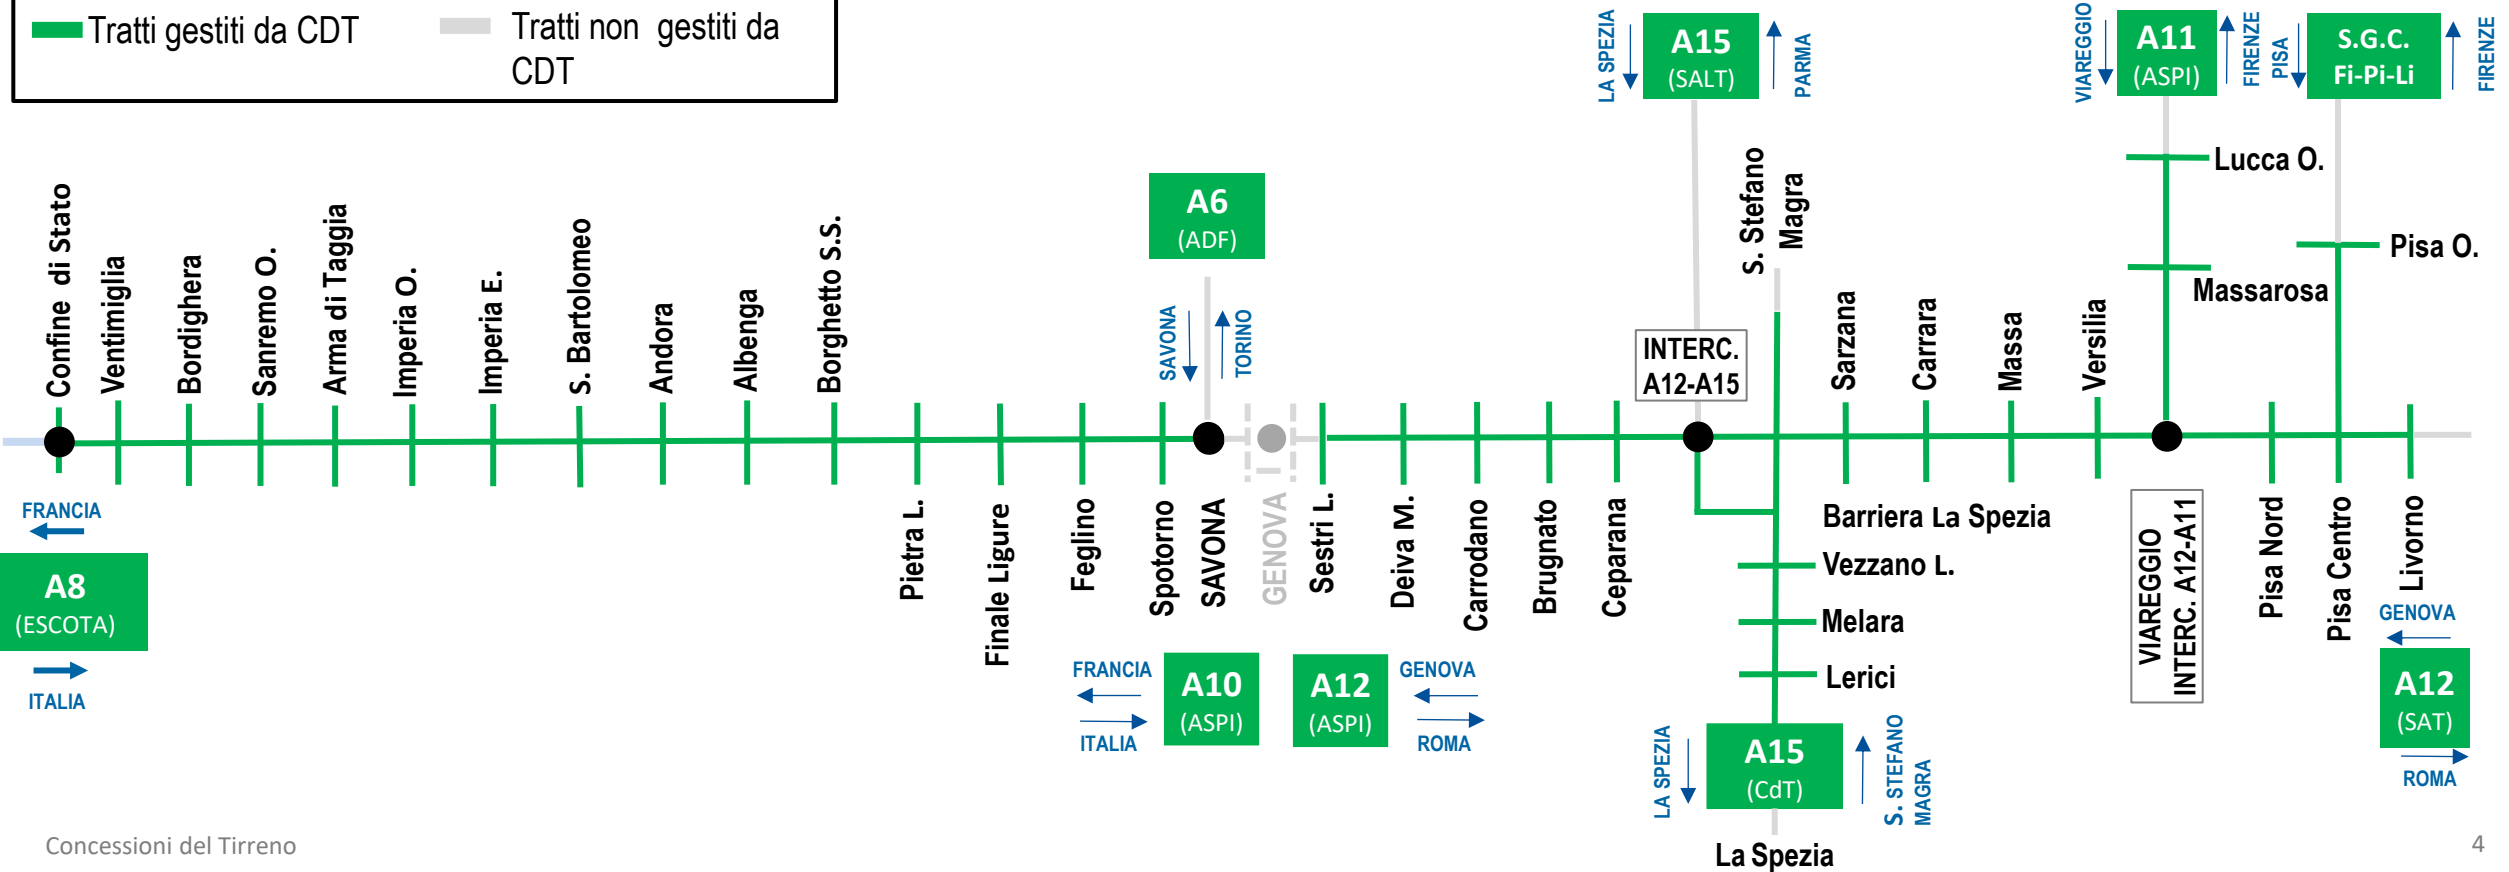
Tratti gestiti da CDT

Tratti non gestiti da CDT

LEGENDA INTERVENTI	
Interventi Ponti, Viadotti	Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06	
Interventi su barriere di sicurezza	
Barriere acustiche	
Manutenzione	

Cantieri nei quali è possibile assicurare 2 corsie nella direzione di traffico prevalente nei fine settimana dei periodi primaverile/estivo

Cantiere rimosso nei fine settimana ✕



PROGRAMMA CANTIERI DA MERCOLEDI' 12/02 A DOMENICA 15/02

**NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1**

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI


 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

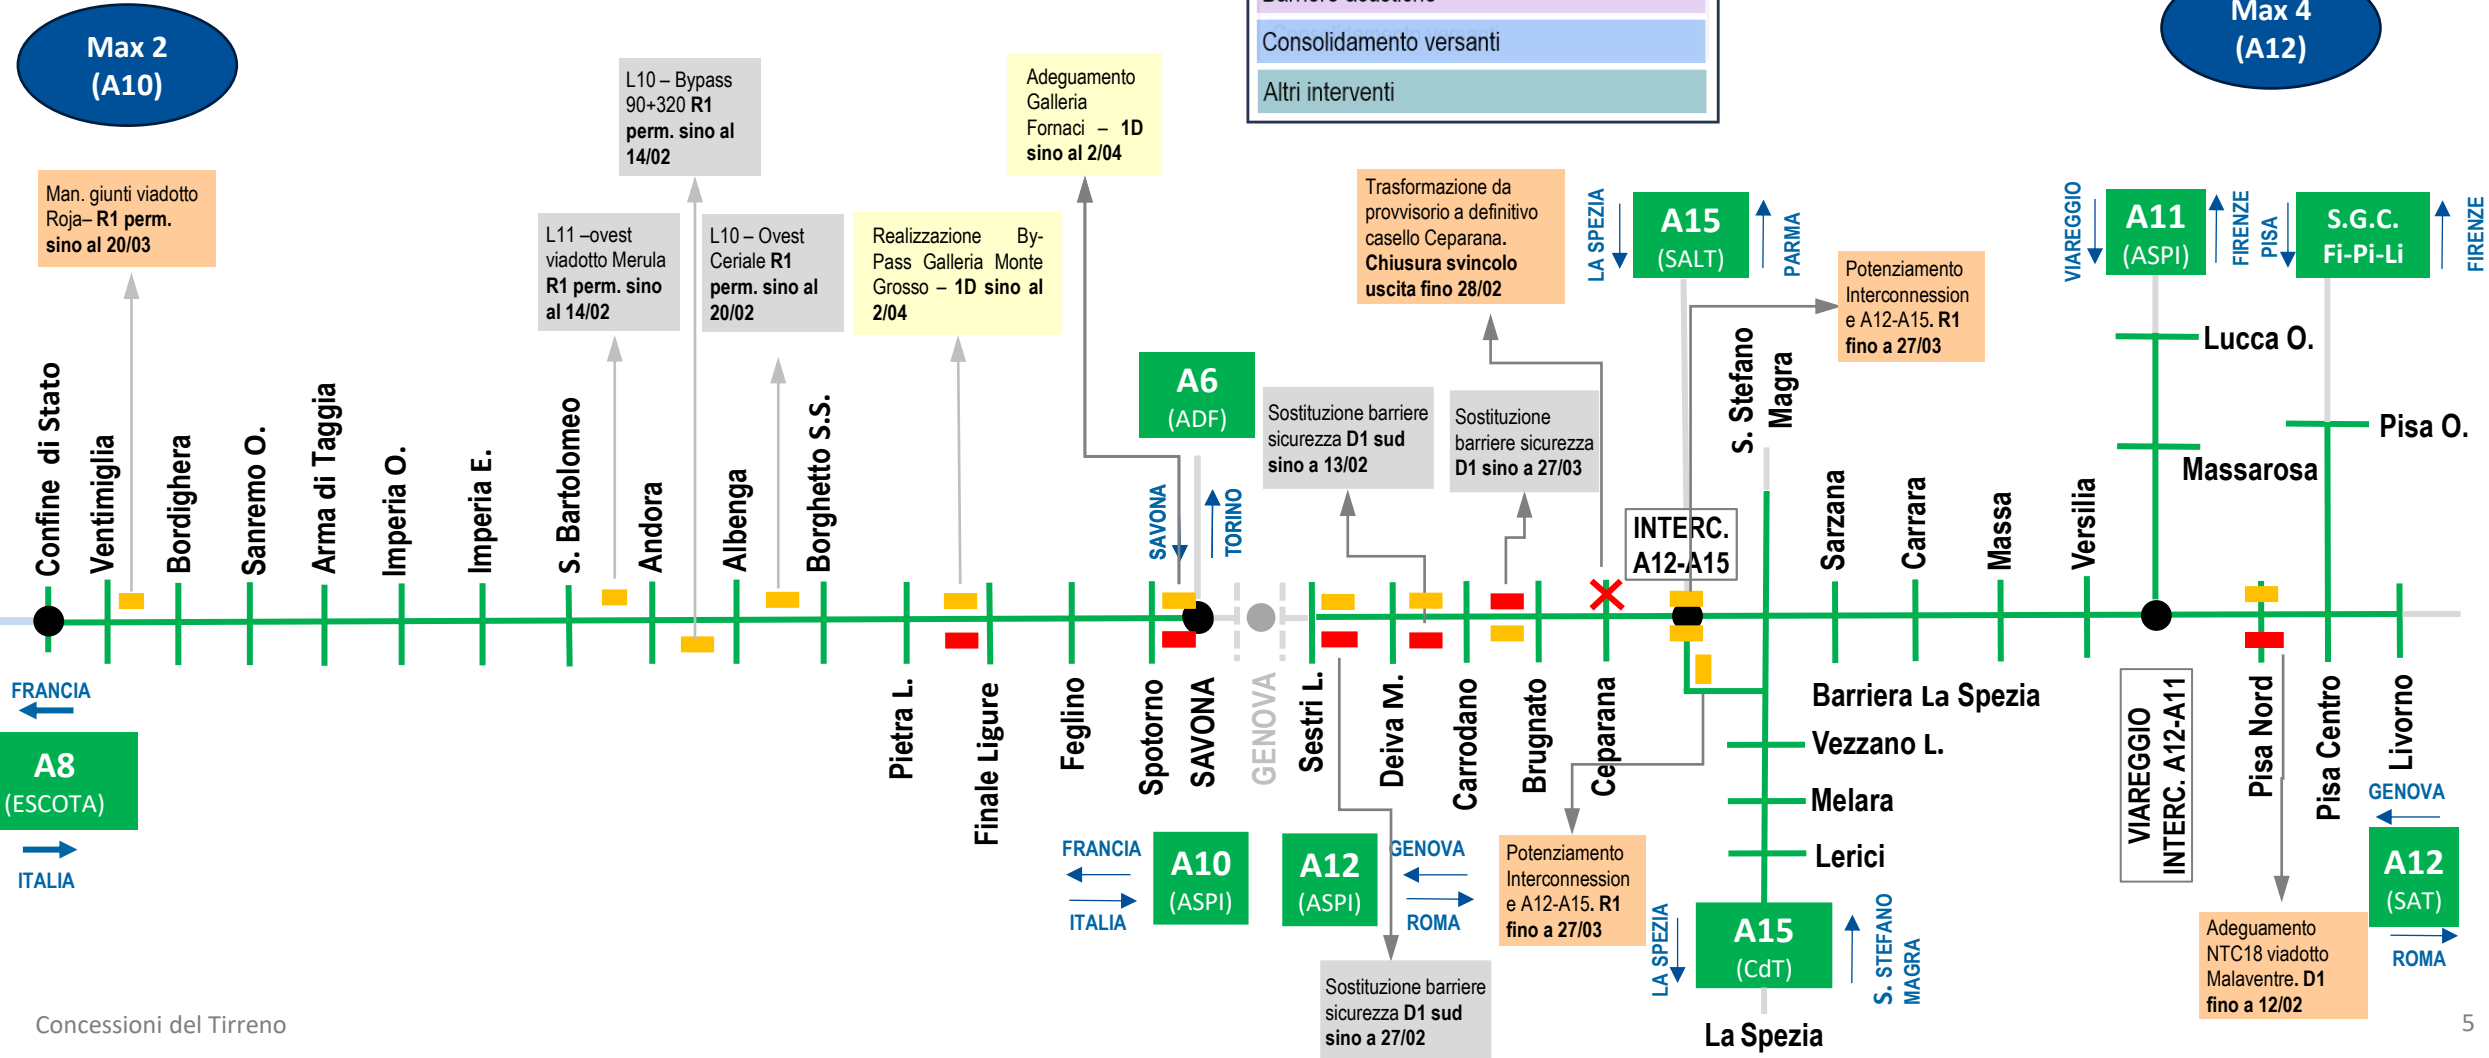
 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

 Interventi su barriere di sicurezza

 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 16/02 A DOMENICA 22/02

**NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1**

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

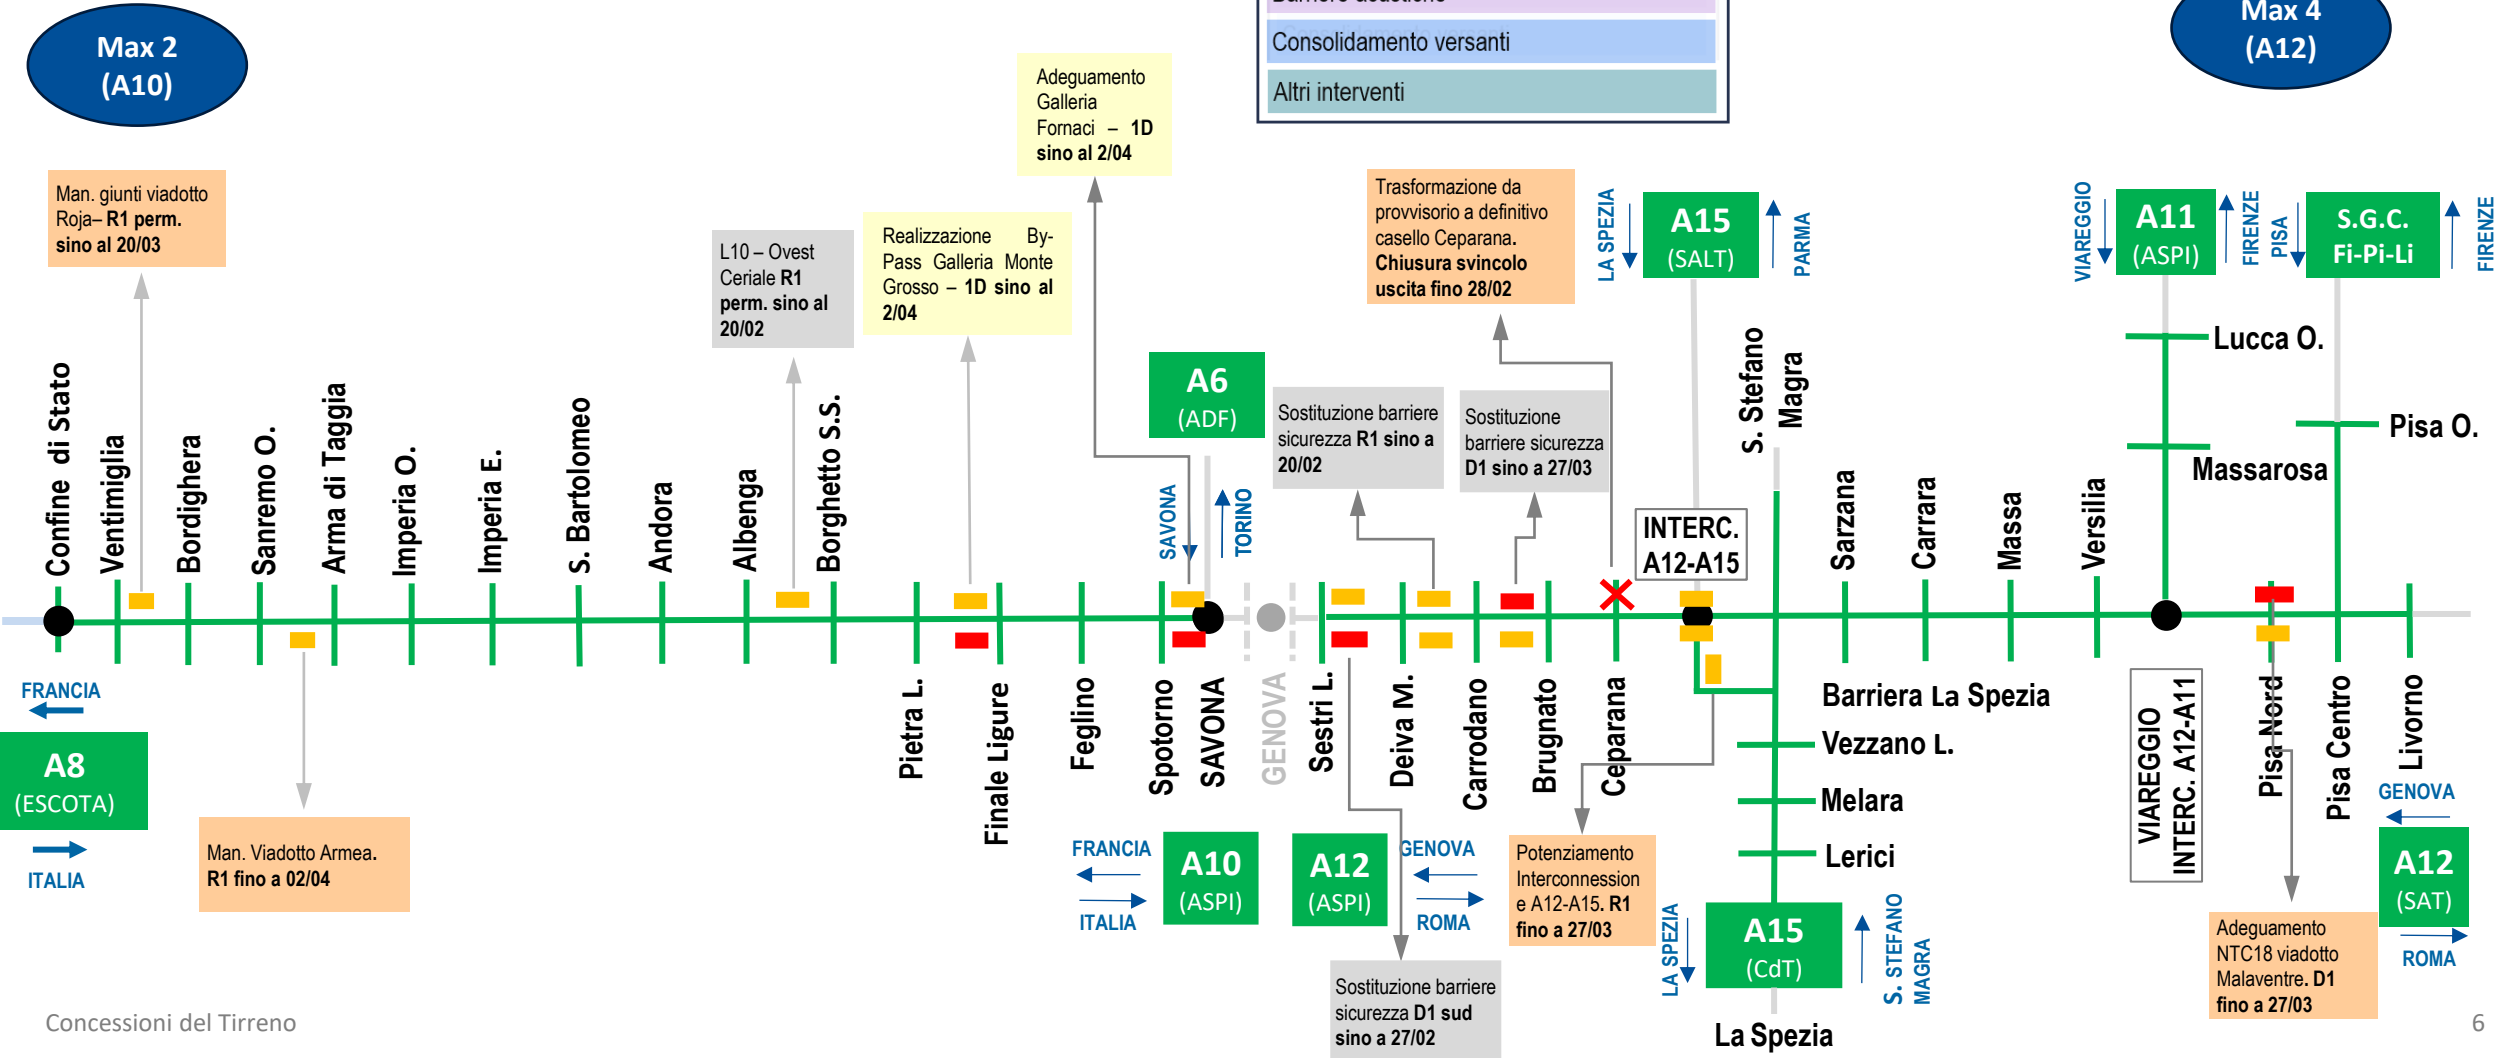
 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

 Interventi su barriere di sicurezza

 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 02/03 A DOMENICA 08/03

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1

X

Cantiere rimosso nei fine settimana

Tratti gestiti da ADF

Tratti non gestiti da ADF

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

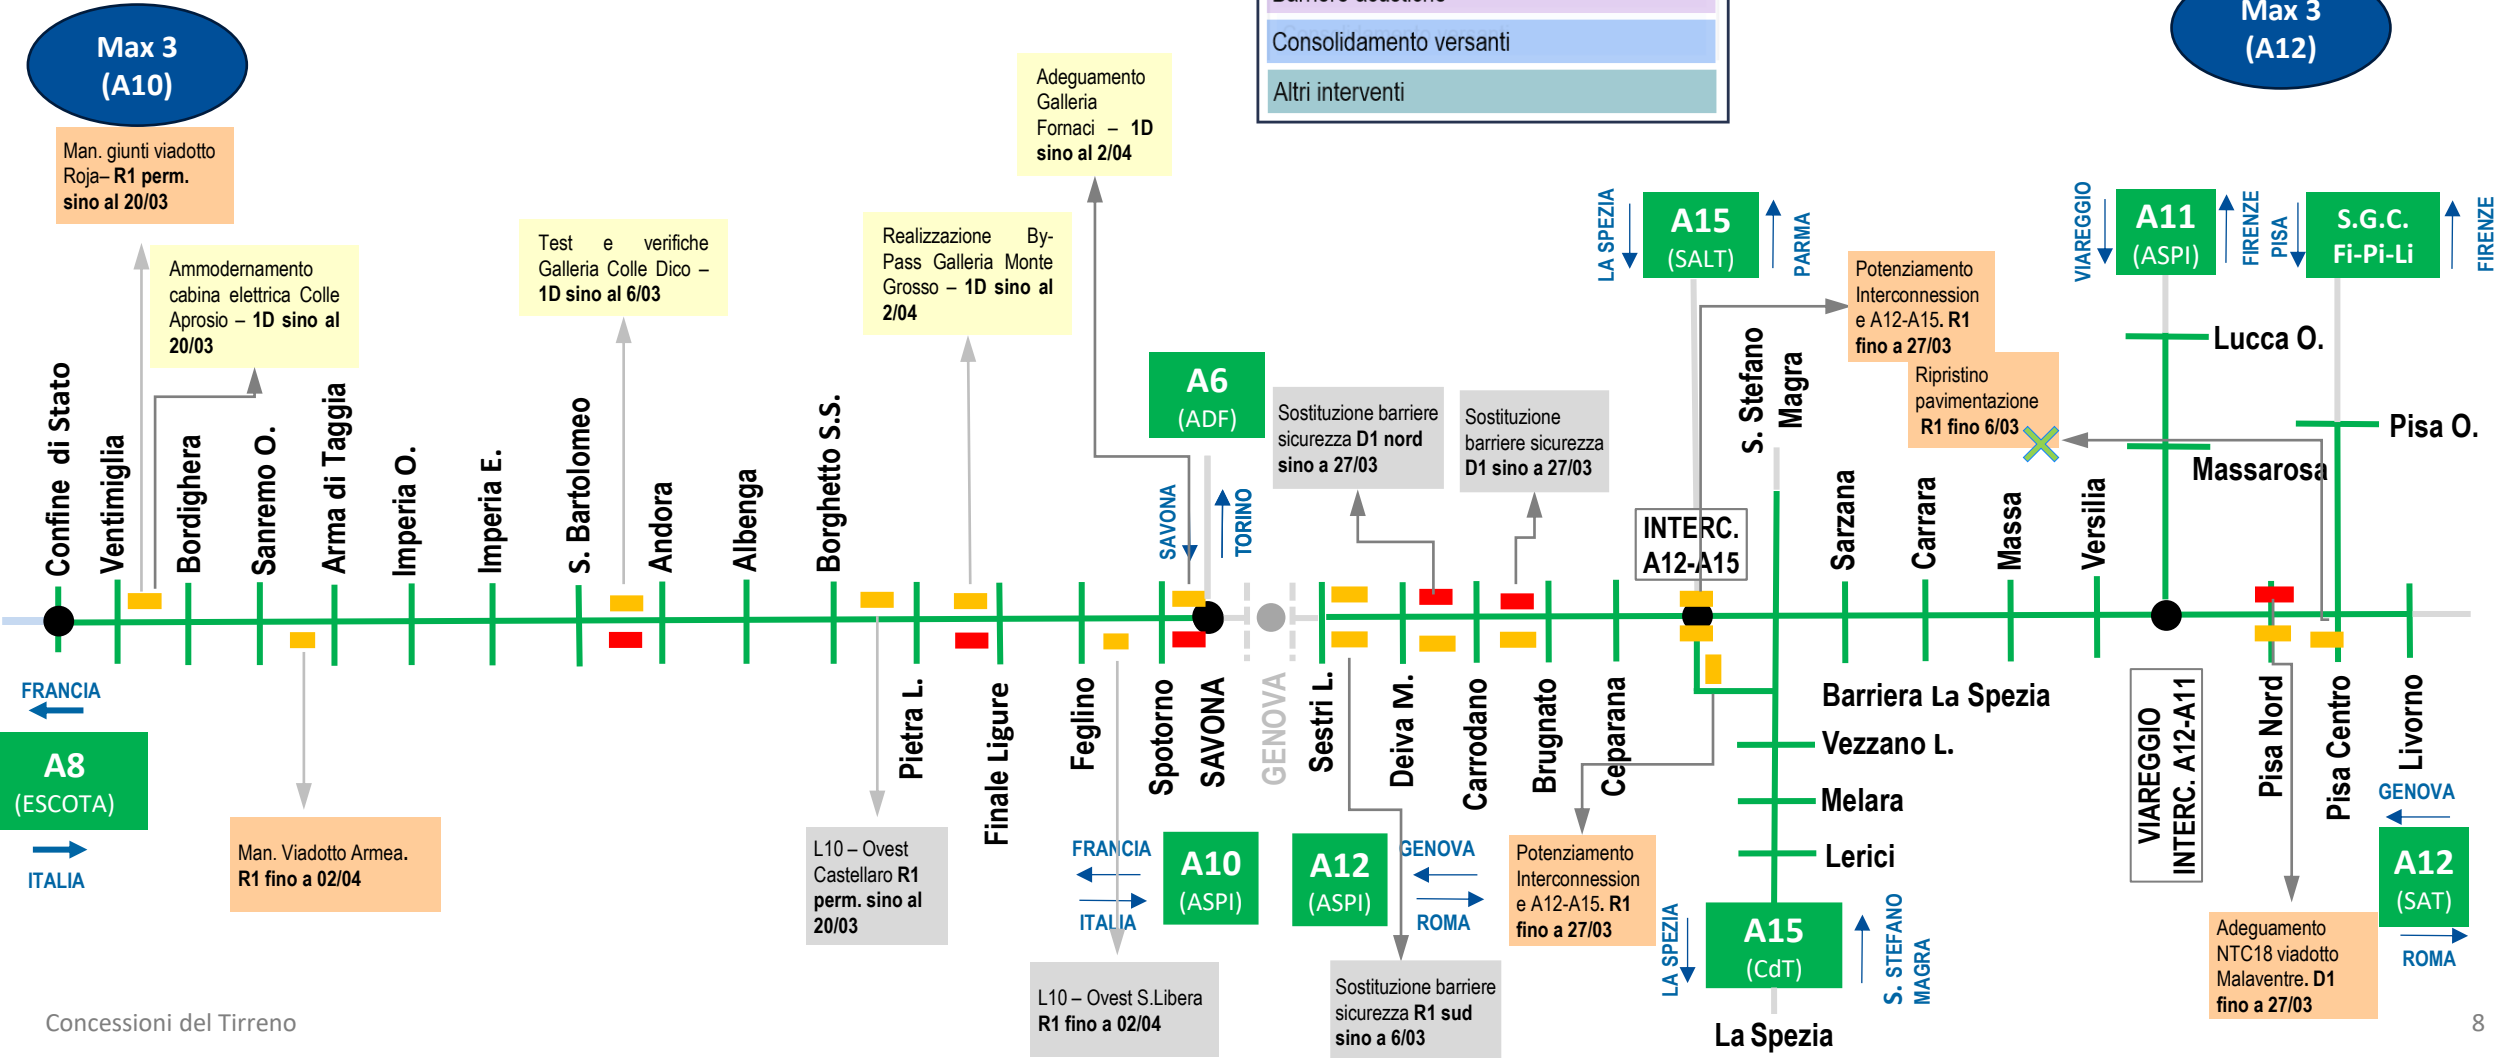
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Interventi su barriere di sicurezza

Barriere acustiche

Consolidamento versanti

Altri interventi



Concessioni del Tirreno

 Cantiere rimosso nei fine settimana

	Tratti gestiti da ADF
	Tratti non gestiti da ADF
	Cantieri Deviazione (1D)
	Cantieri Riduzione (R1)

Interventi Ponti, Viadotti	Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06	
Interventi su barriere di sicurezza	
Barriere acustiche	
Consolidamento versanti	
Altri interventi	



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 16/03 A DOMENICA 22/03

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU S.S. 1

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)


LEGENDA INTERVENTI

 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

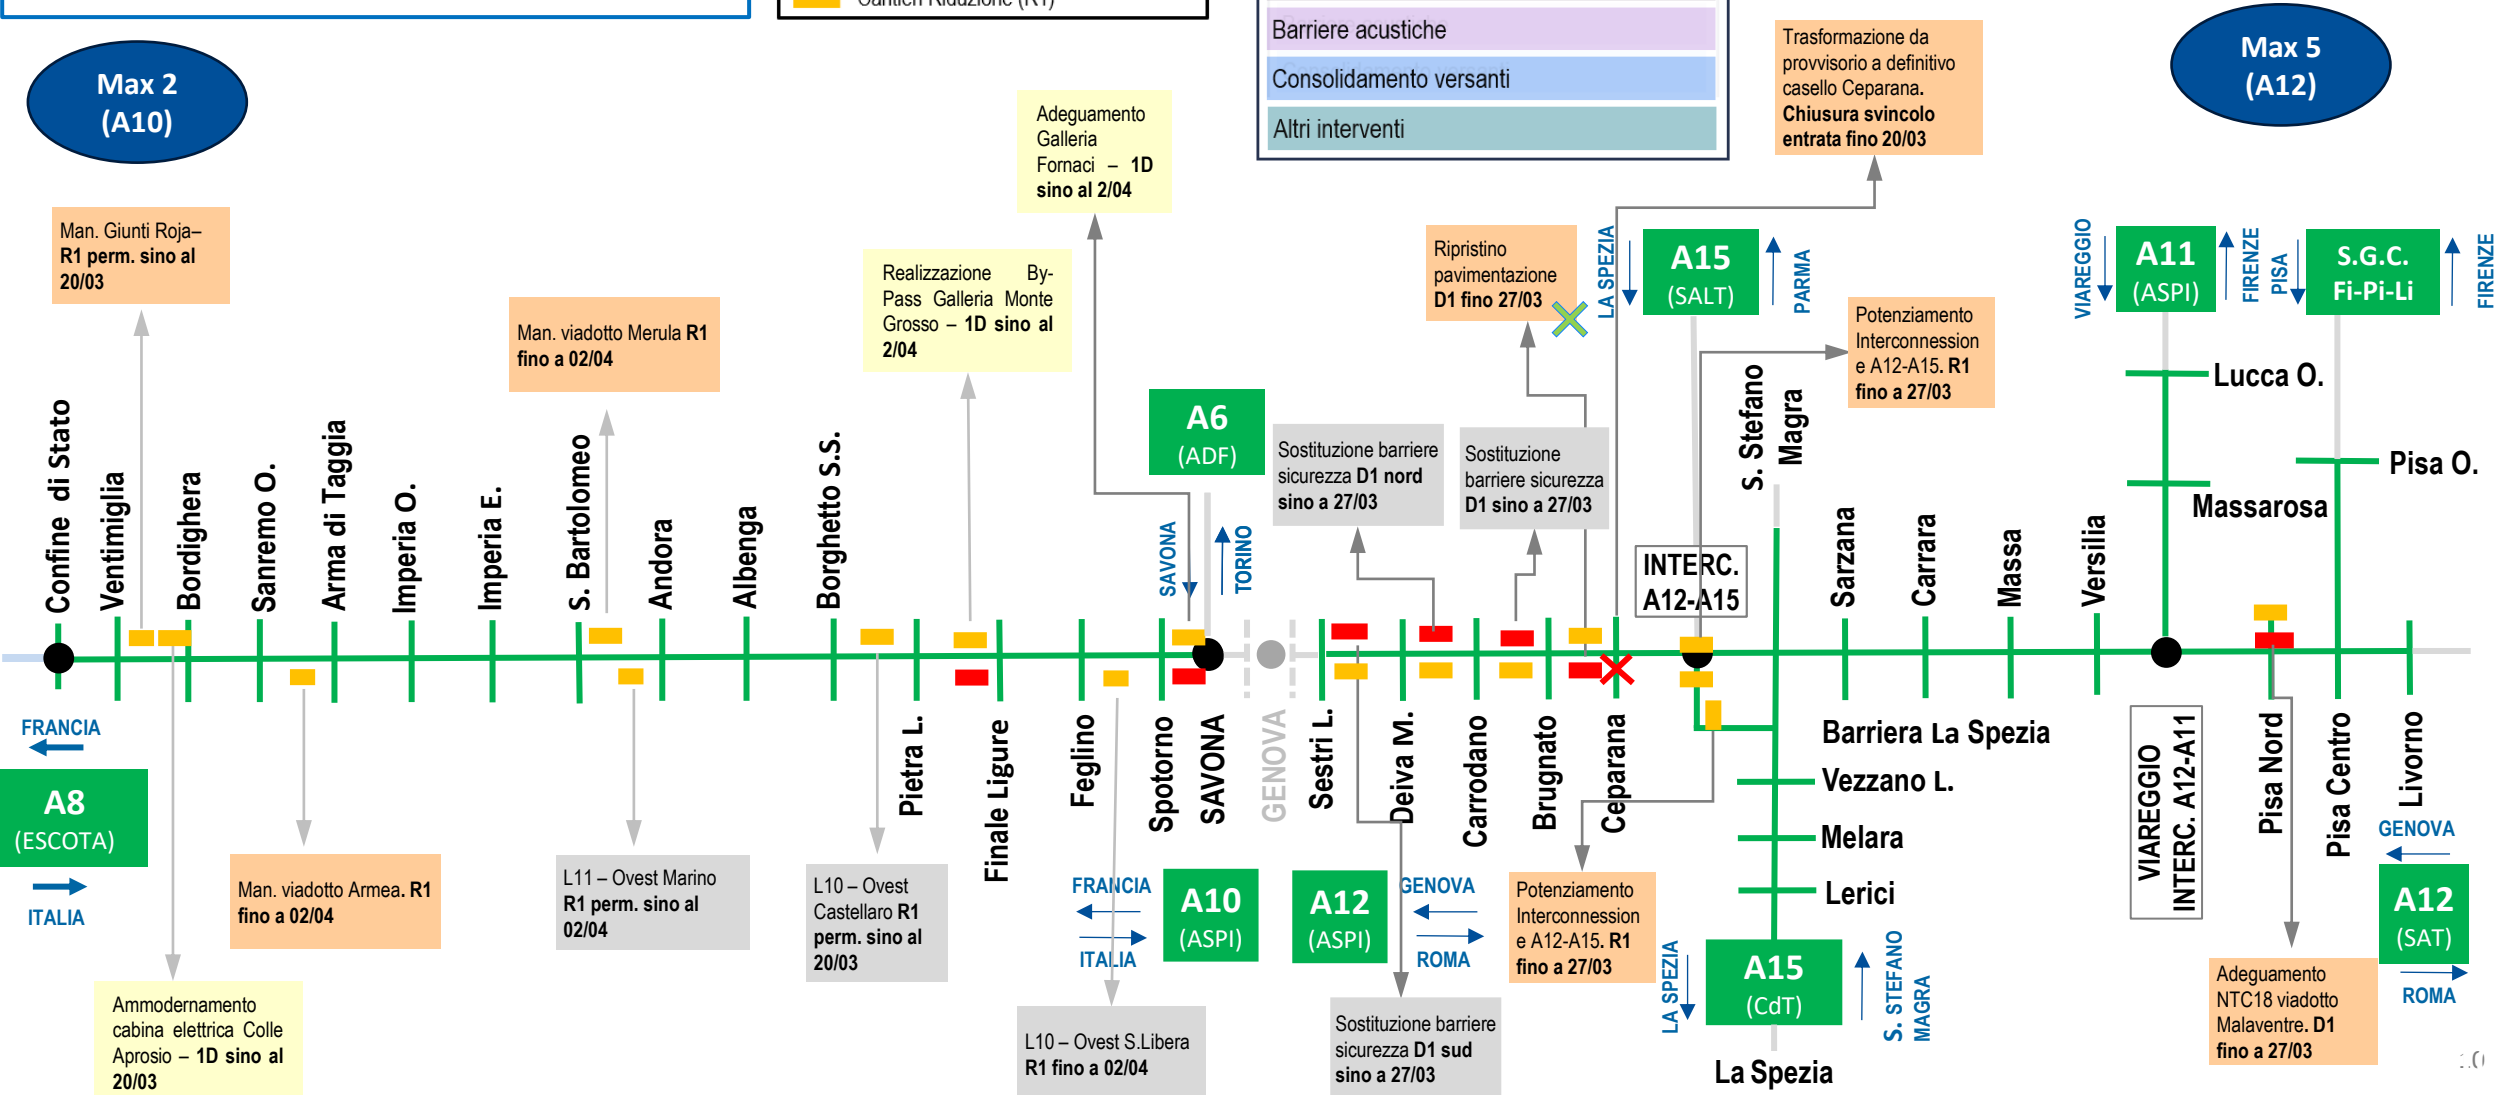
 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

 Interventi su barriere di sicurezza

 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 23/03 A DOMENICA 29/03

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU S.S. 1

 Cantieri rimossi nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI


 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

 Interventi su barriere di sicurezza

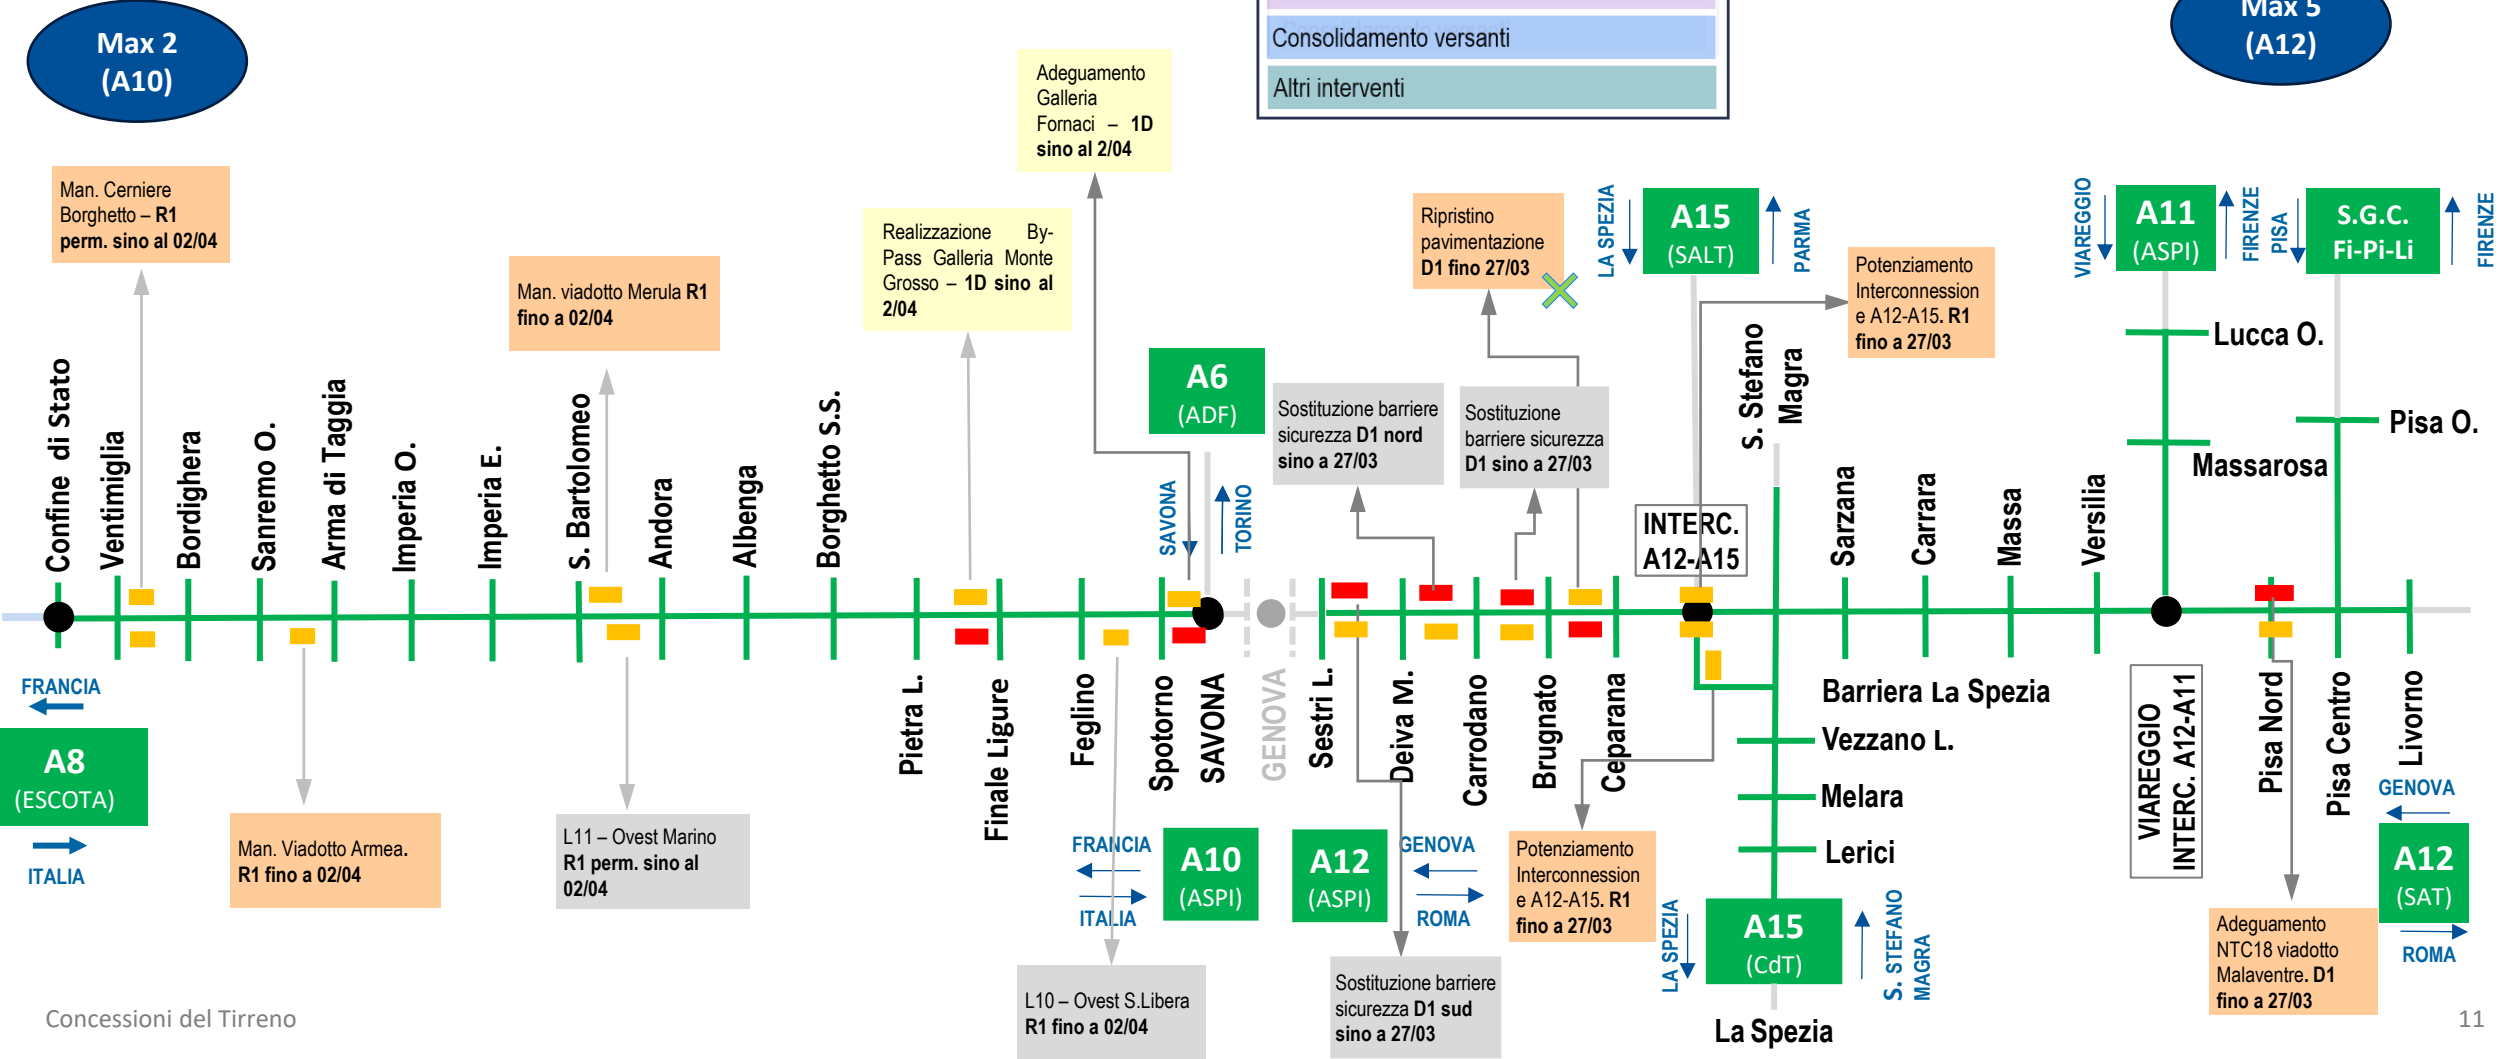
 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi

27/03: TERMINE LAVORI IN CARREGGIATA INTERCONNESSIONE A15/A12

Max 5 (A12)



Concessioni del Tirreno

**Max 2
(A10)**

- Tratti gestiti da ADF
- Tratti non gestiti da ADF
- Cantieri Deviazione (1D)
- Cantieri Riduzione (R1)

Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
Interventi su barriere di sicurezza
Barriere acustiche
Consolidamento versanti
Altri interventi



PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 2/04 ALLE ORE 12,00 DI MARTEDI' 7/04

ESODO PASQUALE

Max 0
(A10)

 Cantiere rimosso nei fine settimana

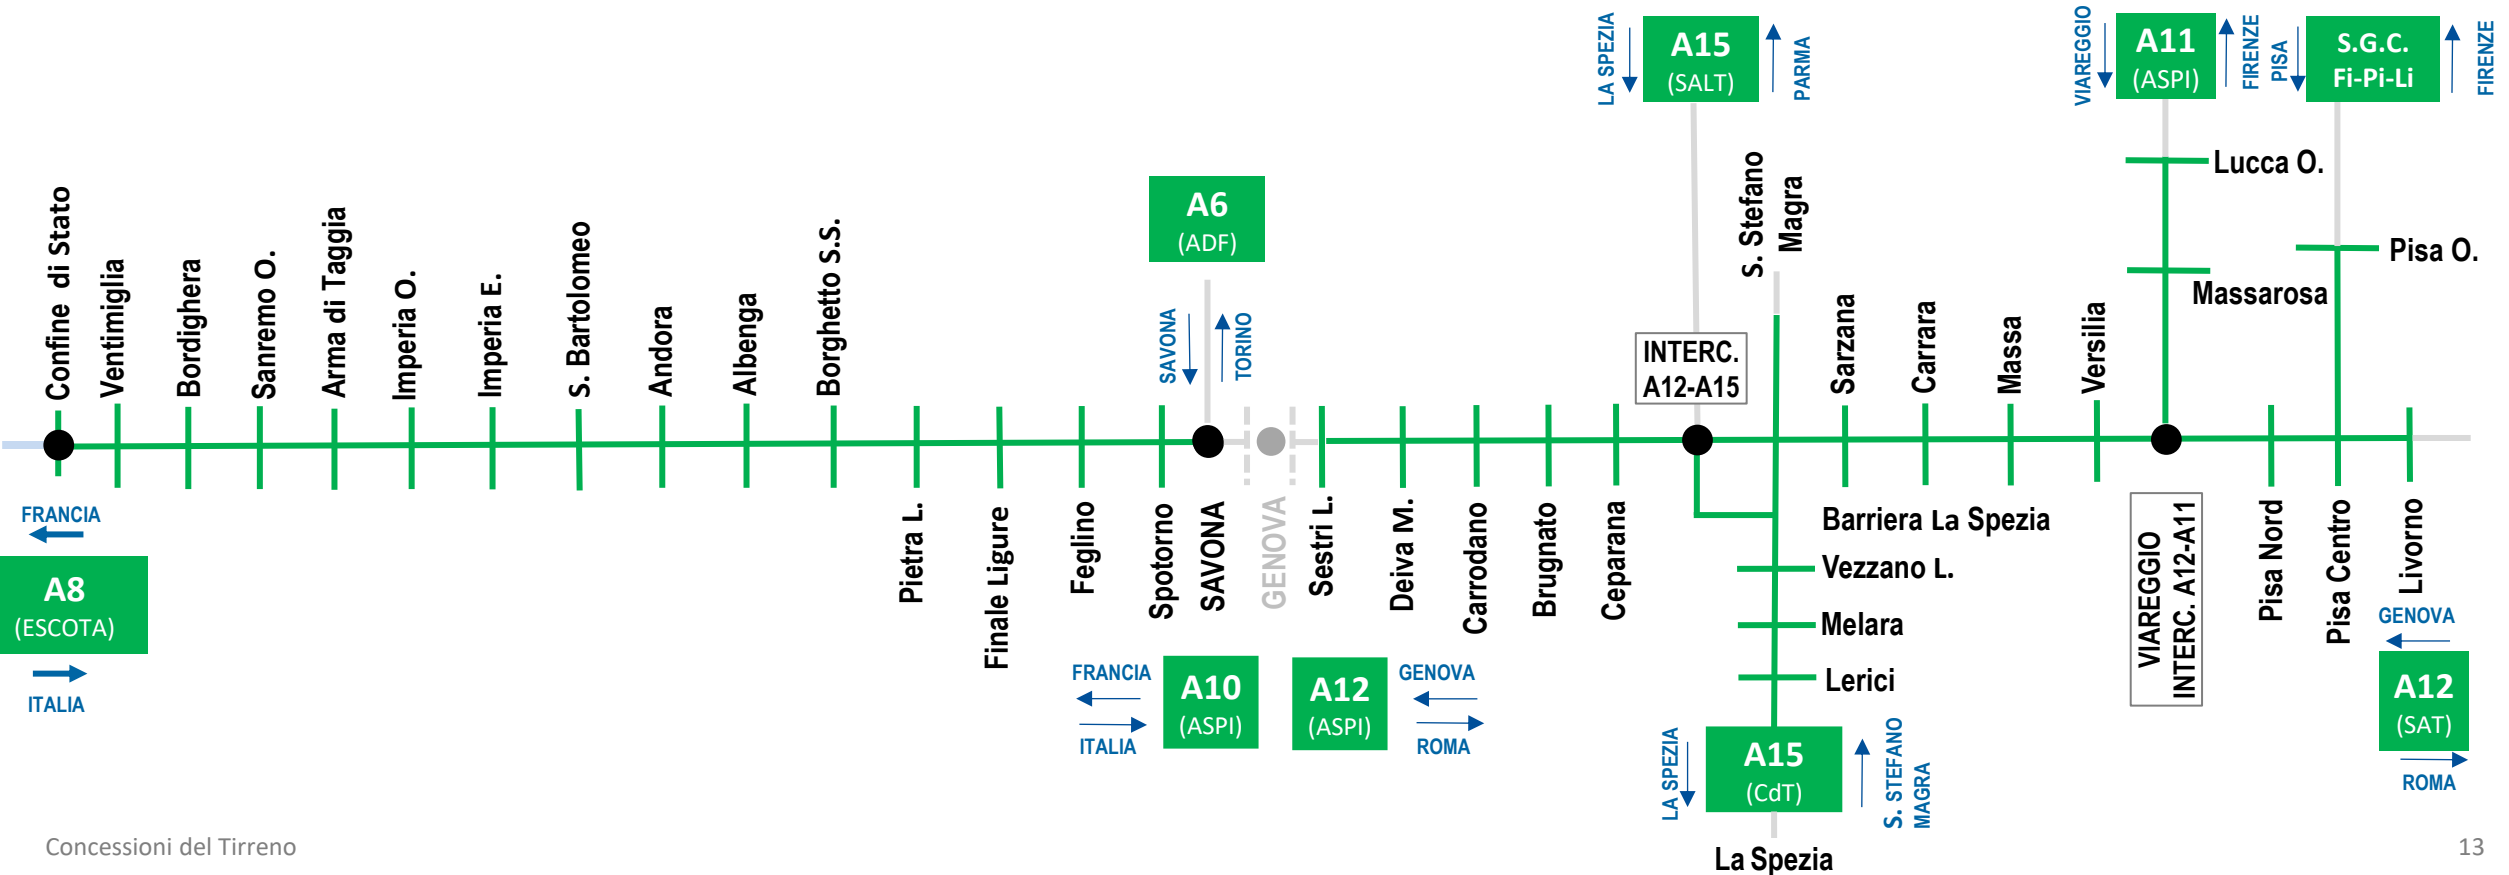
 Tratti gestiti da ADF

 Tratti non gestiti da ADF

 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI
Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
Interventi su barriere di sicurezza
Barriere acustiche
Consolidamento versanti
Altri interventi







PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 12.00 DI MARTEDI' 7/04 A DOMENICA 12/04

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU S.S. 1

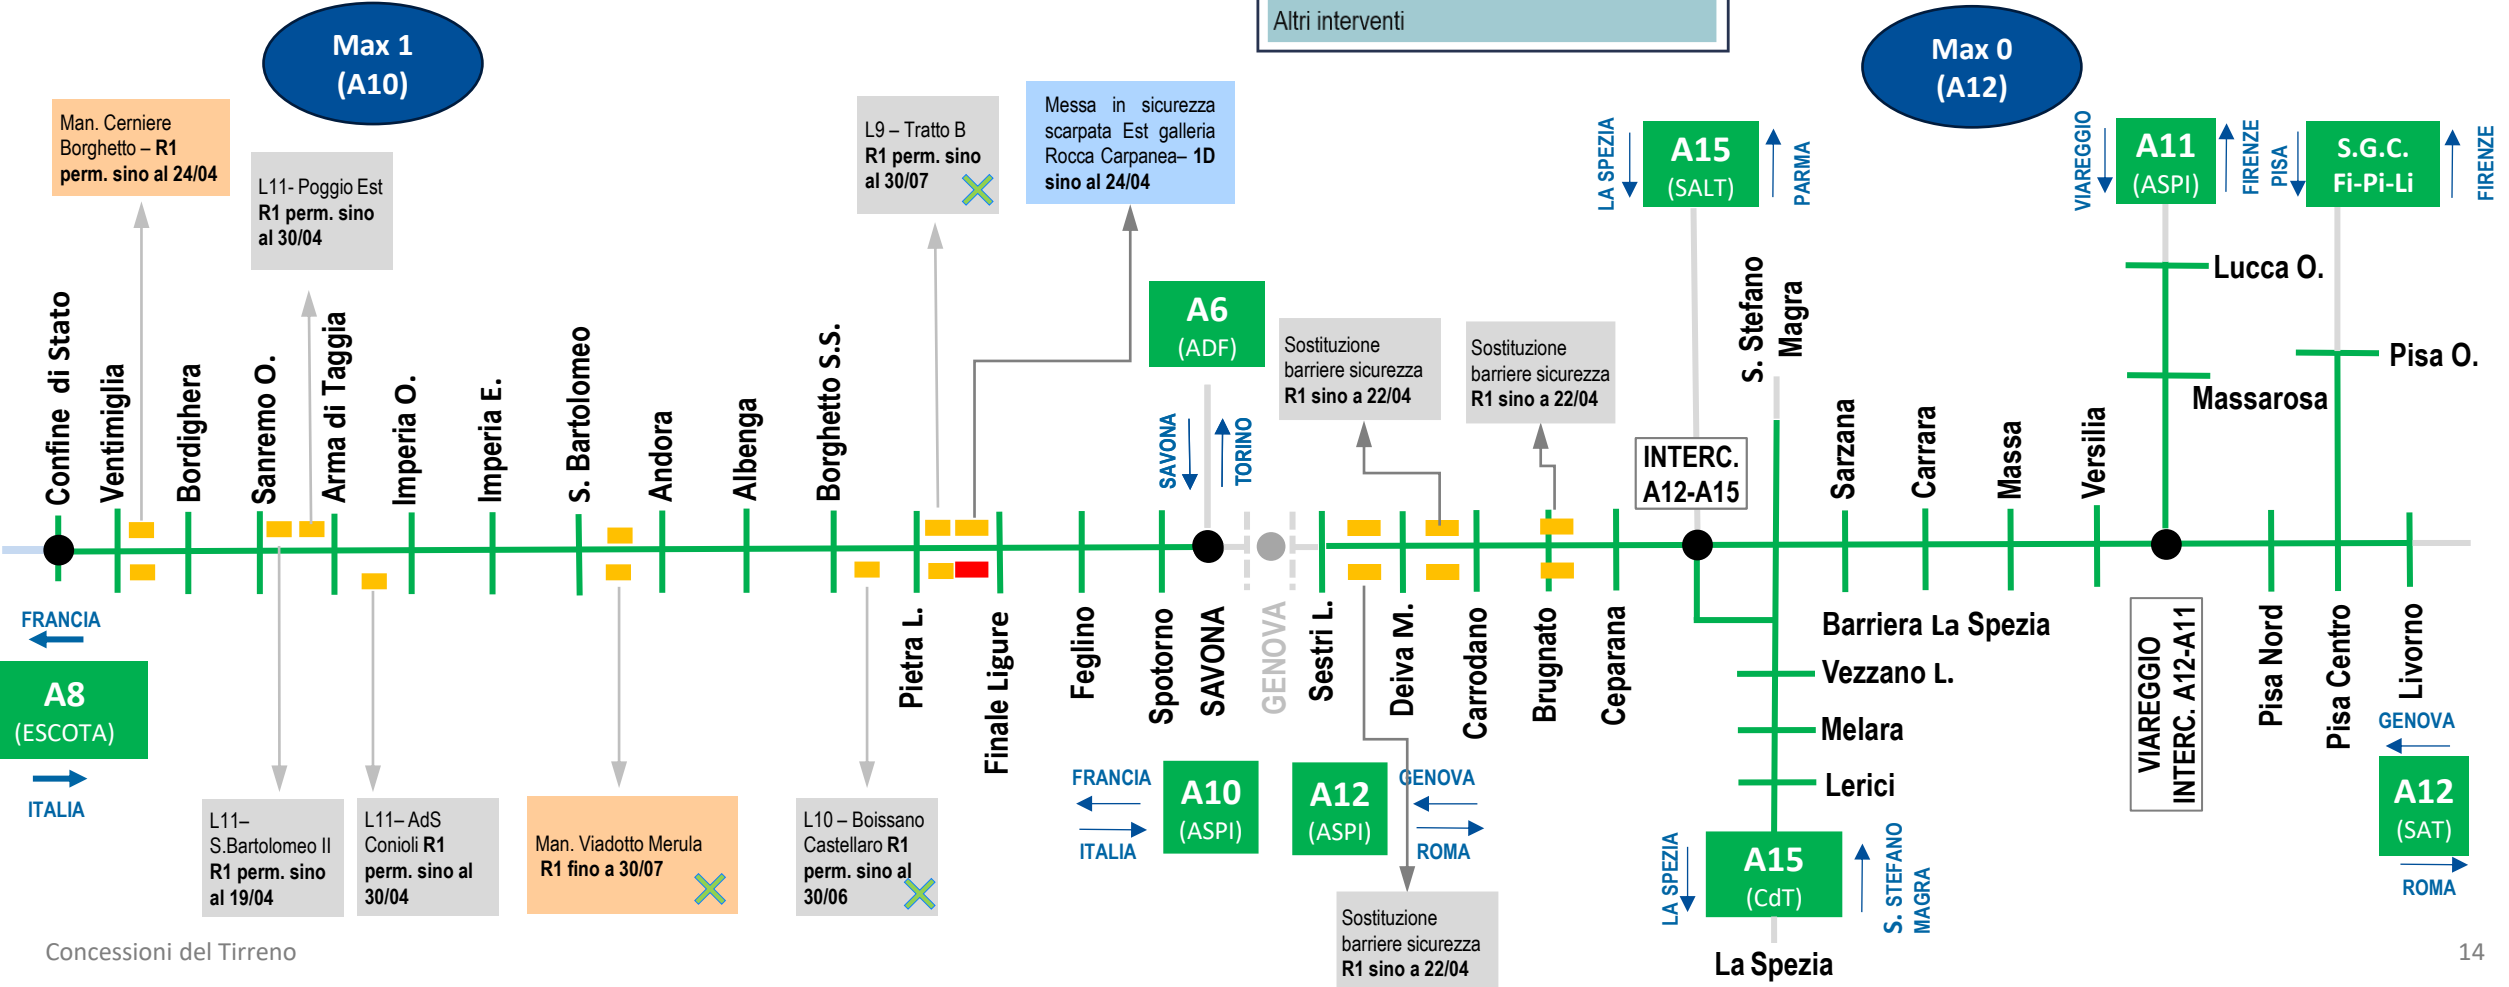
 Cantiere rimosso nei fine settimana

	Tratti gestiti da ADF
	Tratti non gestiti da ADF
	Cantieri Deviazione (1D)
	Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

	Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
	Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
	Interventi su barriere di sicurezza
	Barriere acustiche
	Consolidamento versanti
	Altri interventi

Nel periodo tra l'8.04.2026 e il 14.06.2026 saranno realizzate delle deviazioni di carreggiata per le verifiche periodiche agli impianti delle gallerie adeguate ai sensi del D. Lgs. 264/06






PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 13/04 A DOMENICA 19/04

**NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1**

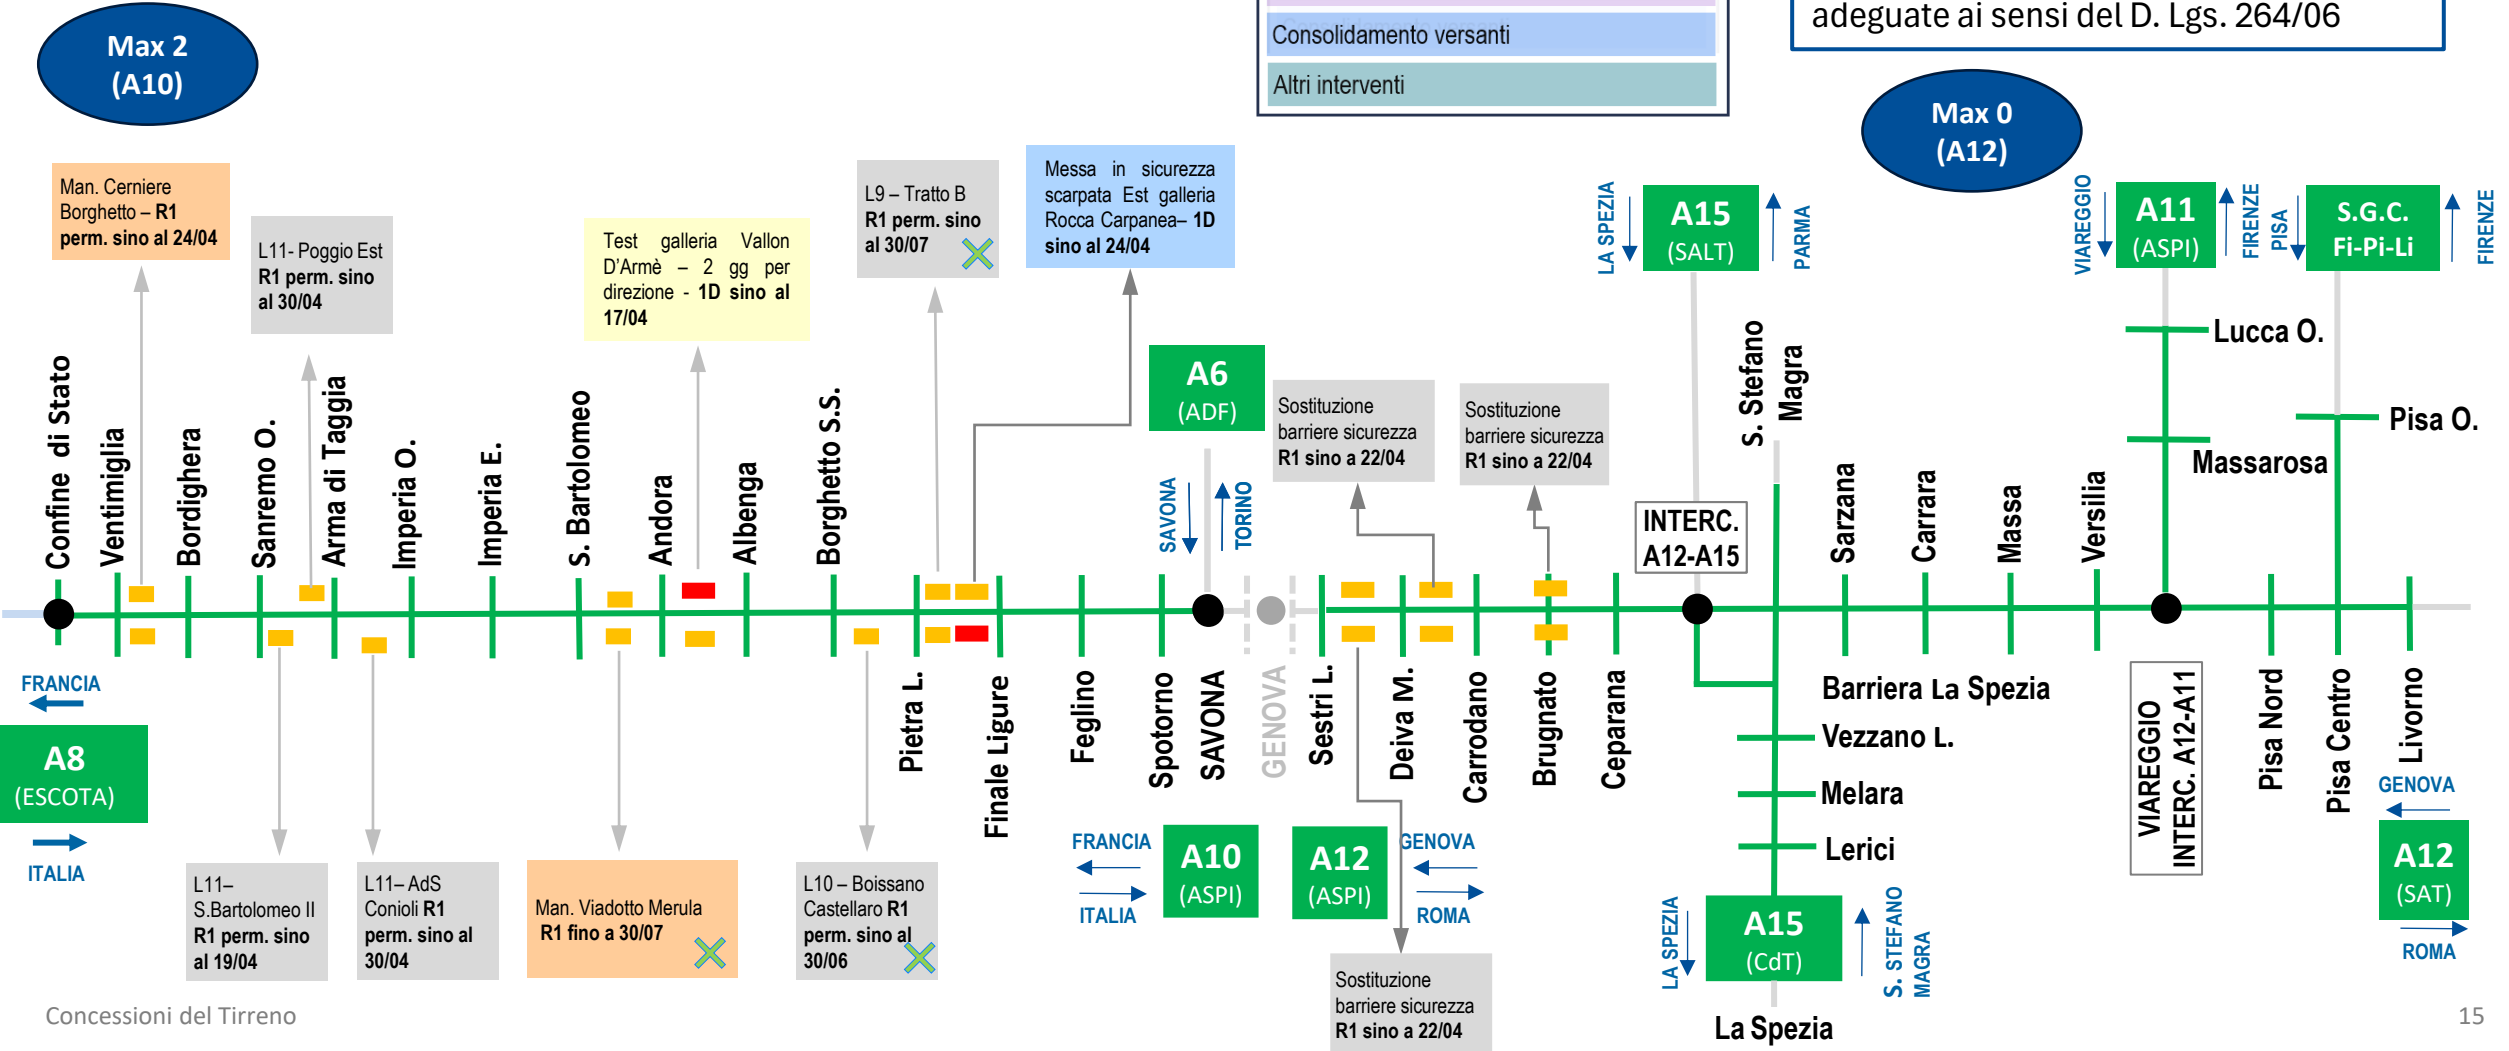
 Cantiere rimosso nei fine settimana

	Tratti gestiti da ADF
	Tratti non gestiti da ADF
	Cantieri Deviazione (1D)
	Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

	Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
	Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
	Interventi su barriere di sicurezza
	Barriere acustiche
	Consolidamento versanti
	Altri interventi

Nel periodo tra l'8.04.2026 e il 14.06.2026 saranno realizzate delle deviazioni di carreggiata per le verifiche periodiche agli impianti delle gallerie adeguate ai sensi del D. Lgs. 264/06



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 20/04 A DOMENICA 26/04

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)


LEGENDA INTERVENTI

 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

 Interventi su barriere di sicurezza

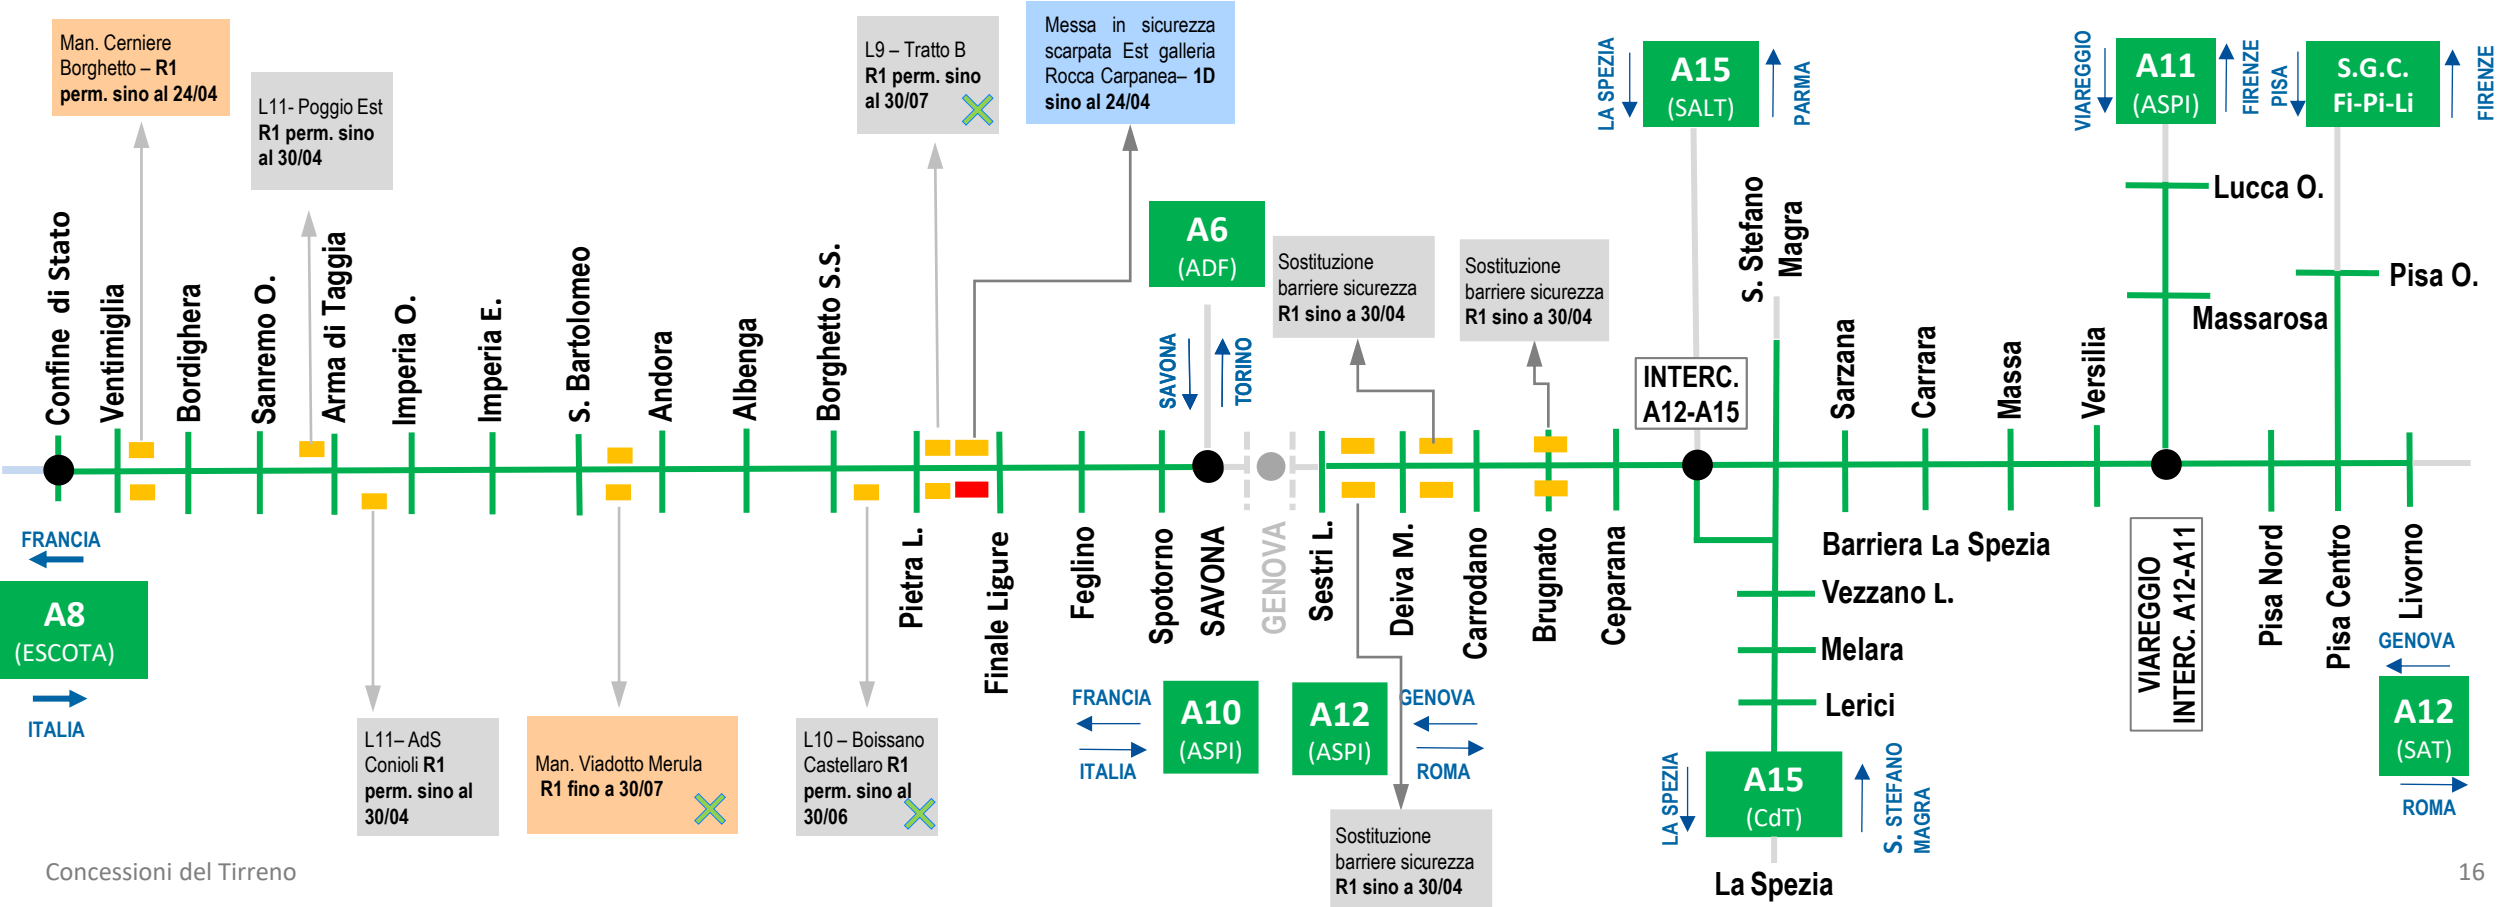
 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi

FESTA 25 APRILE (sabato)

Max 1
(A10)



PROGRAMMA CANTIERI DA LUNEDI' 27/04 ALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 30/04

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU S.S. 1

Max 0 (A10)

 Cantiere rimosso nei fine settimana

Tratti gestiti da ADF

Tratti non gestiti da ADF

Cantieri Deviazione (1D)

Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

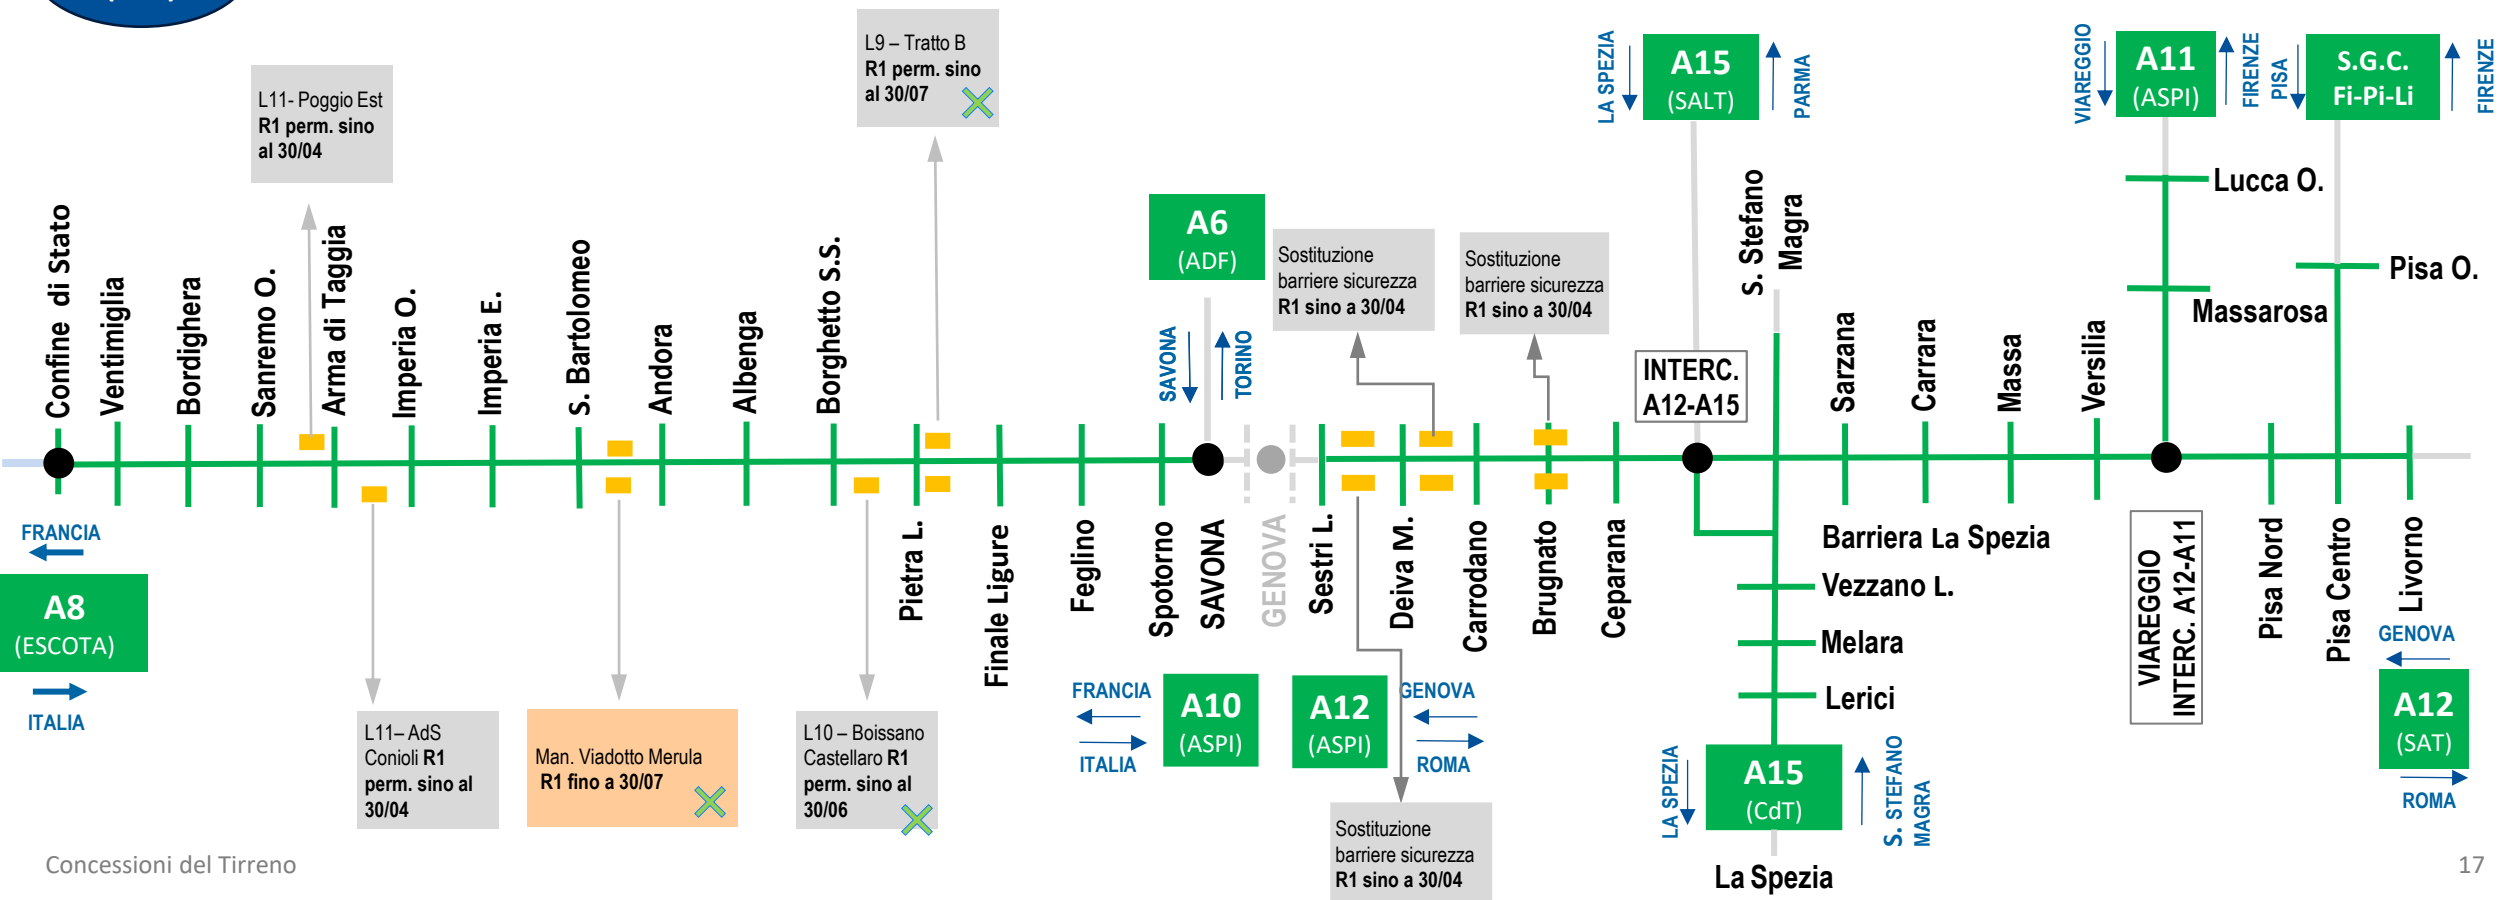
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

Interventi su barriere di sicurezza

Barriere acustiche

Consolidamento versanti

Altri interventi



PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI GIOVEDI' 30/04 ALLE ORE 12.00 DI LUNEDI' 4/05

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO
NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI
STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU
S.S. 1

Max 0
(A10)

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF

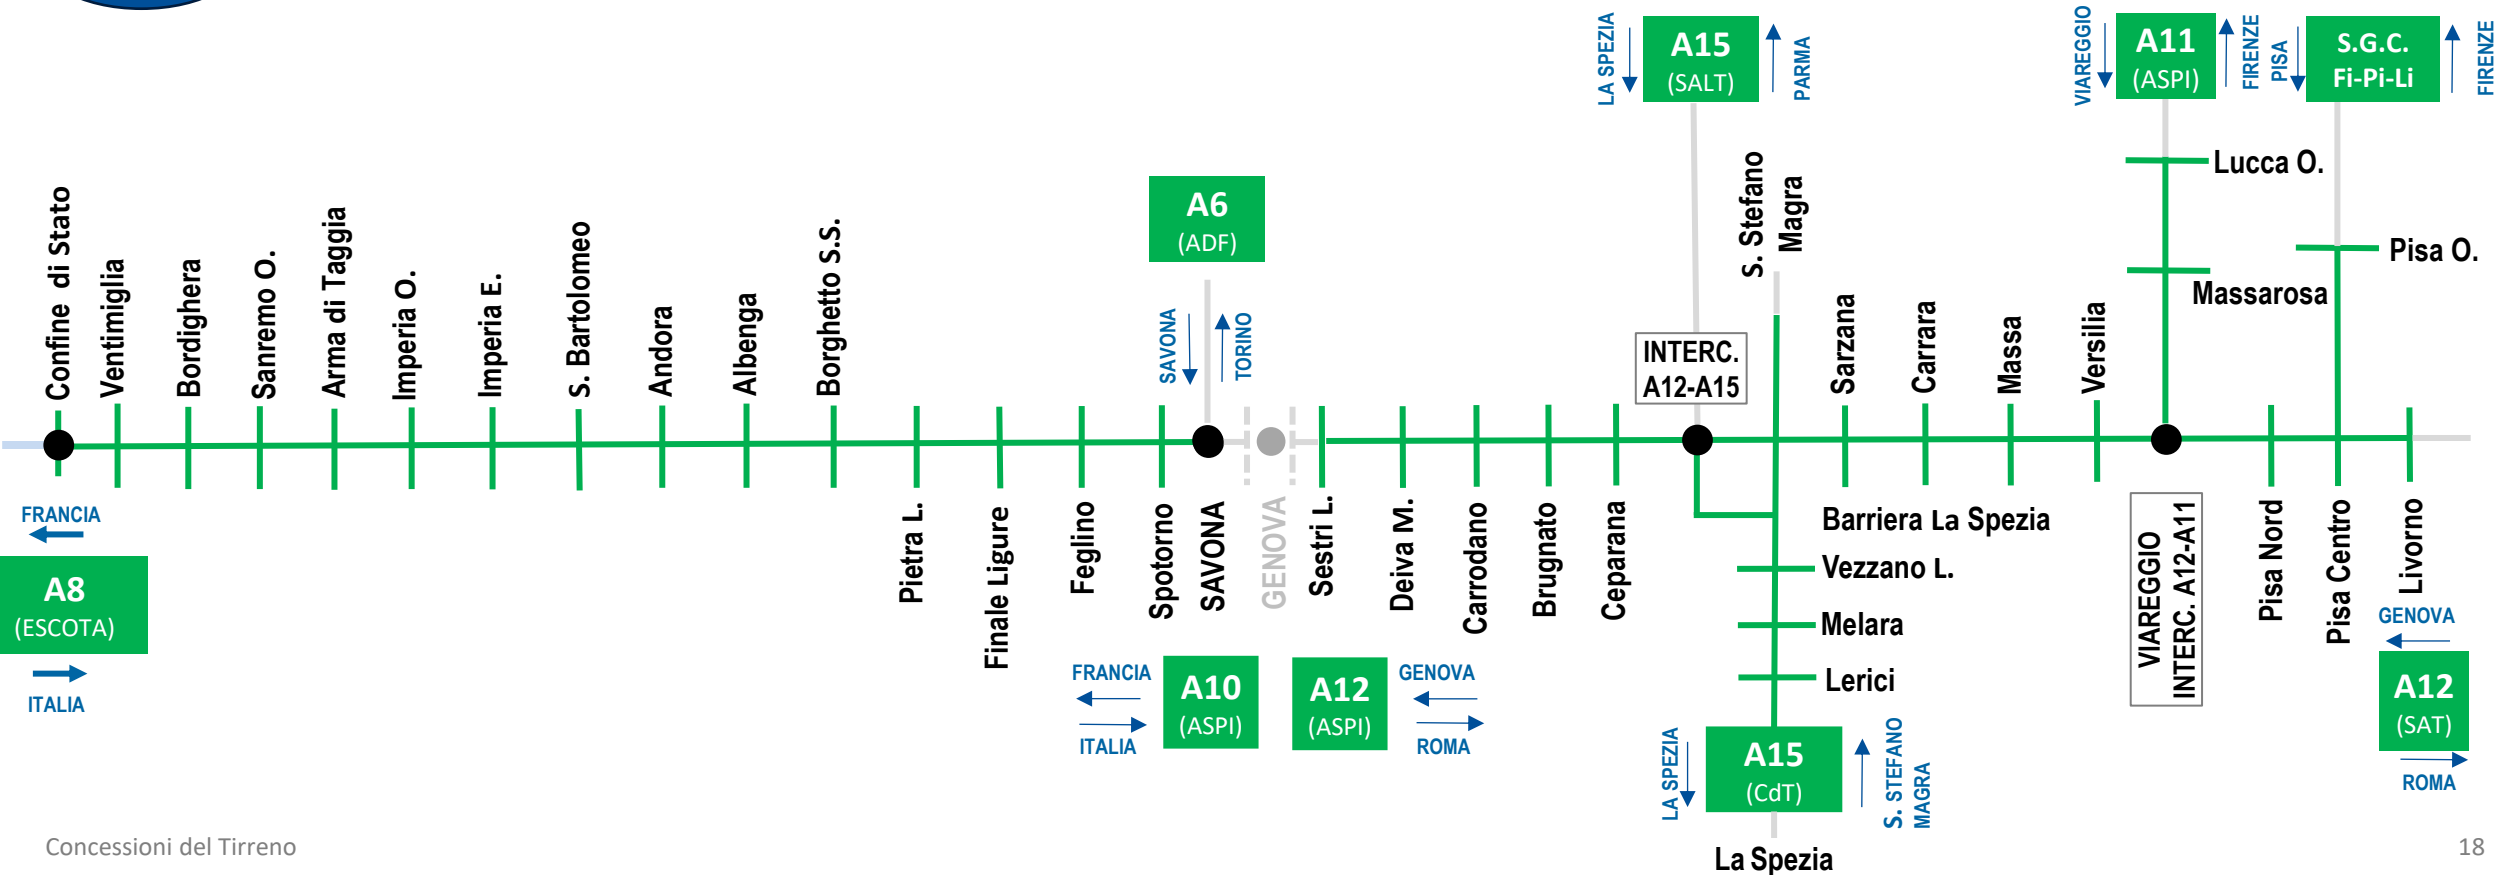
 Tratti non gestiti da ADF

 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI
Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
Interventi su barriere di sicurezza
Barriere acustiche
Consolidamento versanti
Altri interventi

PONTE 1° MAGGIO



PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 12.00 DI LUNEDI' 4/05 SINO ALLE ORE 14.00 DI VENERDI' 29/05

NESSUN CANTIERE PROGRAMMATO DIURNO NELLA TRATTA VENTIMIGLIA – CONFINE DI STATO PER CONCOMITANZA LAVORI ANAS SU S.S. 1

 Cantiere rimosso nei fine settimana

 Tratti gestiti da ADF


 Tratti non gestiti da ADF


 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI

 Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli

 Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06

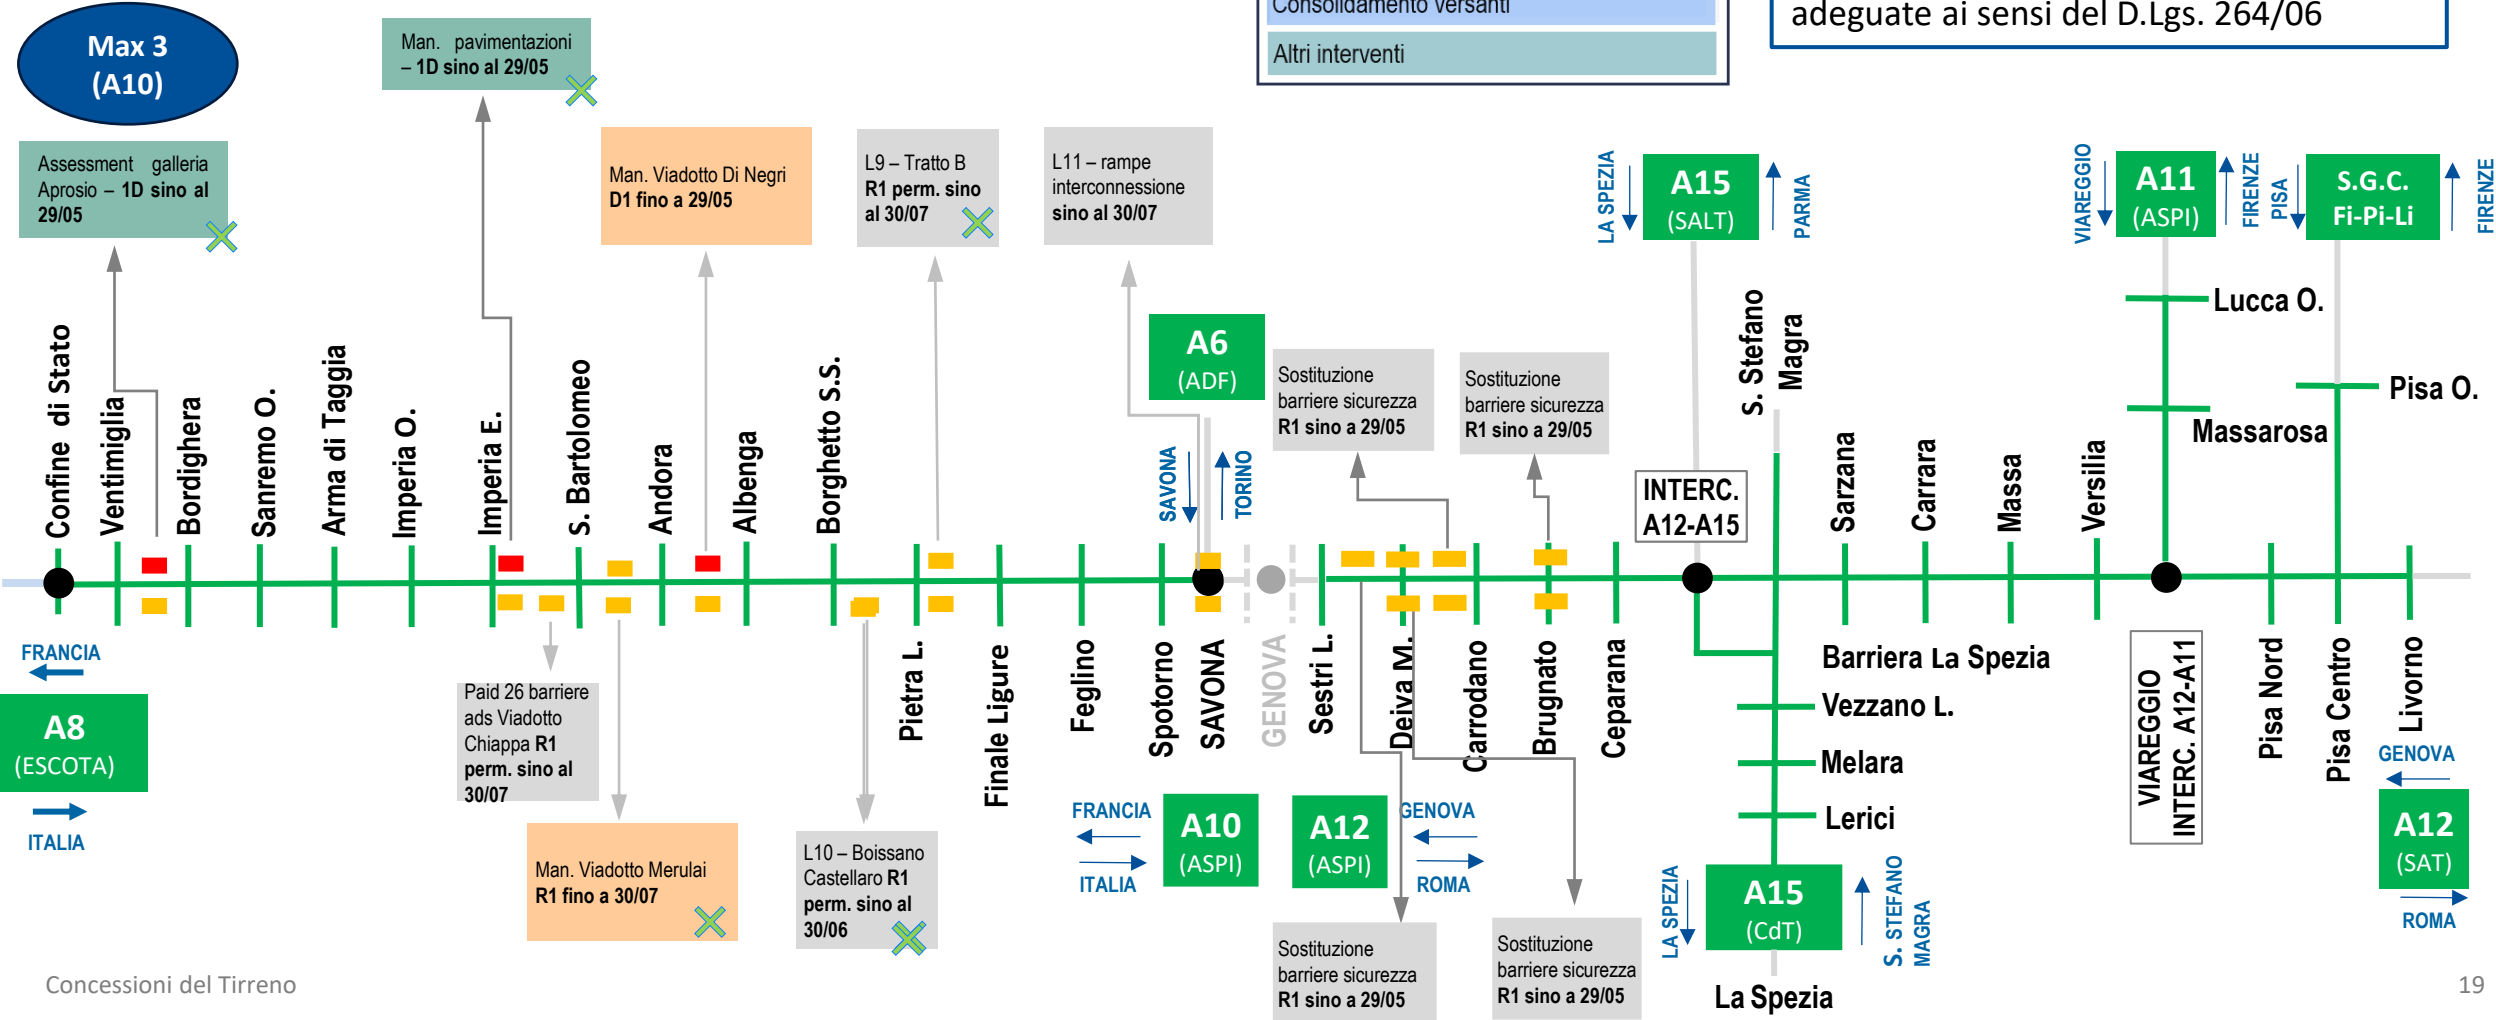
 Interventi su barriere di sicurezza

 Barriere acustiche

 Consolidamento versanti

 Altri interventi

Nel periodo tra l'8.04.2026 e il 14.06.2026 saranno realizzate delle deviazioni di carreggiata per le verifiche periodiche agli impianti delle gallerie adeguate ai sensi del D.Lgs. 264/06



PROGRAMMA CANTIERI DALLE ORE 14.00 DI VENERDI' 29/05 SINO ALLE ORE 12.00 DI MERCOLEDI' 3/06

PONTE 2 GIUGNO

Max 0
(A10)

 Cantiere rimosso nei fine settimana

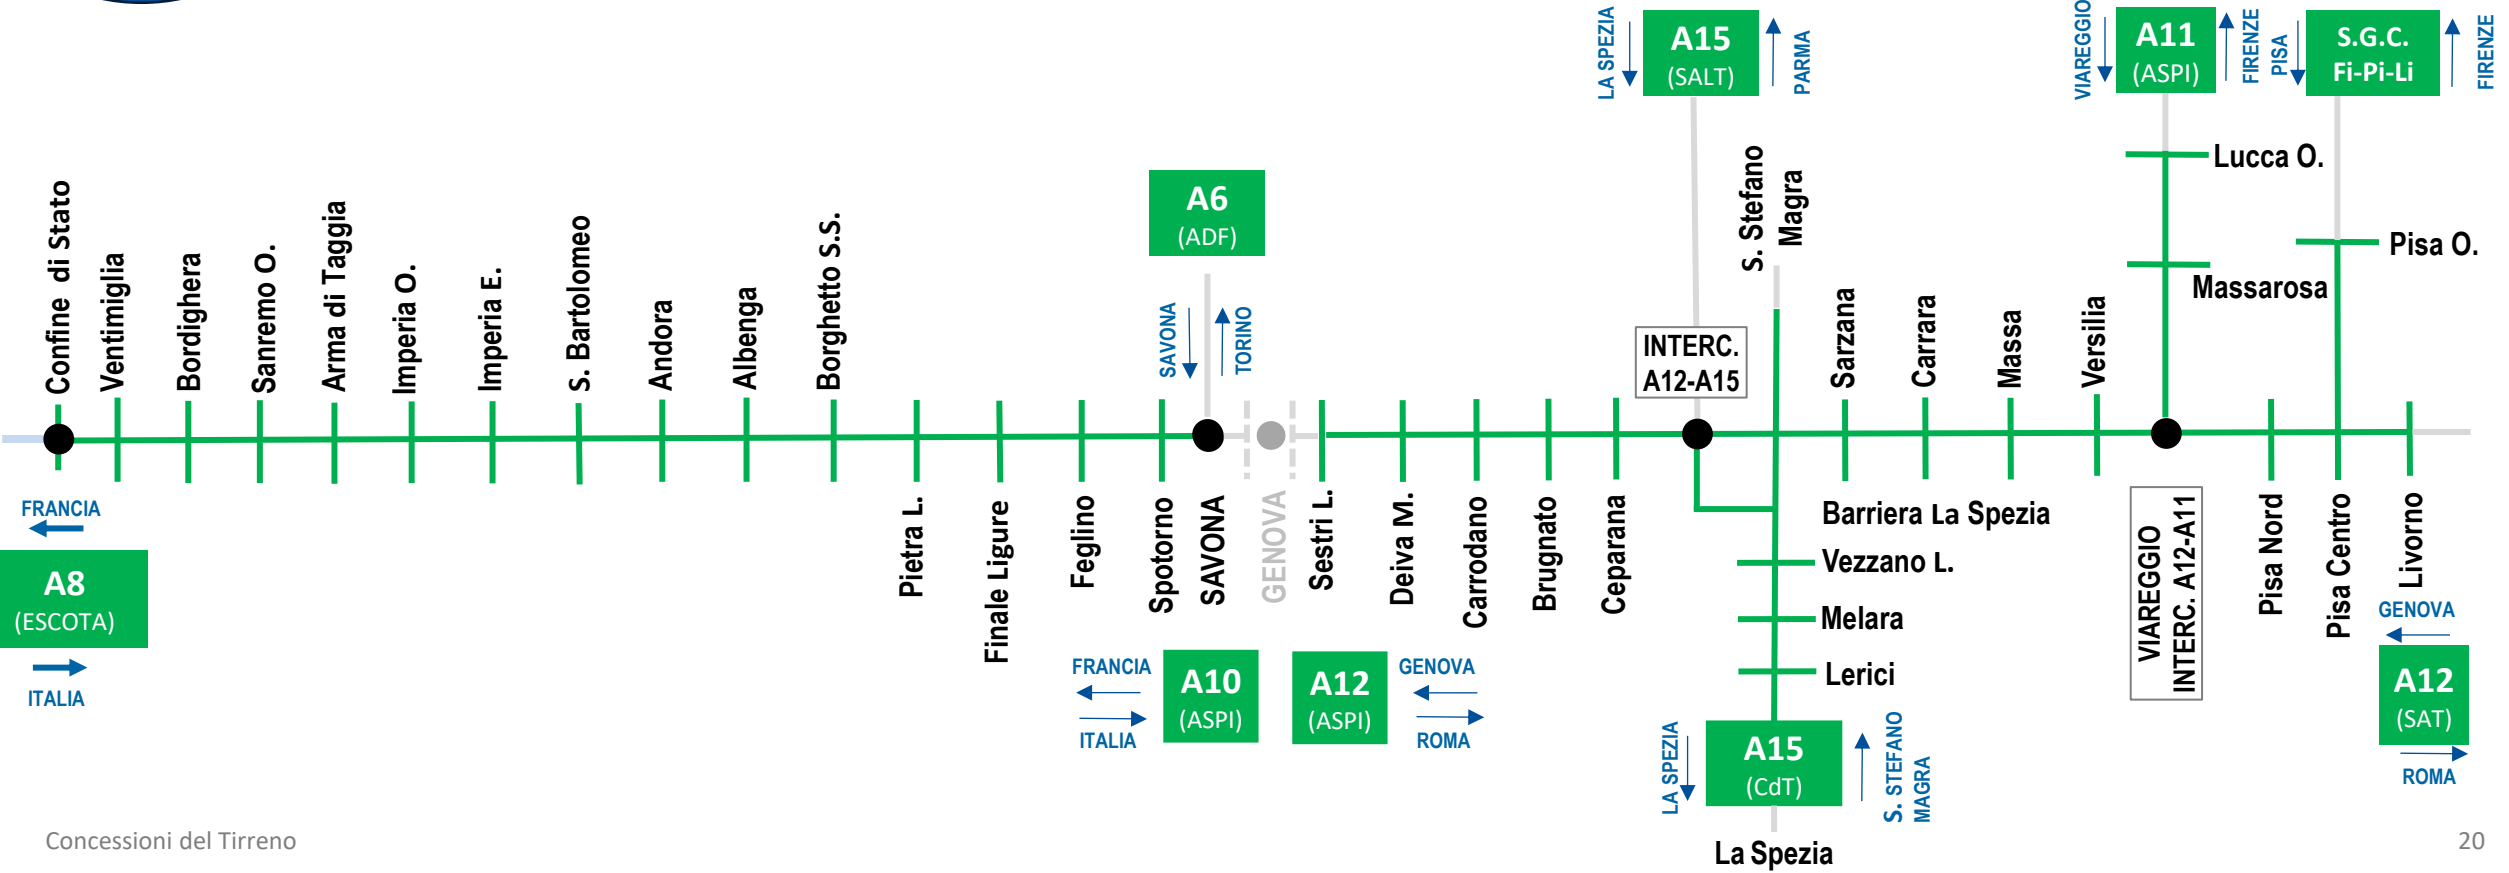
 Tratti gestiti da ADF

 Tratti non gestiti da ADF

 Cantieri Deviazione (1D)

 Cantieri Riduzione (R1)

LEGENDA INTERVENTI
Interventi Ponti, Viadotti Gallerie, Svincoli
Cantieri adeguamento gallerie D. Lgs. 264/06
Interventi su barriere di sicurezza
Barriere acustiche
Consolidamento versanti
Altri interventi





MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEI CANTIERI: EFFETTI SUI COSTI DELLE OPERE

MISURE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEI CANTIERI SUL TRAFFICO



Modifica della fasi di esecuzione dei lavori e riprogrammazione delle attività in funzione dei periodi di maggior traffico con frammentazione delle attività lavorative



Esecuzione dei lavori interferenti con il traffico nelle sole finestre temporali definite dal Tavolo di Coordinamento



Impiego di mezzi speciali per la rimozione di veicoli in panne (compreso mezzi pesanti)



Ove possibile, impiego di più personale distribuito su più turni di lavoro per la riduzione della durata dei cantieri



Incremento delle lavorazioni da svolgersi durante le ore notturne



Ove possibile, riconfigurazione dei cantieri per assicurare due correnti veicolari per senso di marcia



Aggravio di spese che la concessionaria sta sostenendo da ricomprendersi nelle perizie di variante come indicato nella Circolare MIT prot. n. 33297 del 15.12.2023



BEHIND THE JOURNEY
BEYOND THE DESTINATION
