

Piano Cantieri Liguria: FEB-GIU 2026

Incontro del 12 febbraio 2026

**autostrade
per l'Italia**



OTTIMIZZAZIONE INTERVENTO SU GALLERIA GIOVI NORD

Intervento	Scenario A.1 (concordato con Enti)	Scenario ottimizzazione Gall. Giovì in unica fase	Tipologia di cantiere
Gall. Giovì e Campora carr. Nord e Barriere carr. Sud (sorpasso)	Ott 25 – Mar 26	Ott 25 – Giu 26	Scambio dal 116+900 al 111+500 con uscita su Rampa vecchia (da Gen scambio dal 113+800 al 111+500)
Rampa uscita + Ponte Scrivia Busalla carr. Nord	Ott 26 – Apr 27	Ott 26 – Apr 27	Scambio dal 111+500 al 110+800 con uscita su Rampa alternativa e ingresso su rampa alternativa
Completamento Gall. Giovì Nord	Ott 27 – Mar 28	-	Scambio dal 113+800 al 111+500
Gall. Giovì Sud	Ott 28 – Mar 29	Ott 27 – Mar 28	Scambio dal 111+500 al 113+800

Programma cantierizzazione Gall. Campora – Giovì – Monreale con 1Y ogni domenica in Gall. Giovì

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott
Campora										
Giovì										
Monreale										


Gall. Campora
tot. gg
110 scambio permanente
30 R1 carr. Sud

Gall. Giovì
tot. gg
226 scambio permanente
30 1Y (2 corsie Nord+ 1 corsia Sud)


Gall. Monreale
tot. gg
352 scambio permanente
20 R1 carr. Sud

Piano cantieri: Febbraio 2026


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 9 – domenica 15 febbraio '26

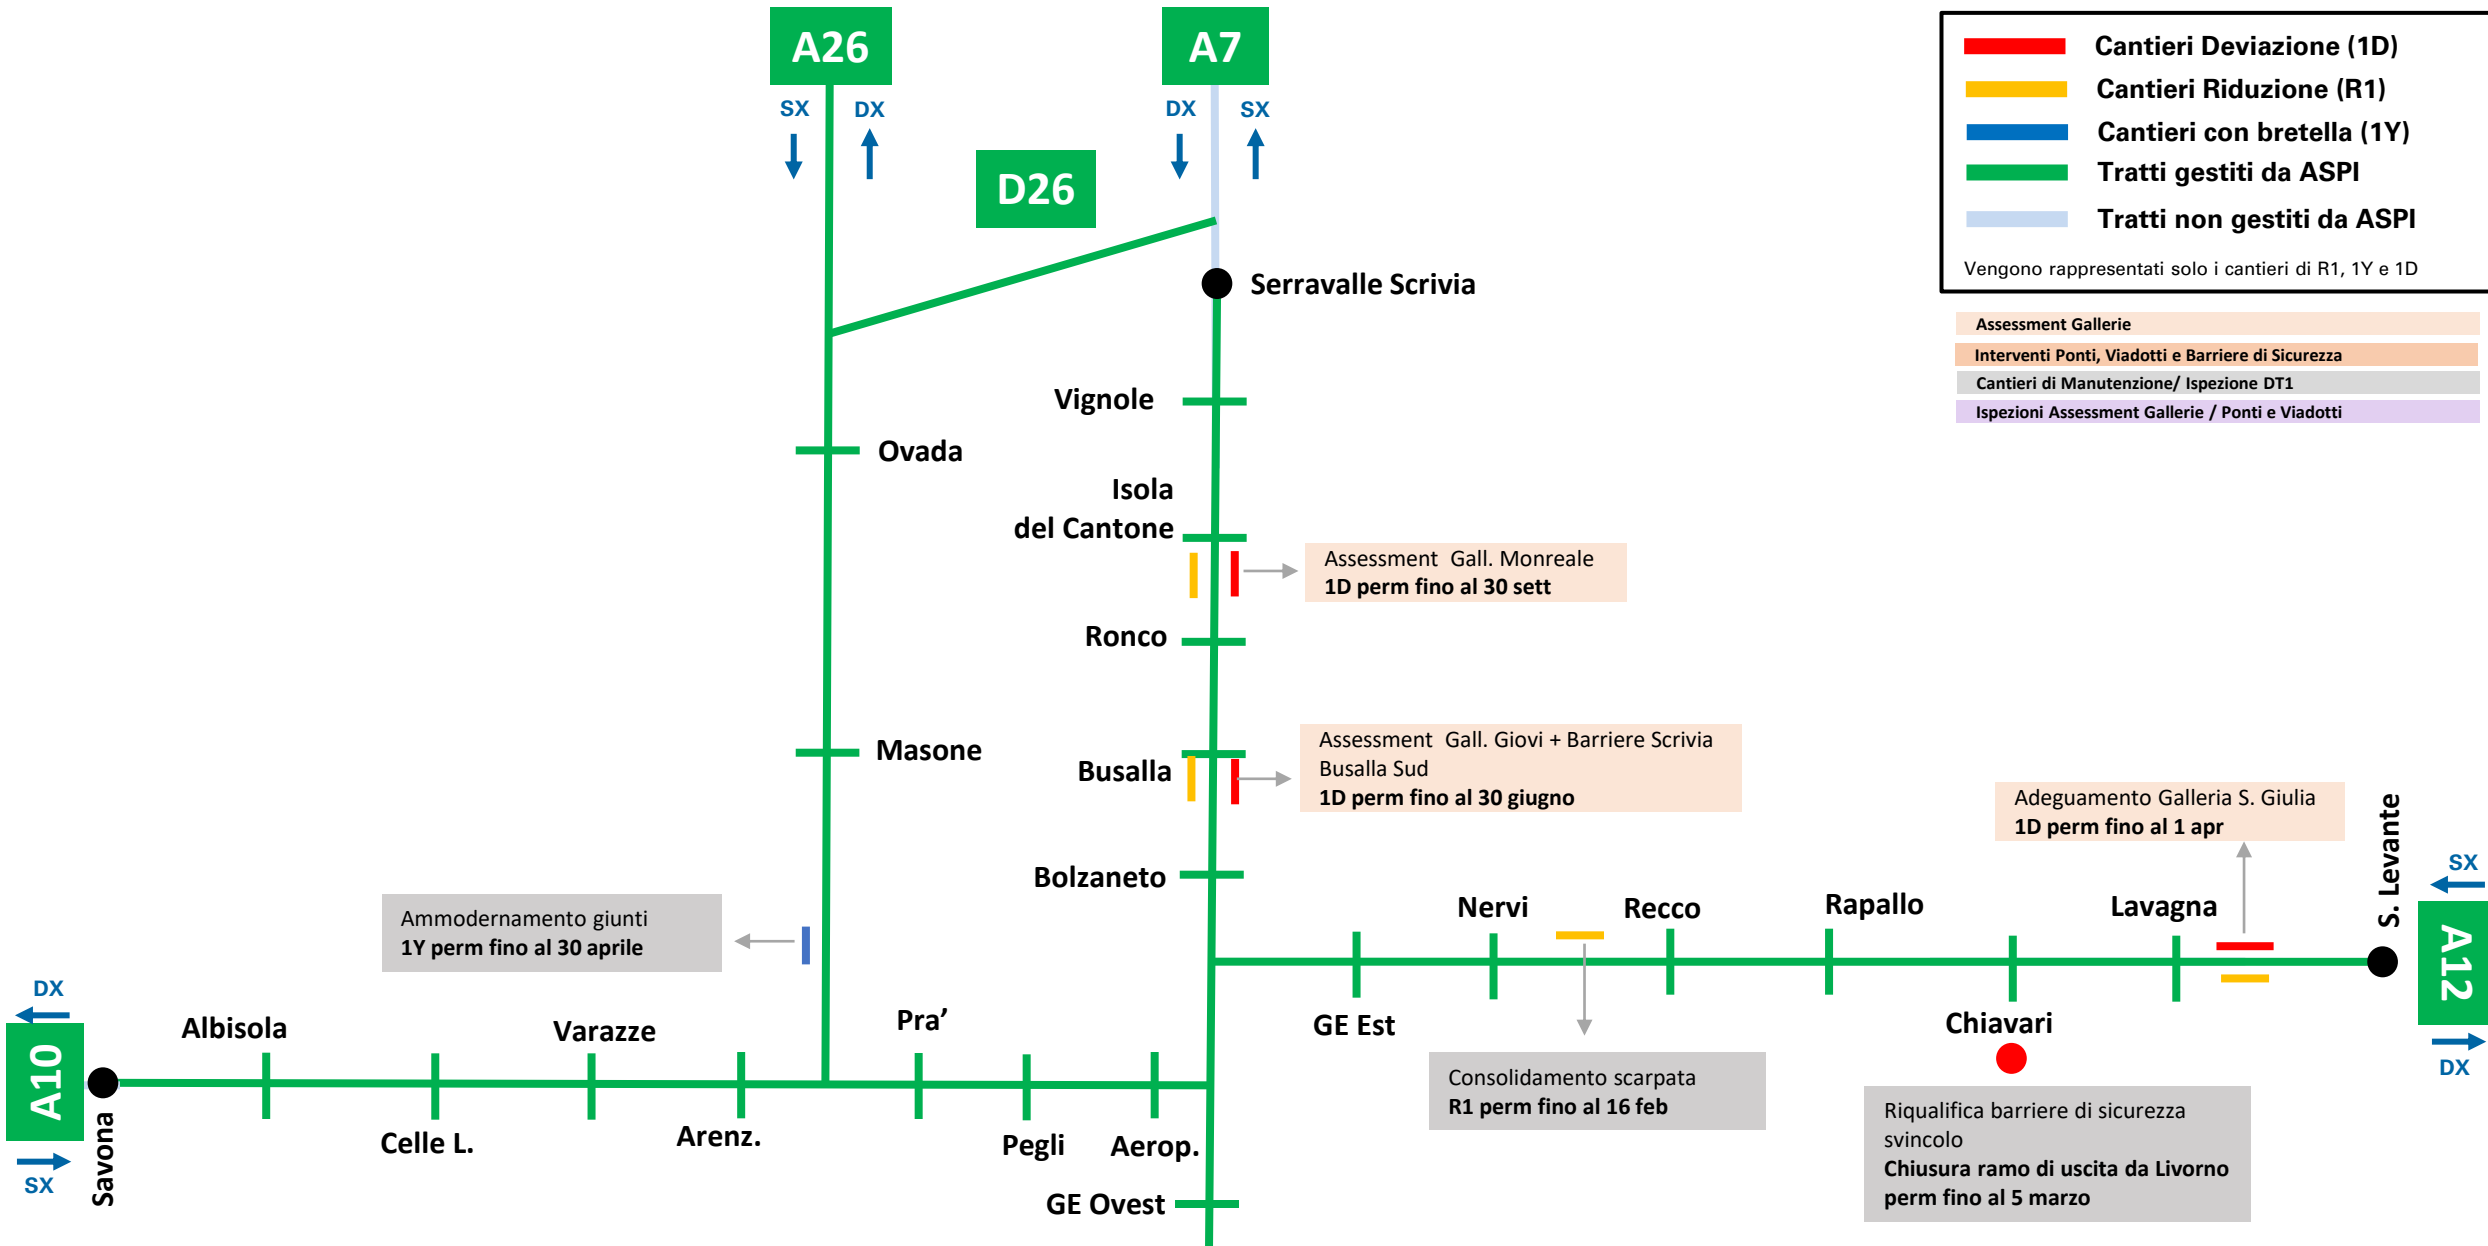

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 16 – domenica 22 febbraio '26

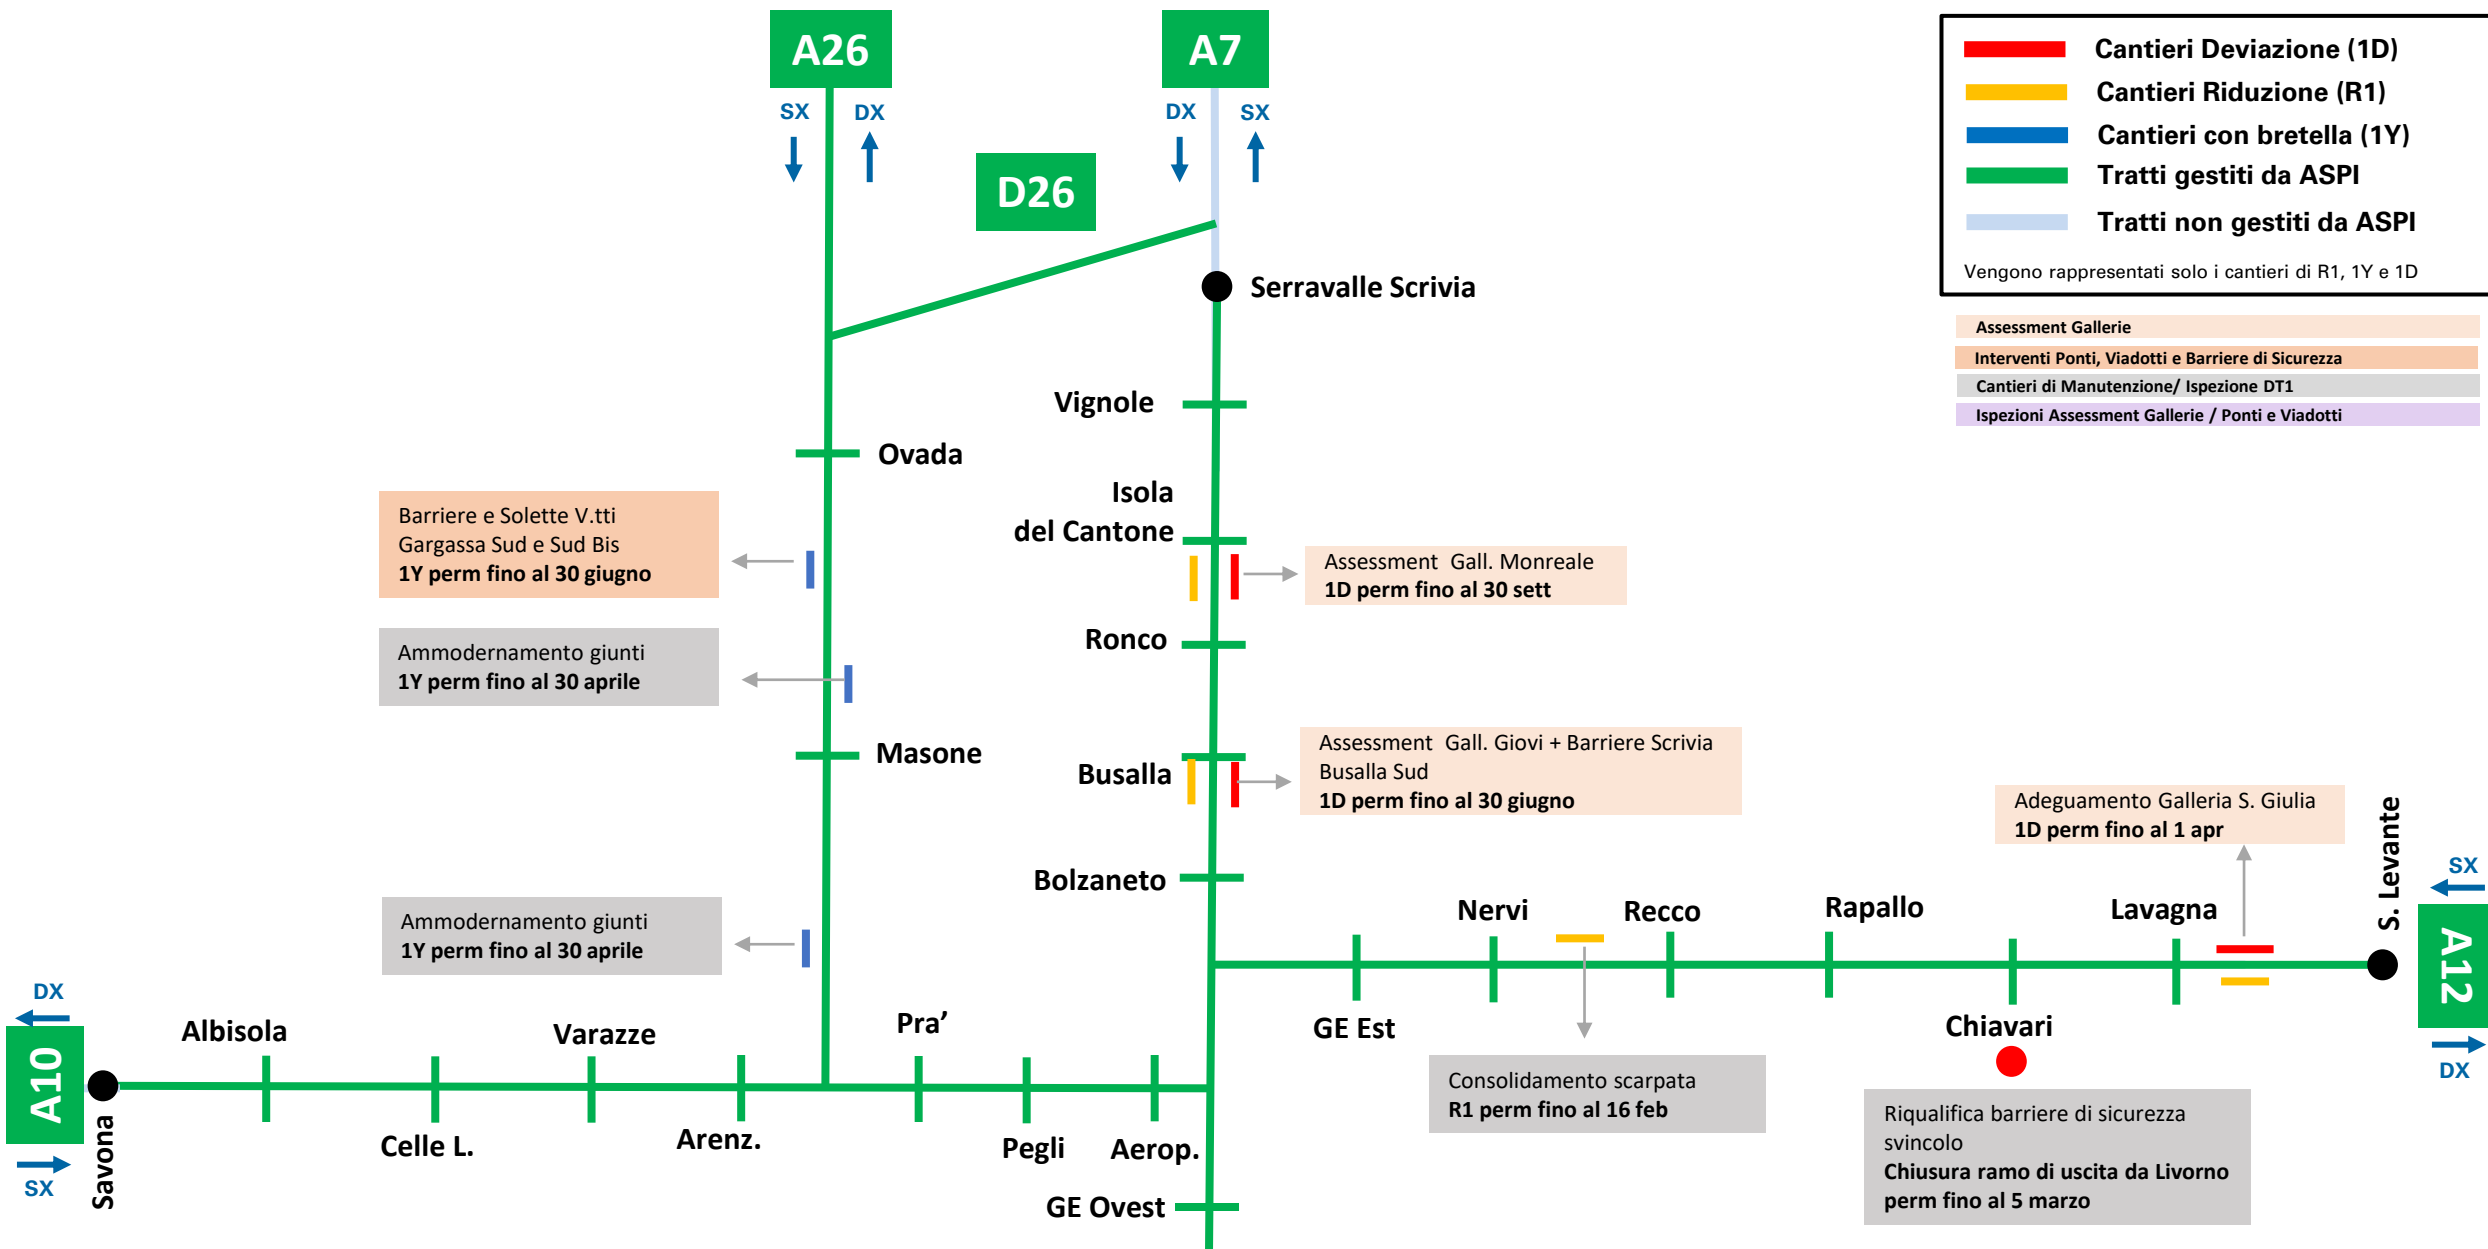


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 23 febbraio – domenica 1 marzo '26

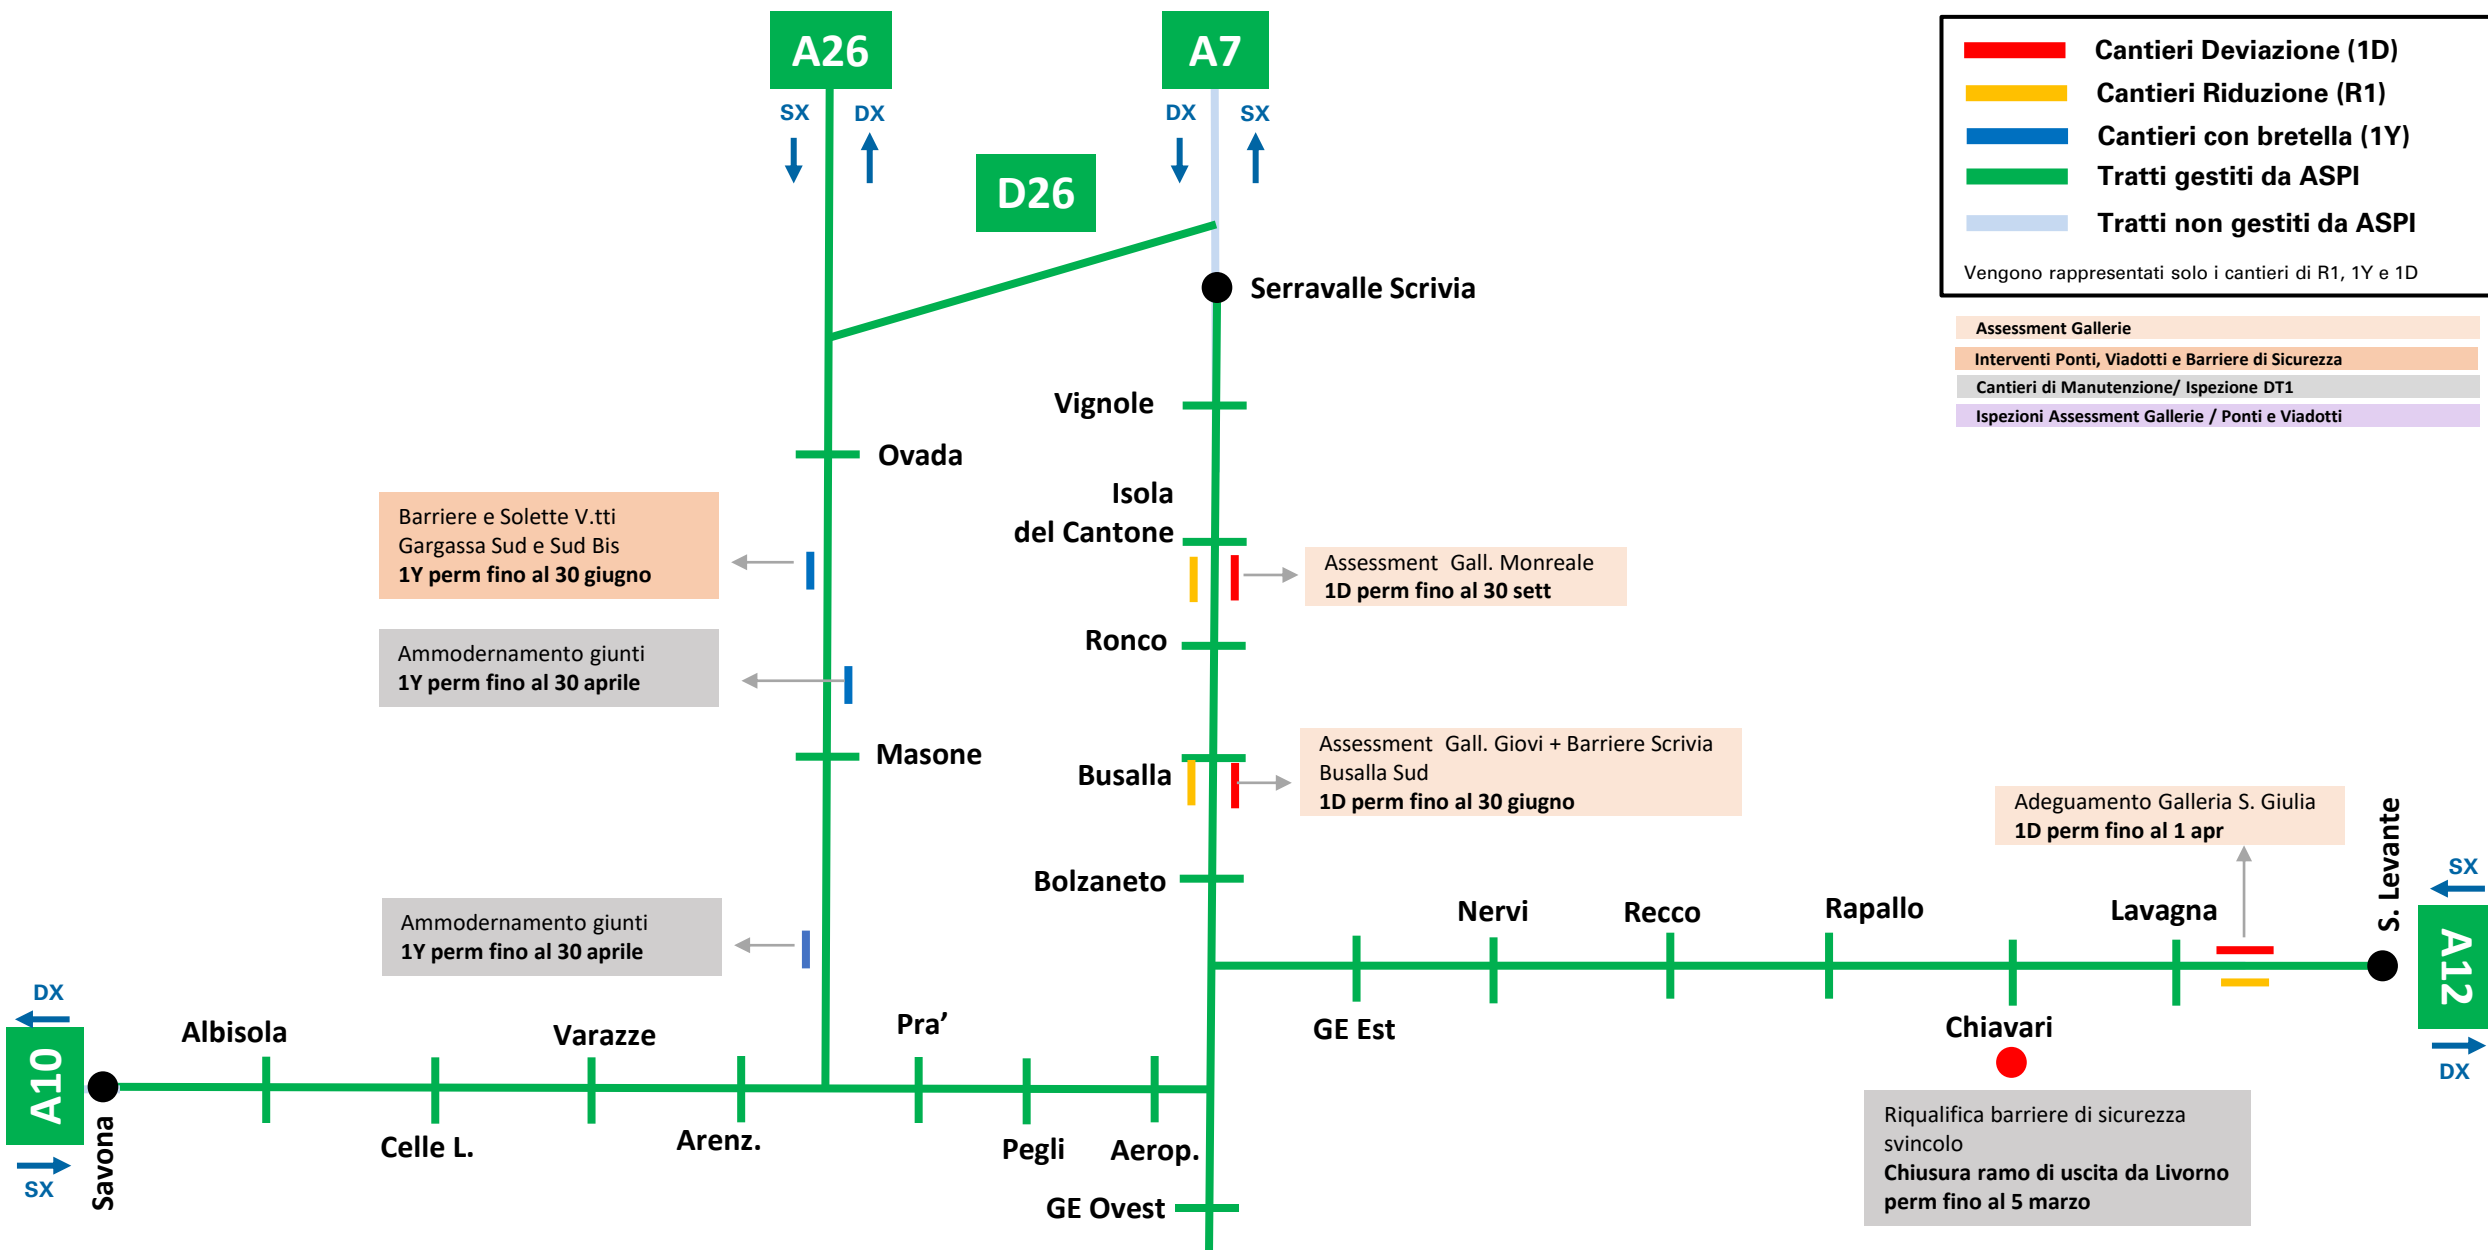


Piano cantieri: Marzo 2026


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 2 – domenica 8 marzo '26

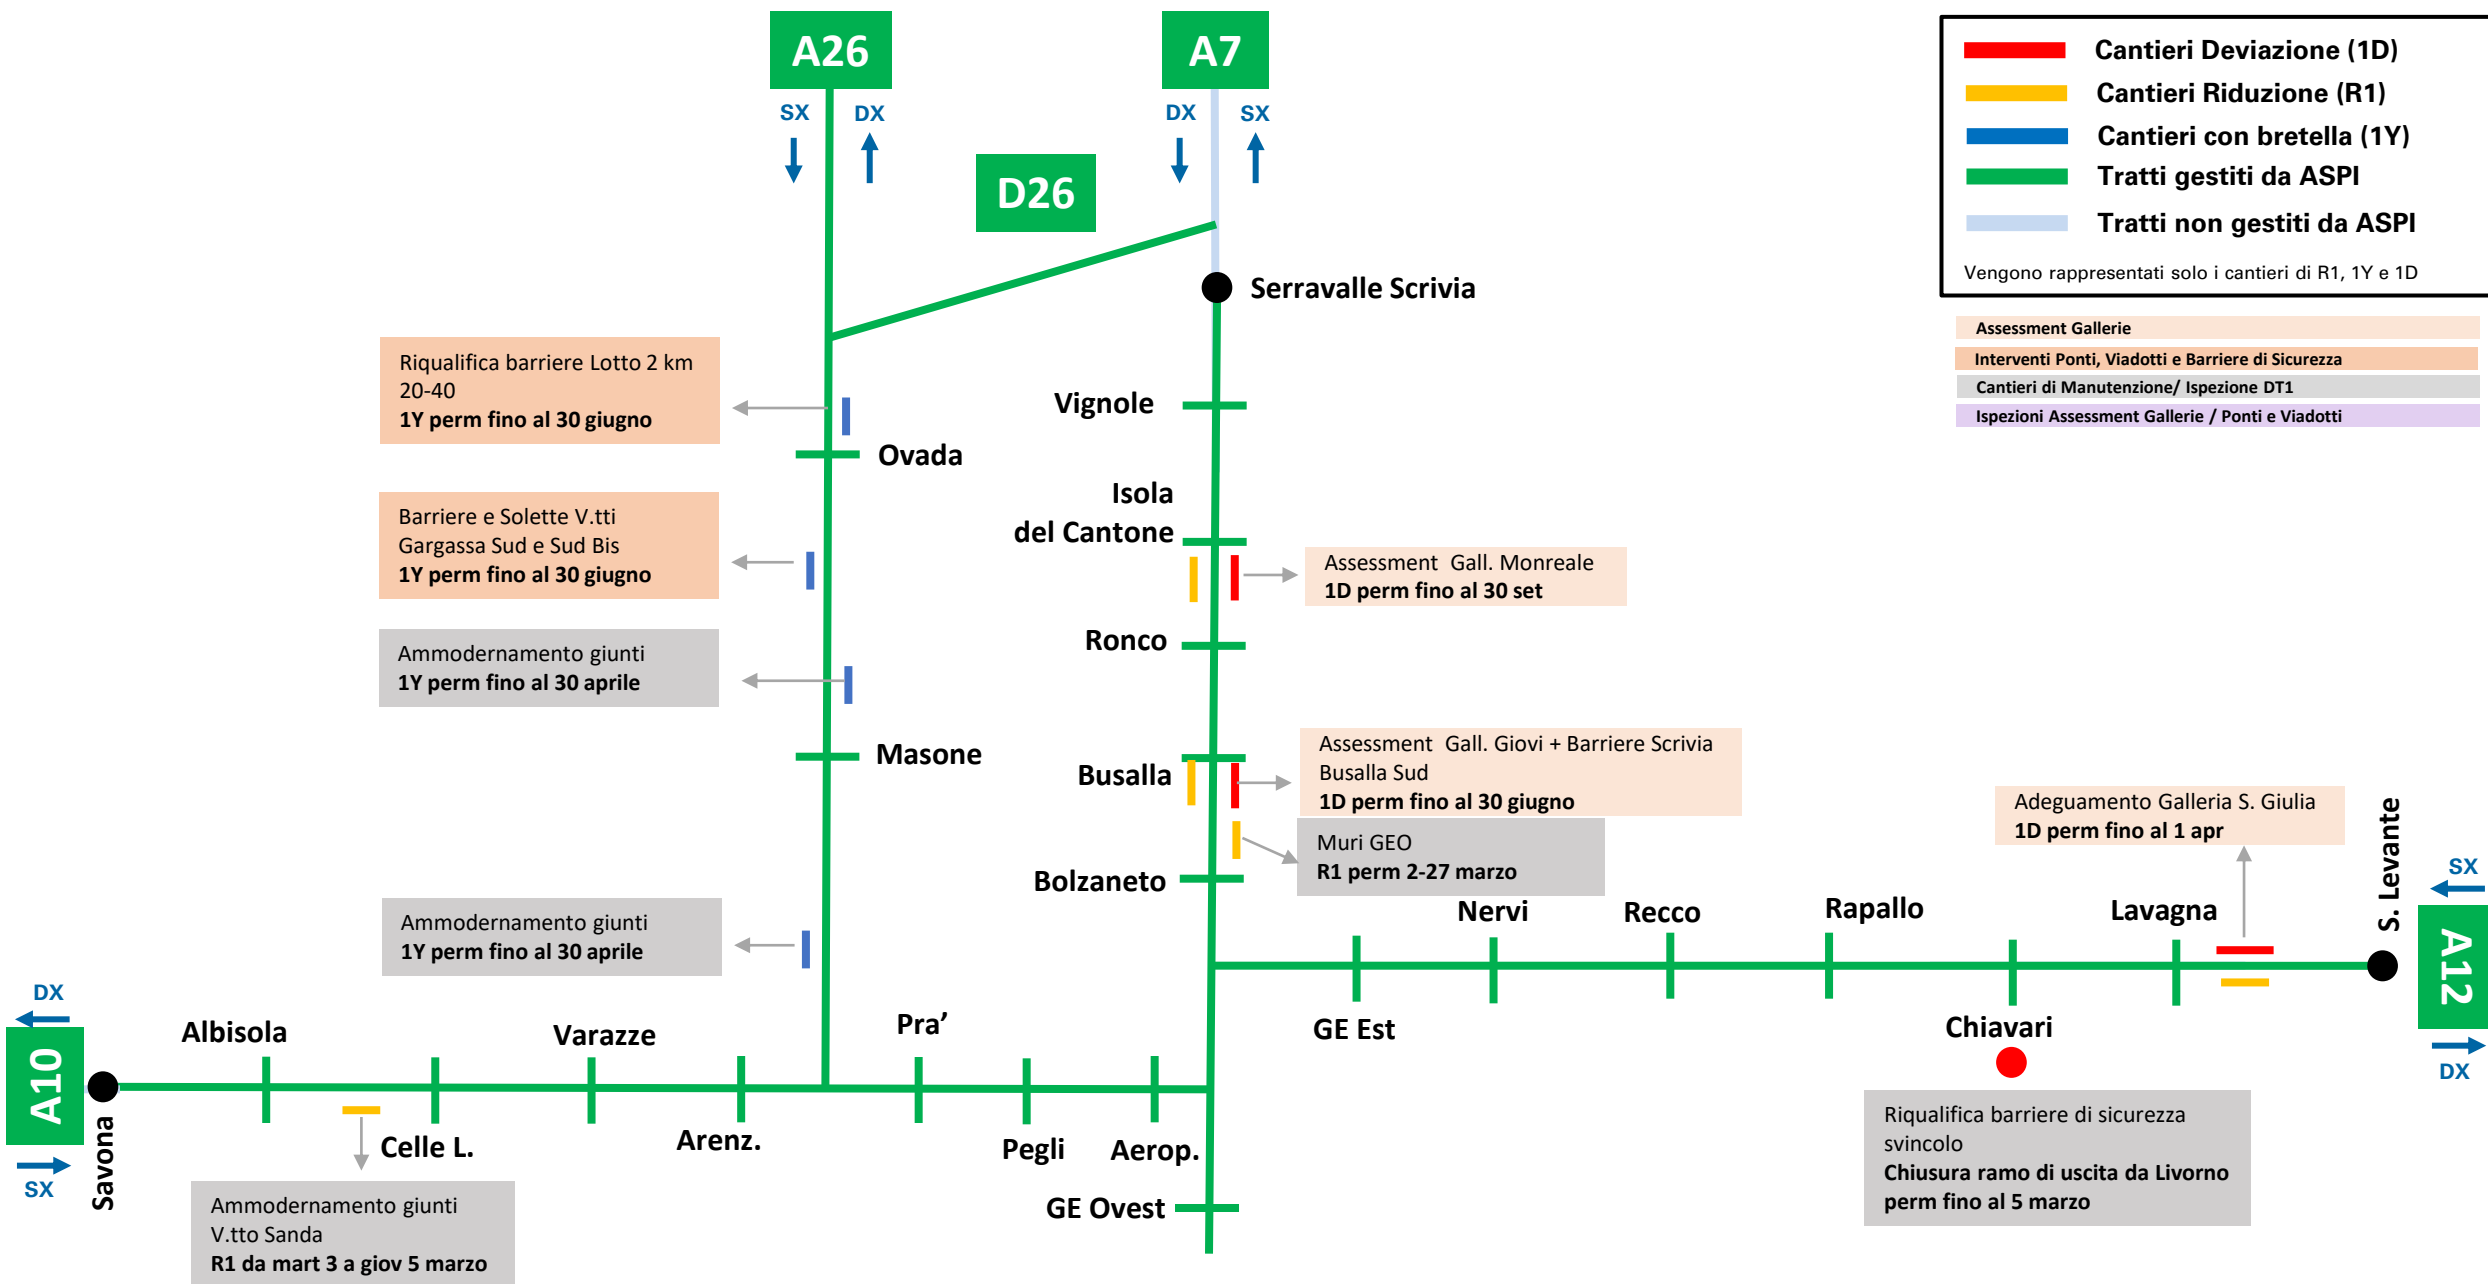


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 9 – domenica 15 marzo '26

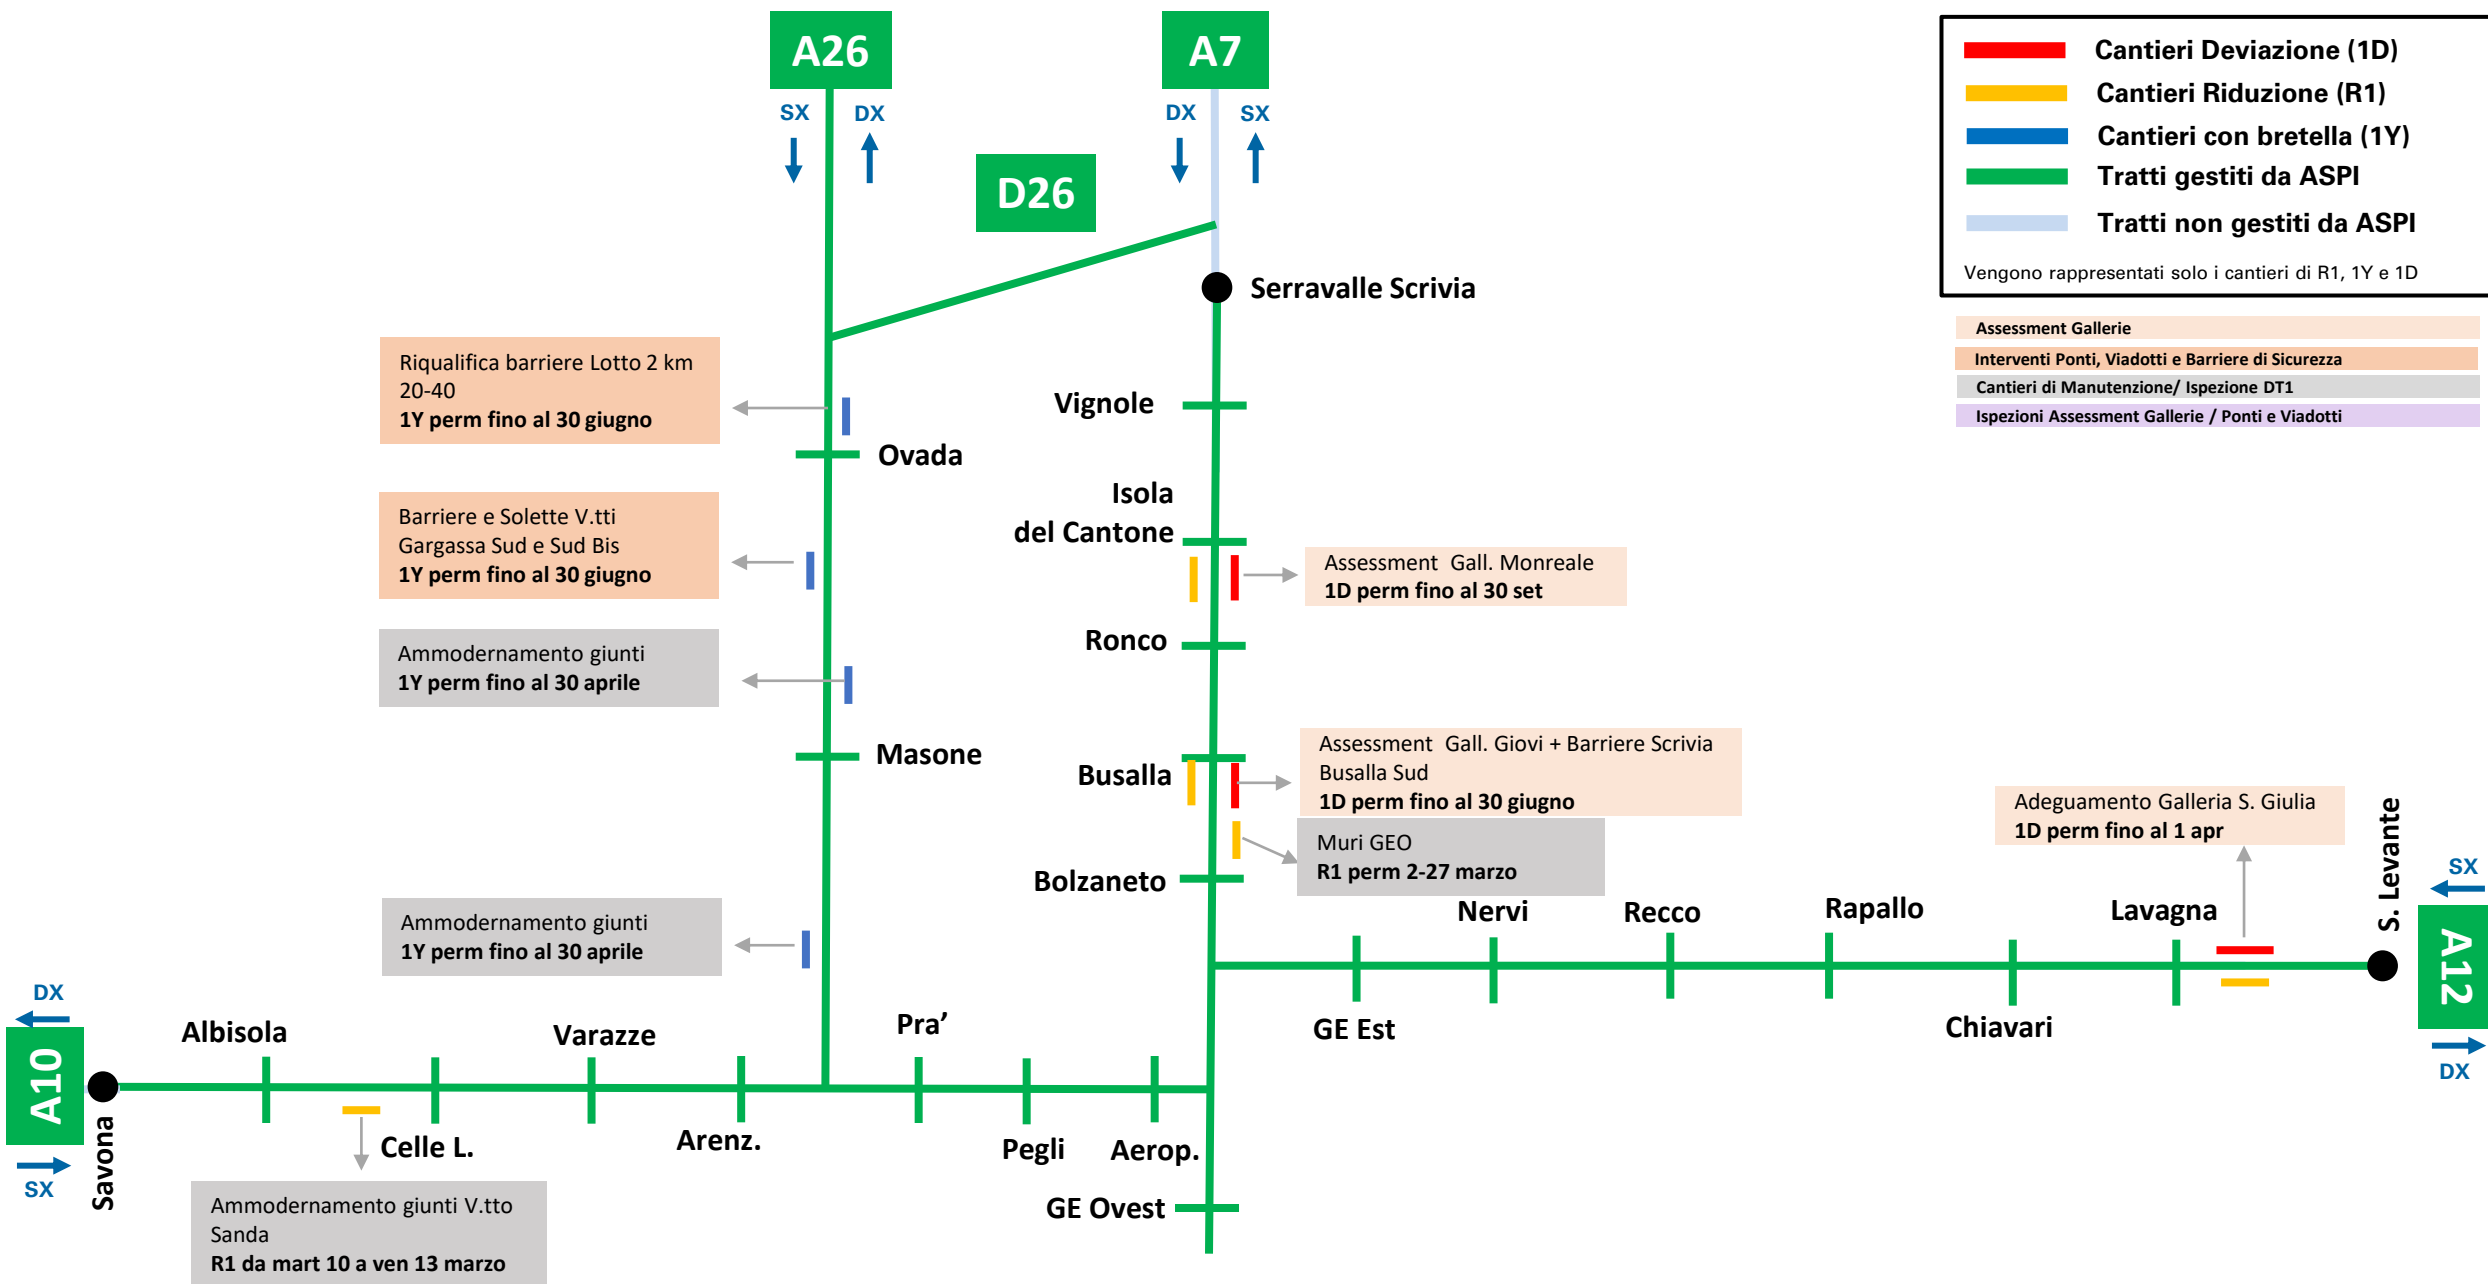

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 16 – domenica 22 marzo '26

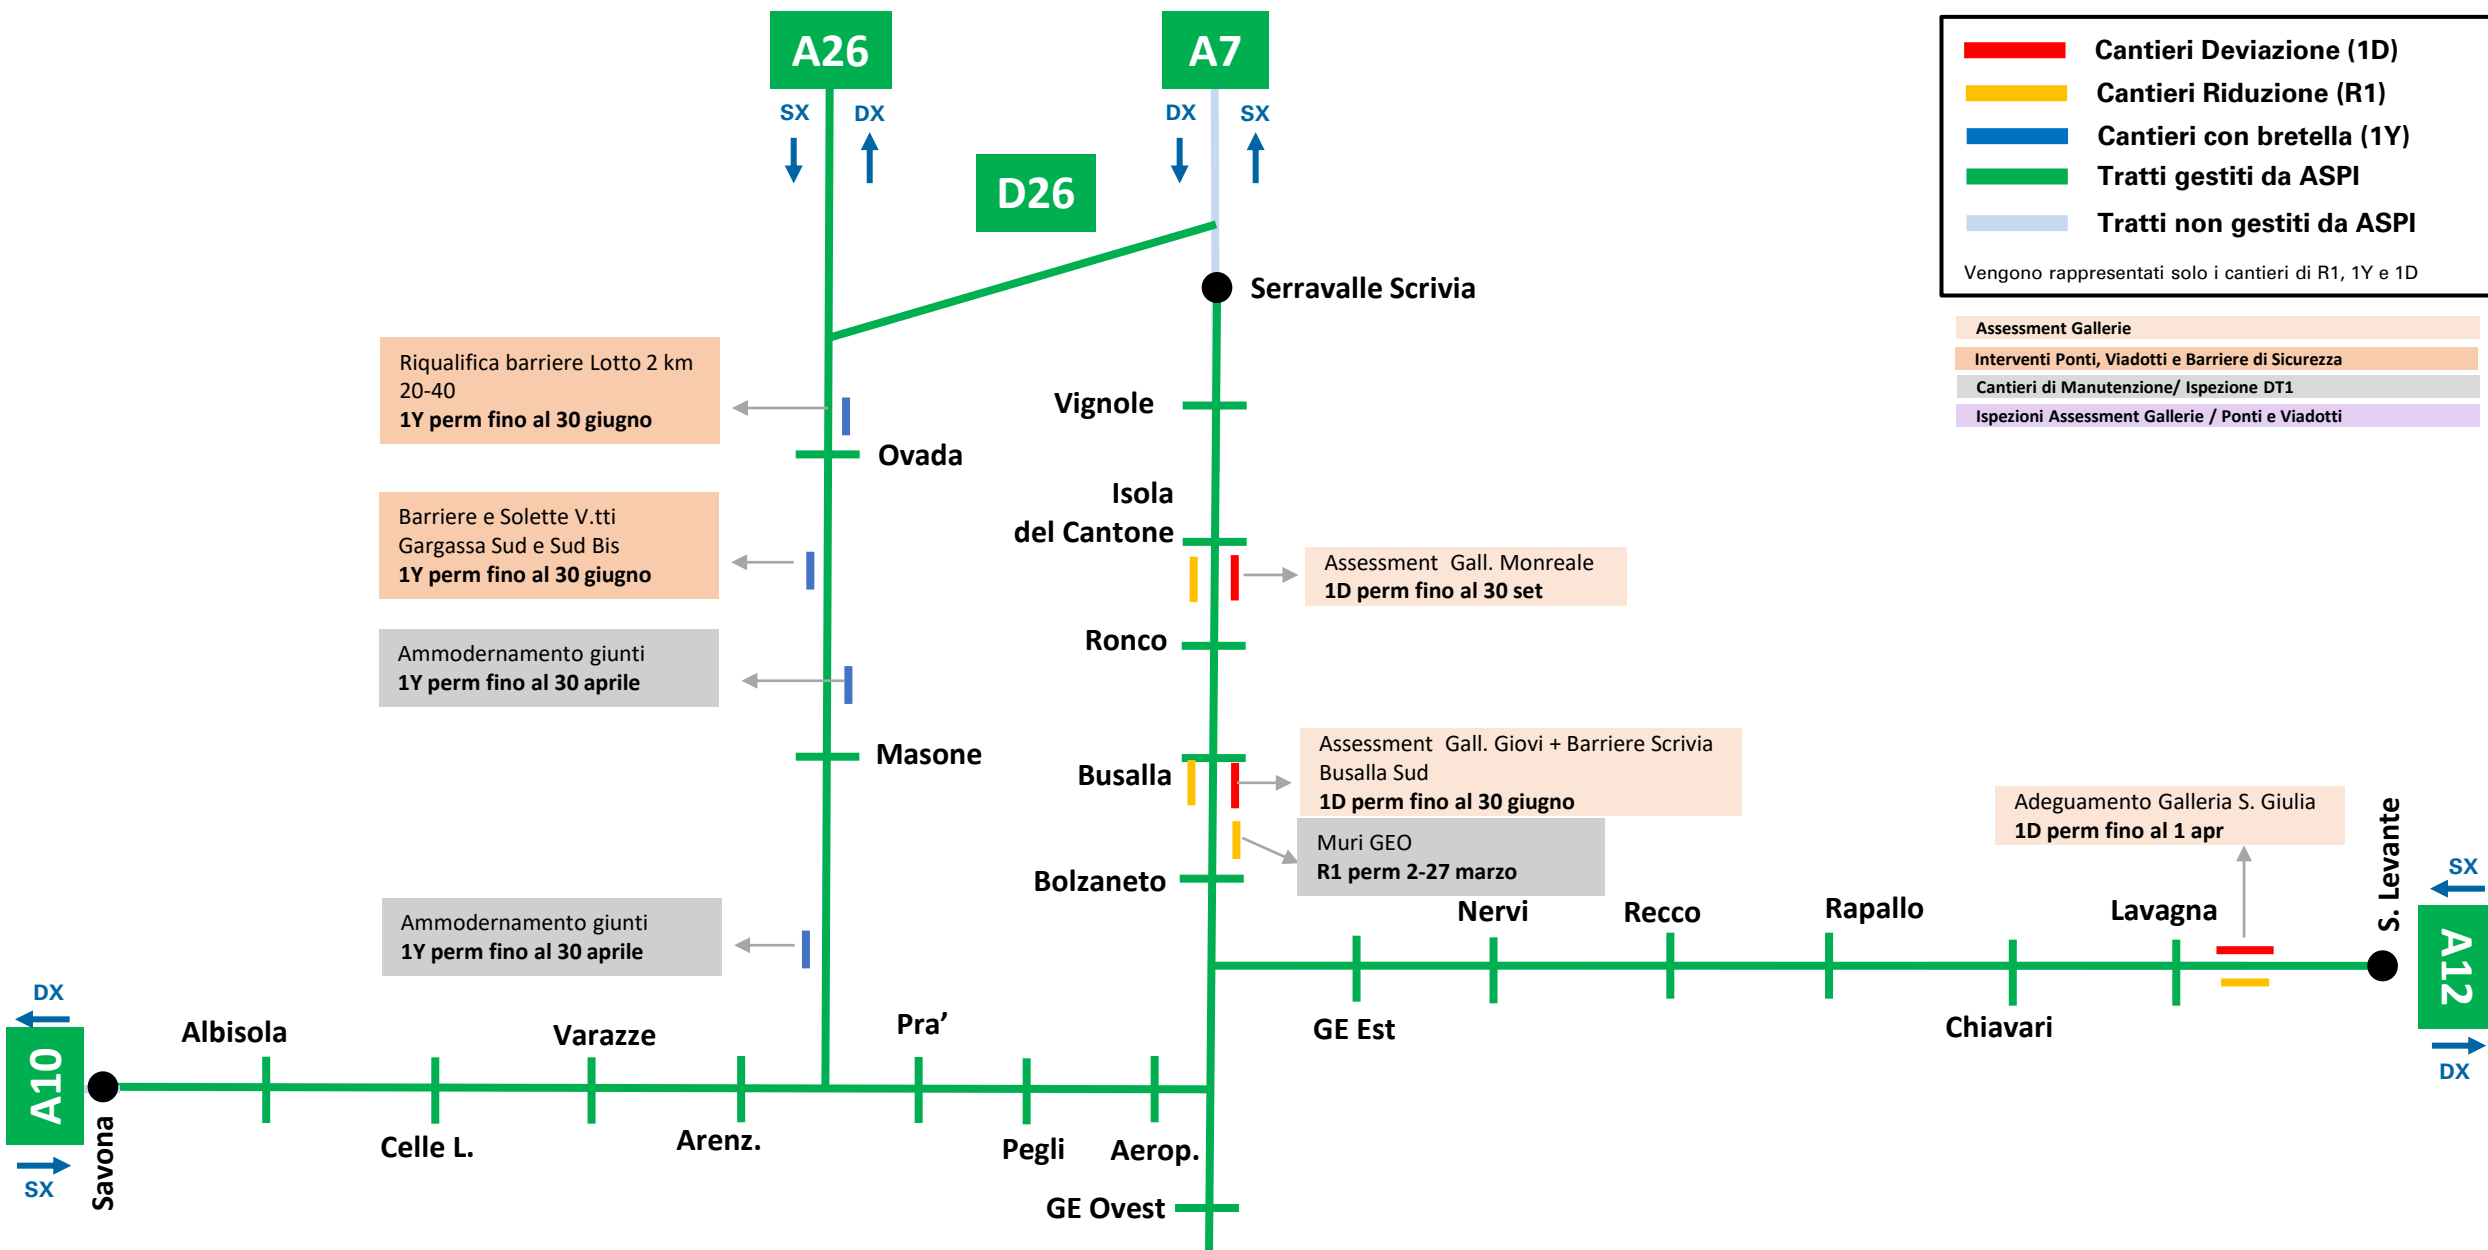


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 23 – domenica 29 marzo '26

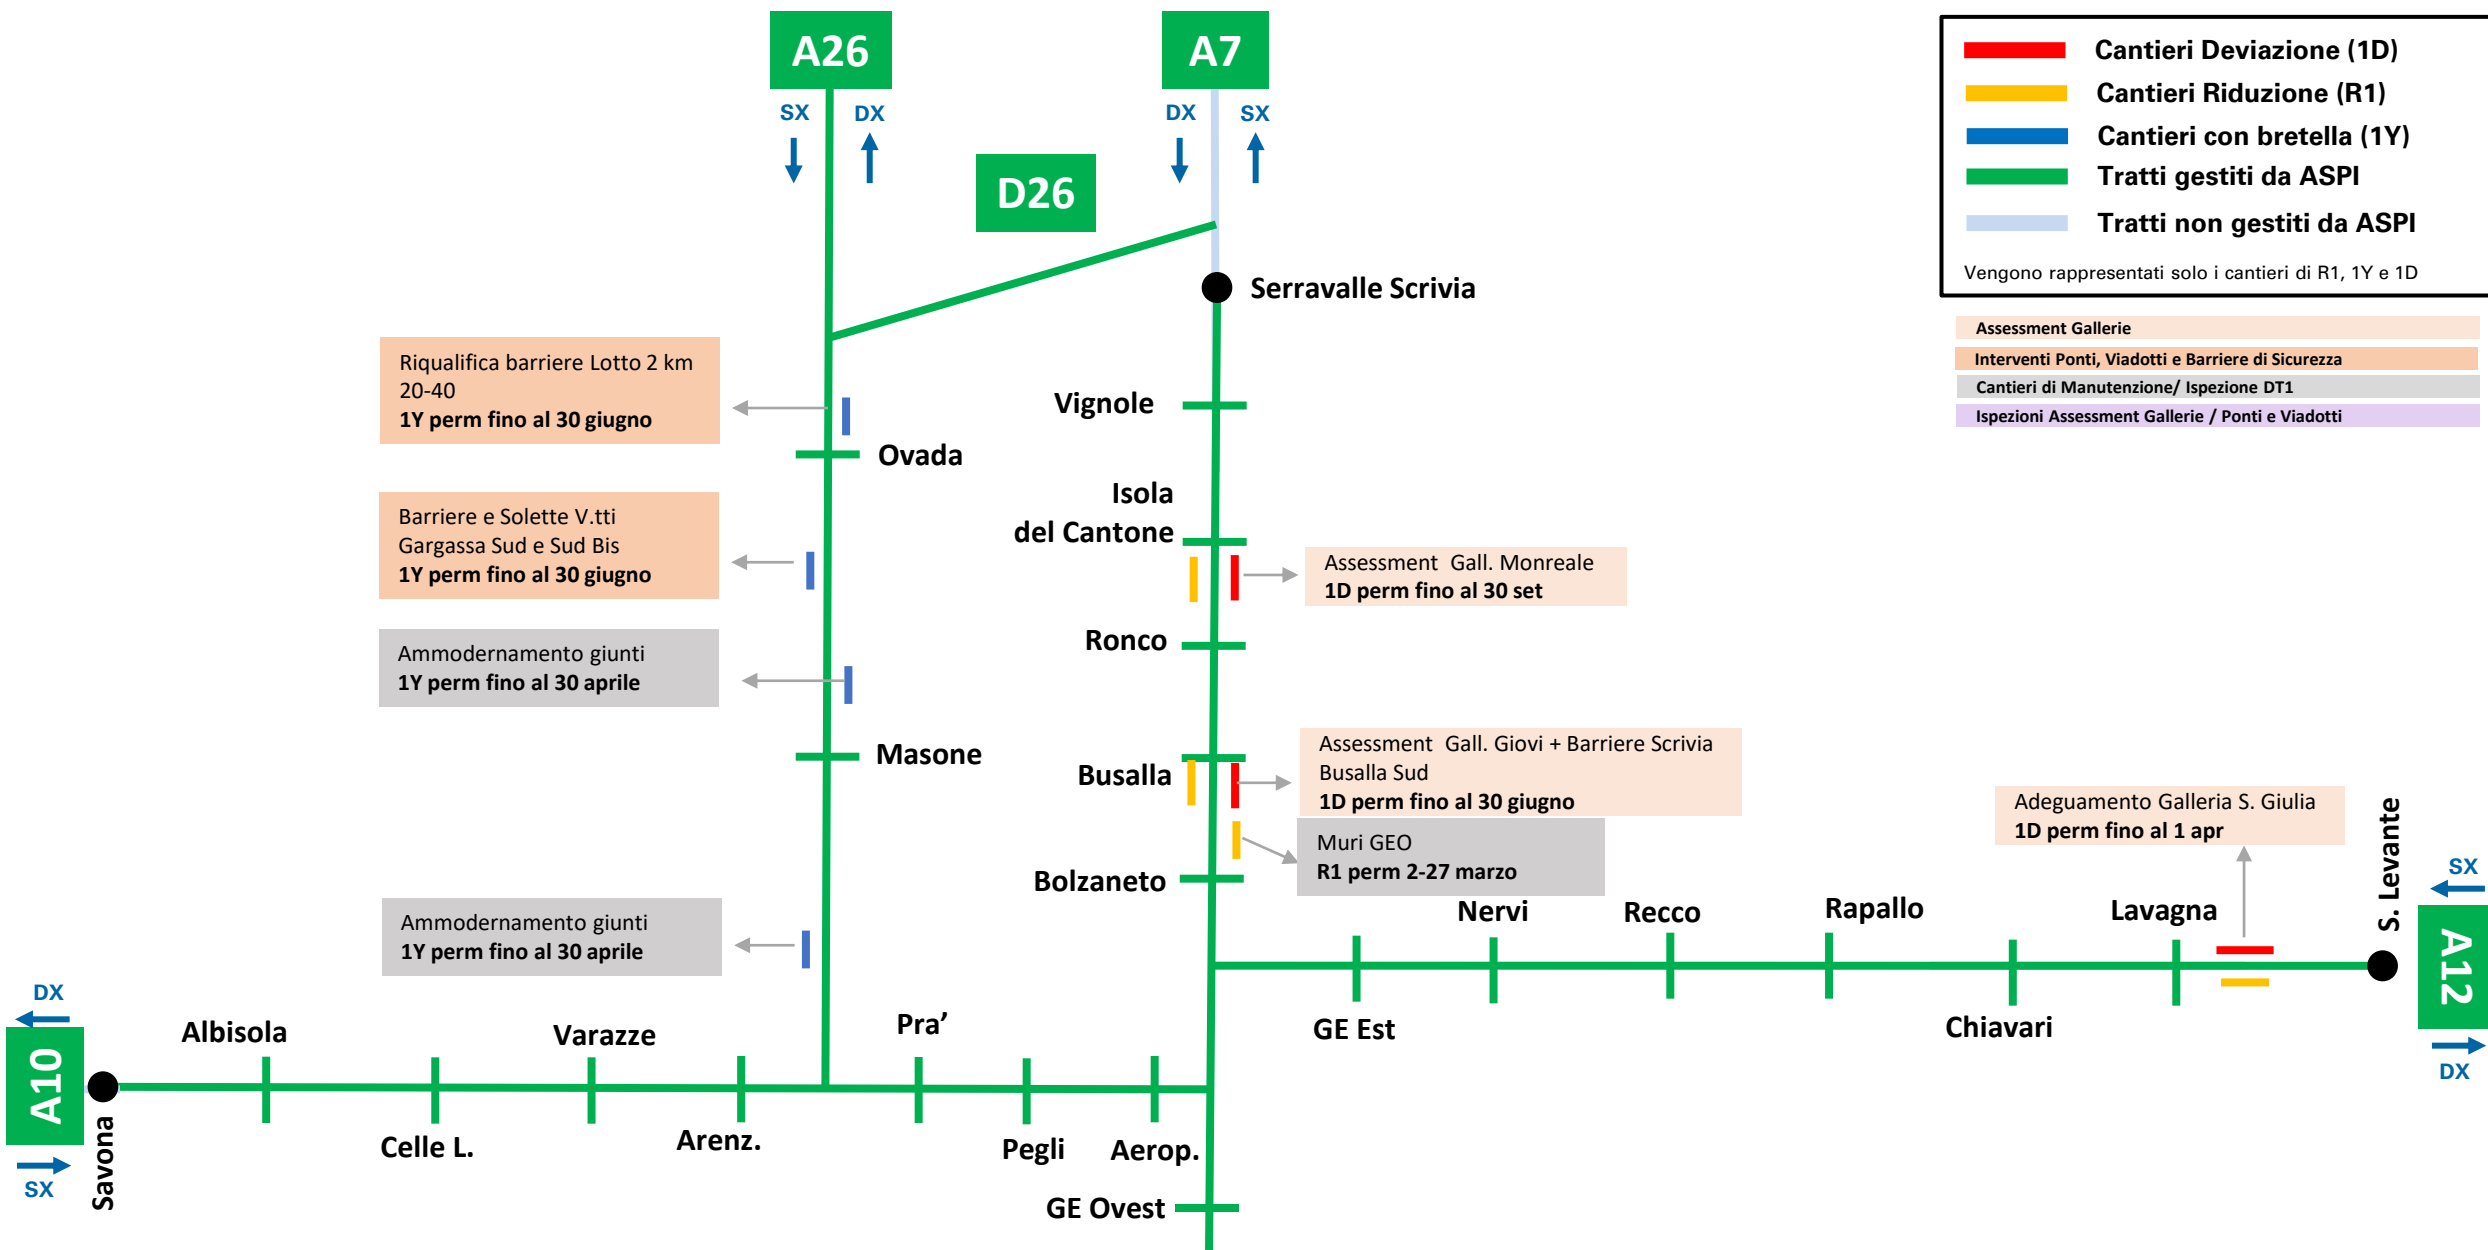


Piano cantieri: Aprile 2026


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 30 marzo – domenica 5 aprile '26

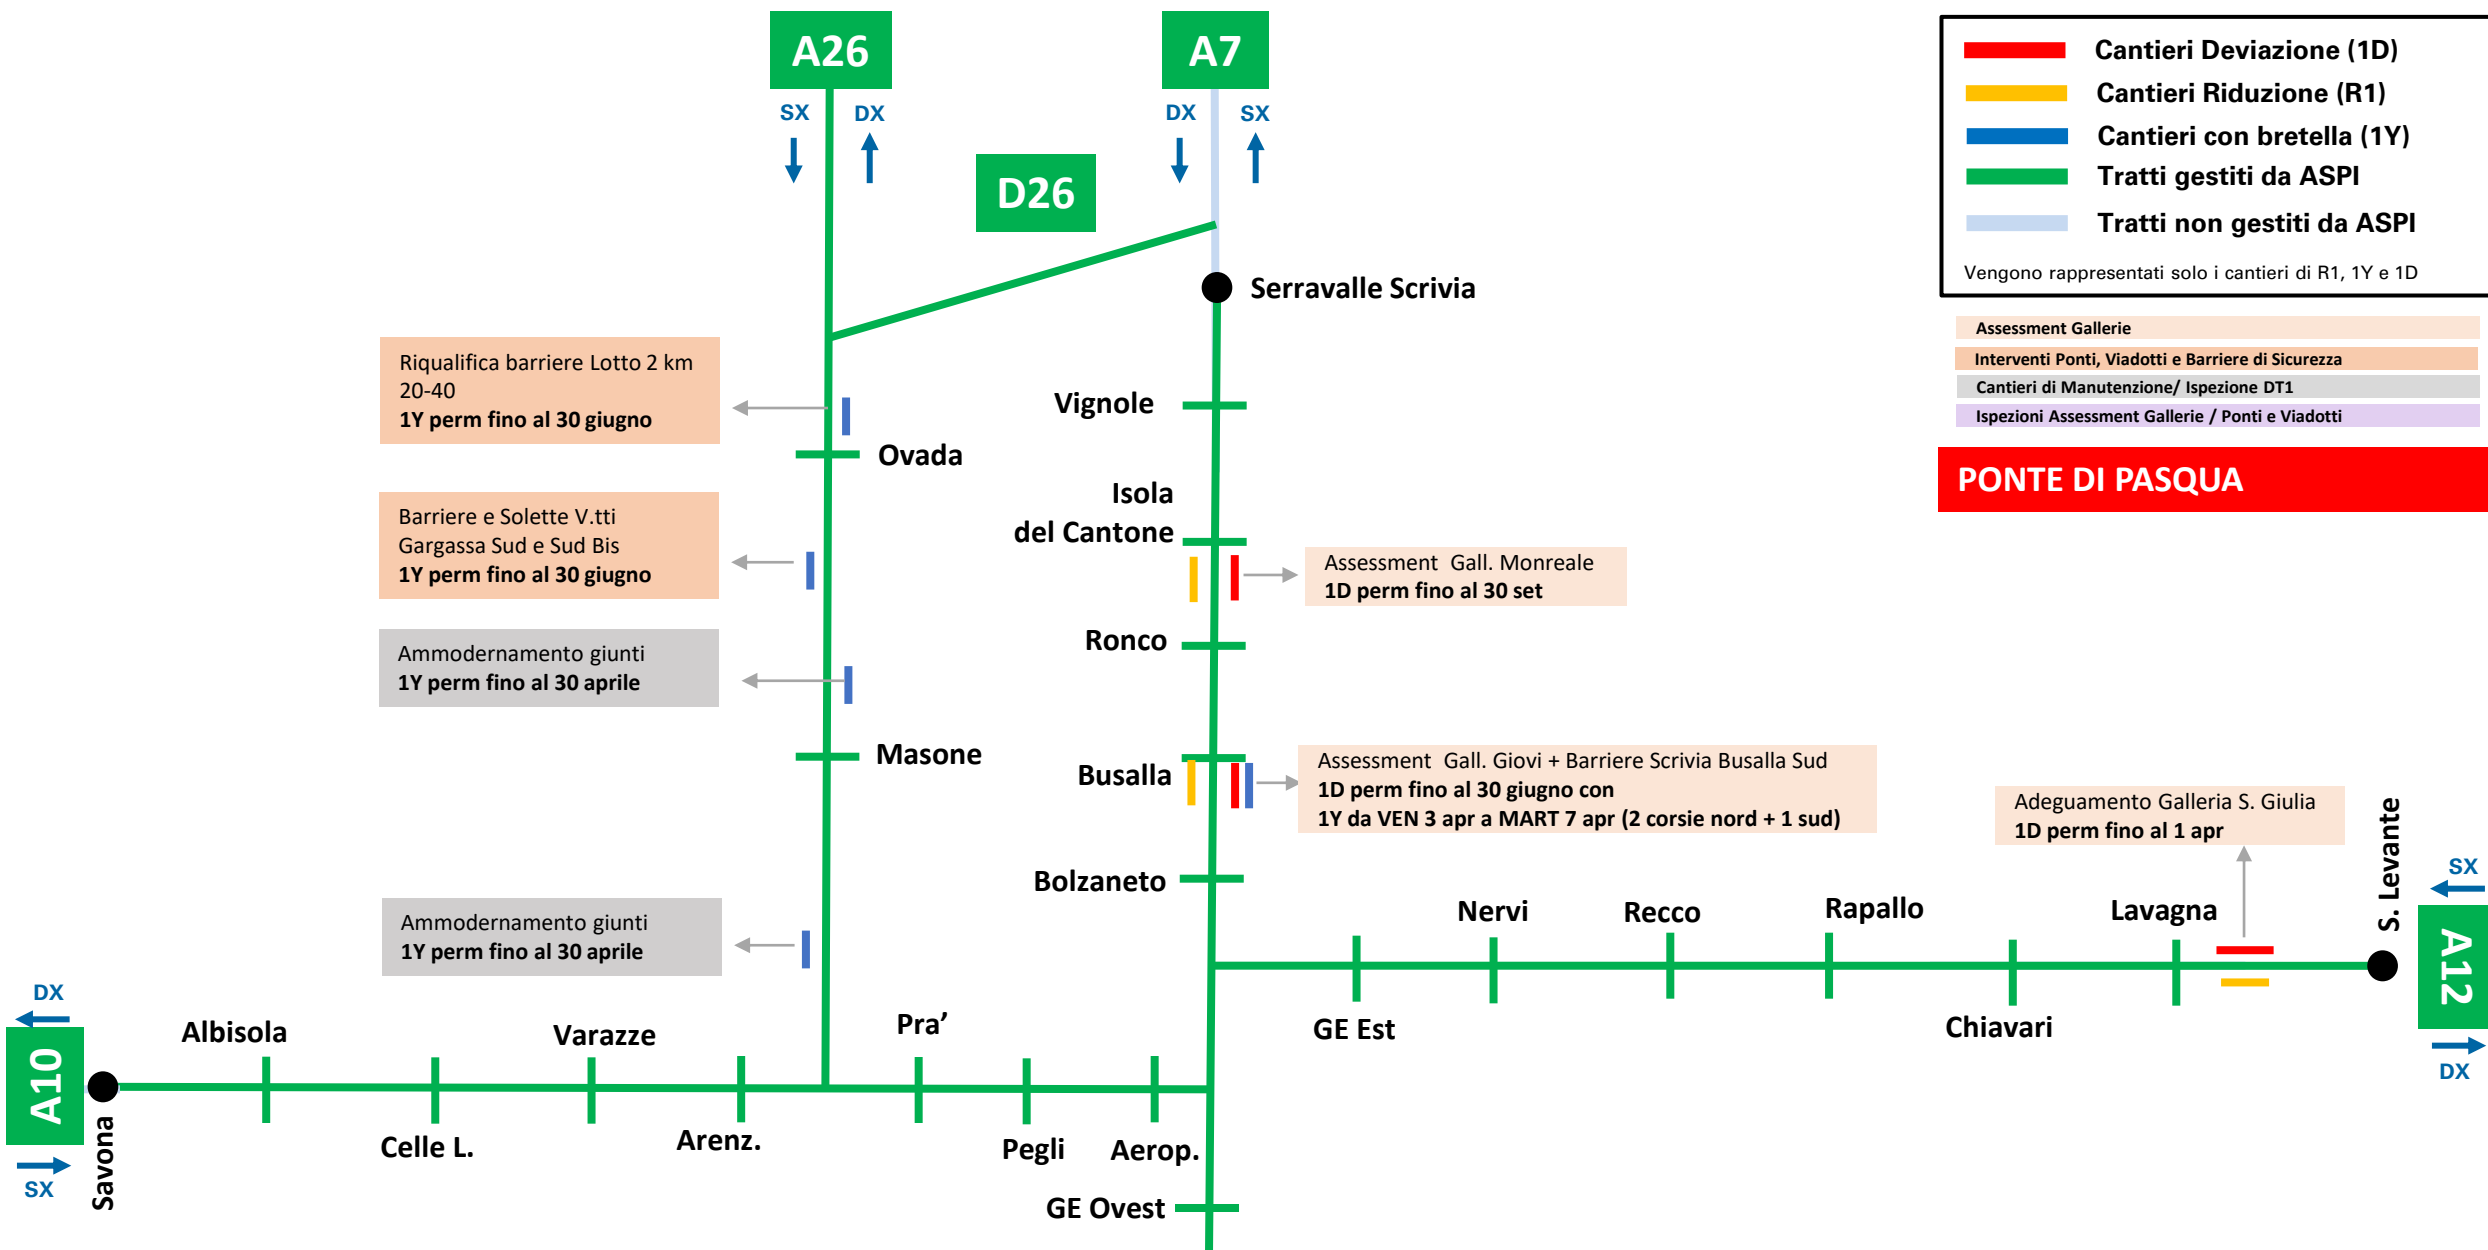


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 6 – domenica 12 aprile '26

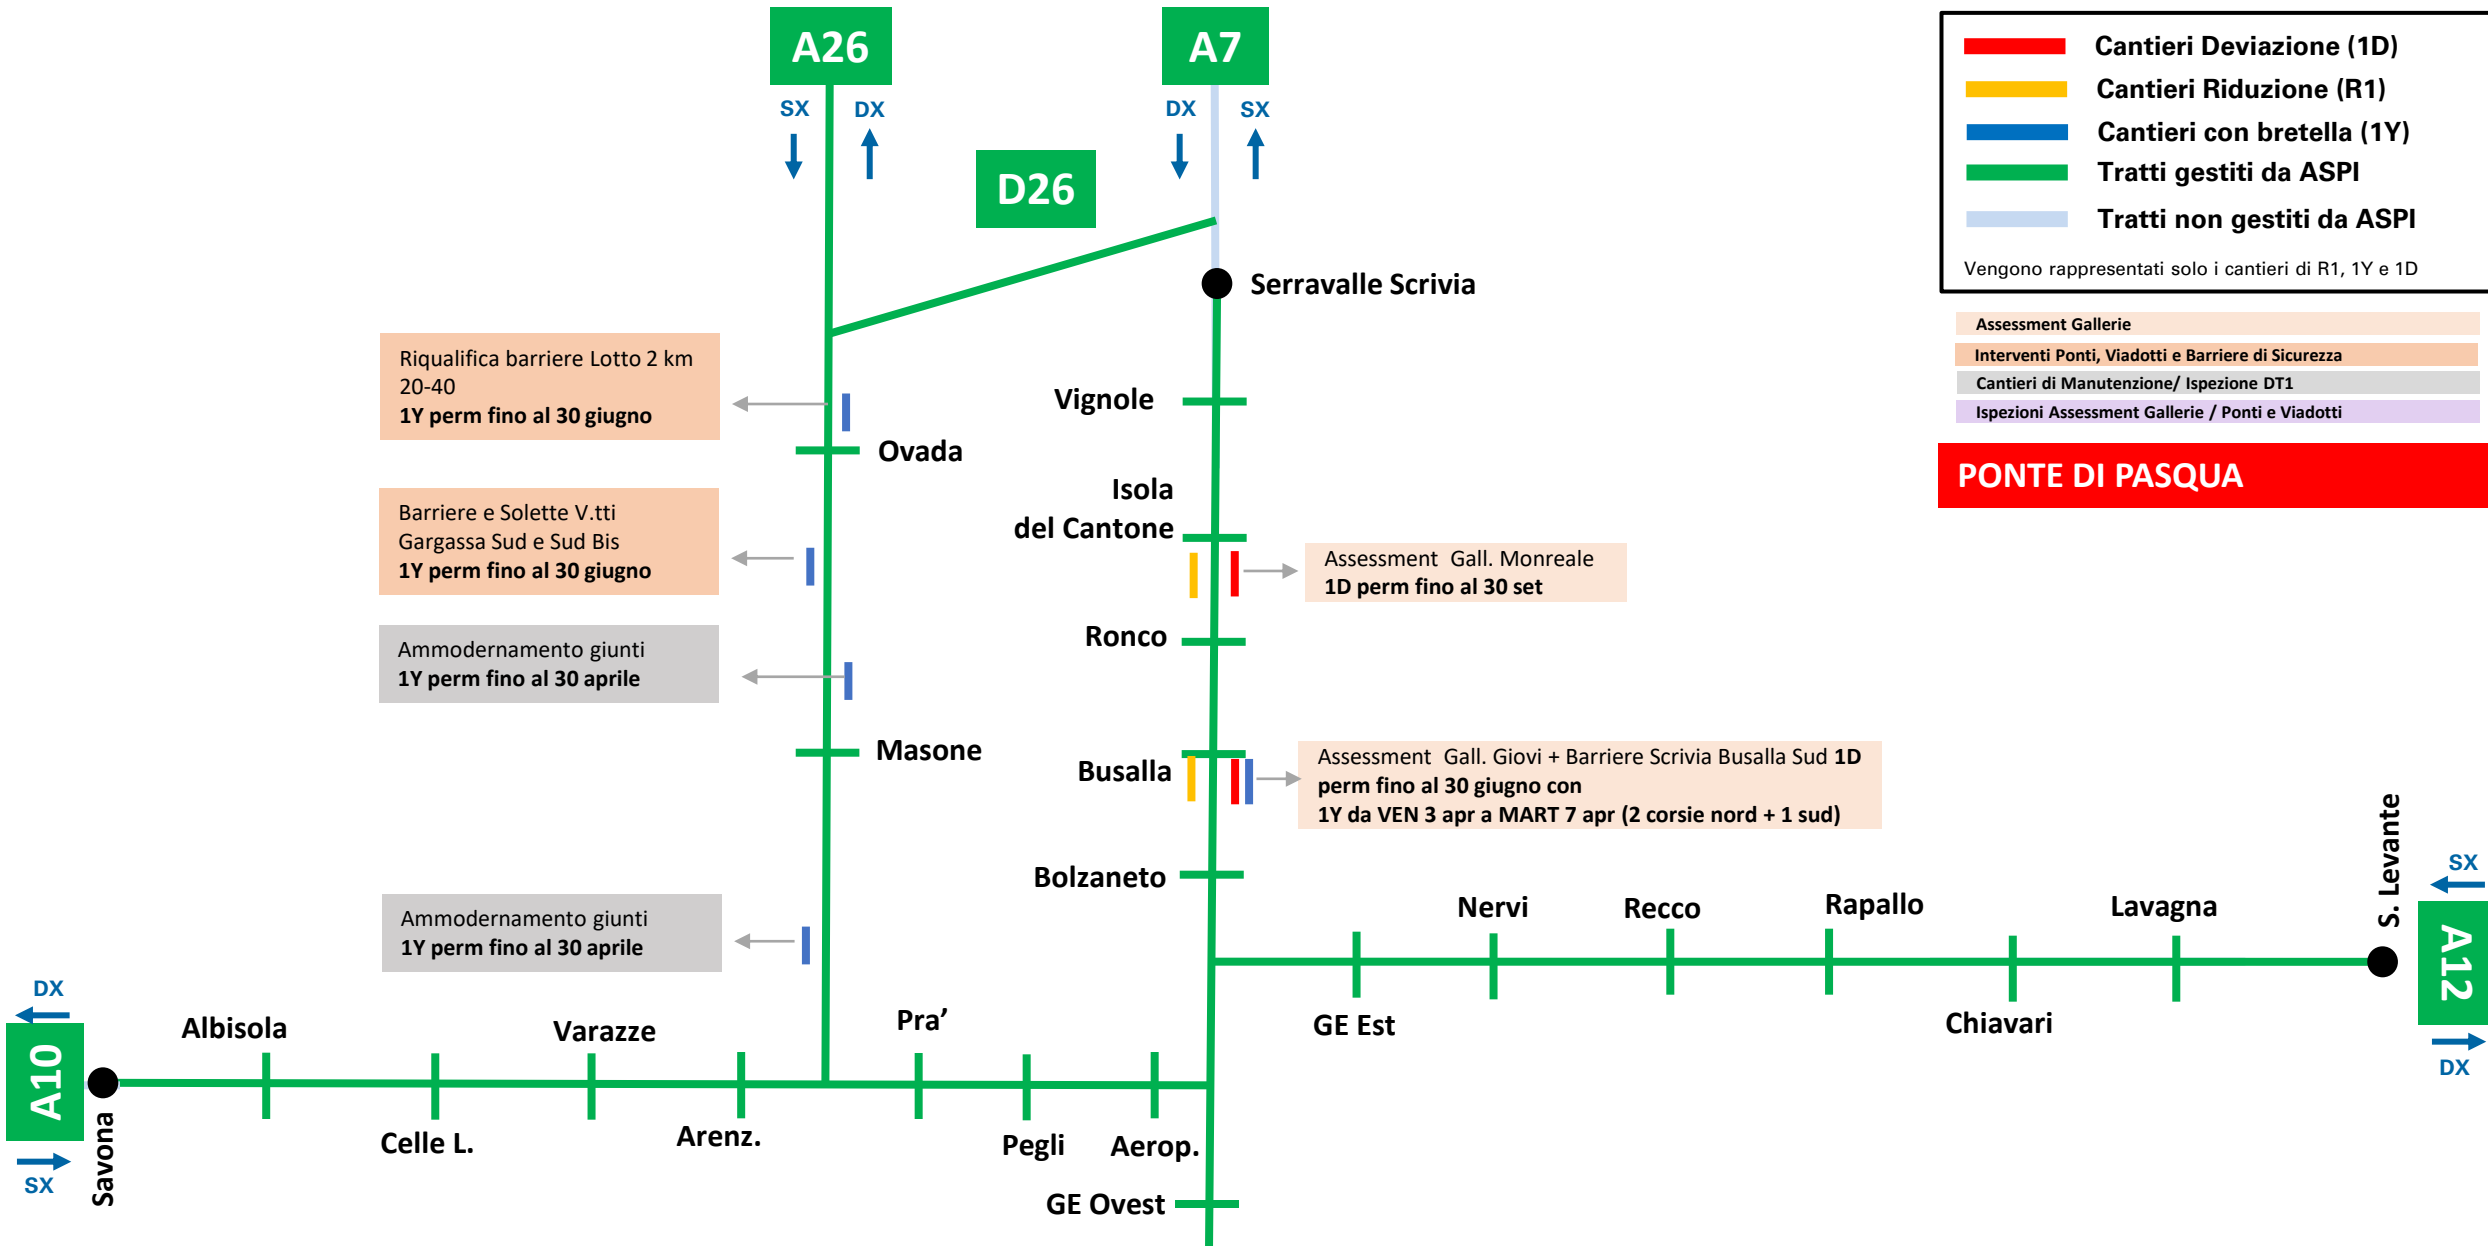


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 13 – domenica 19 aprile '26

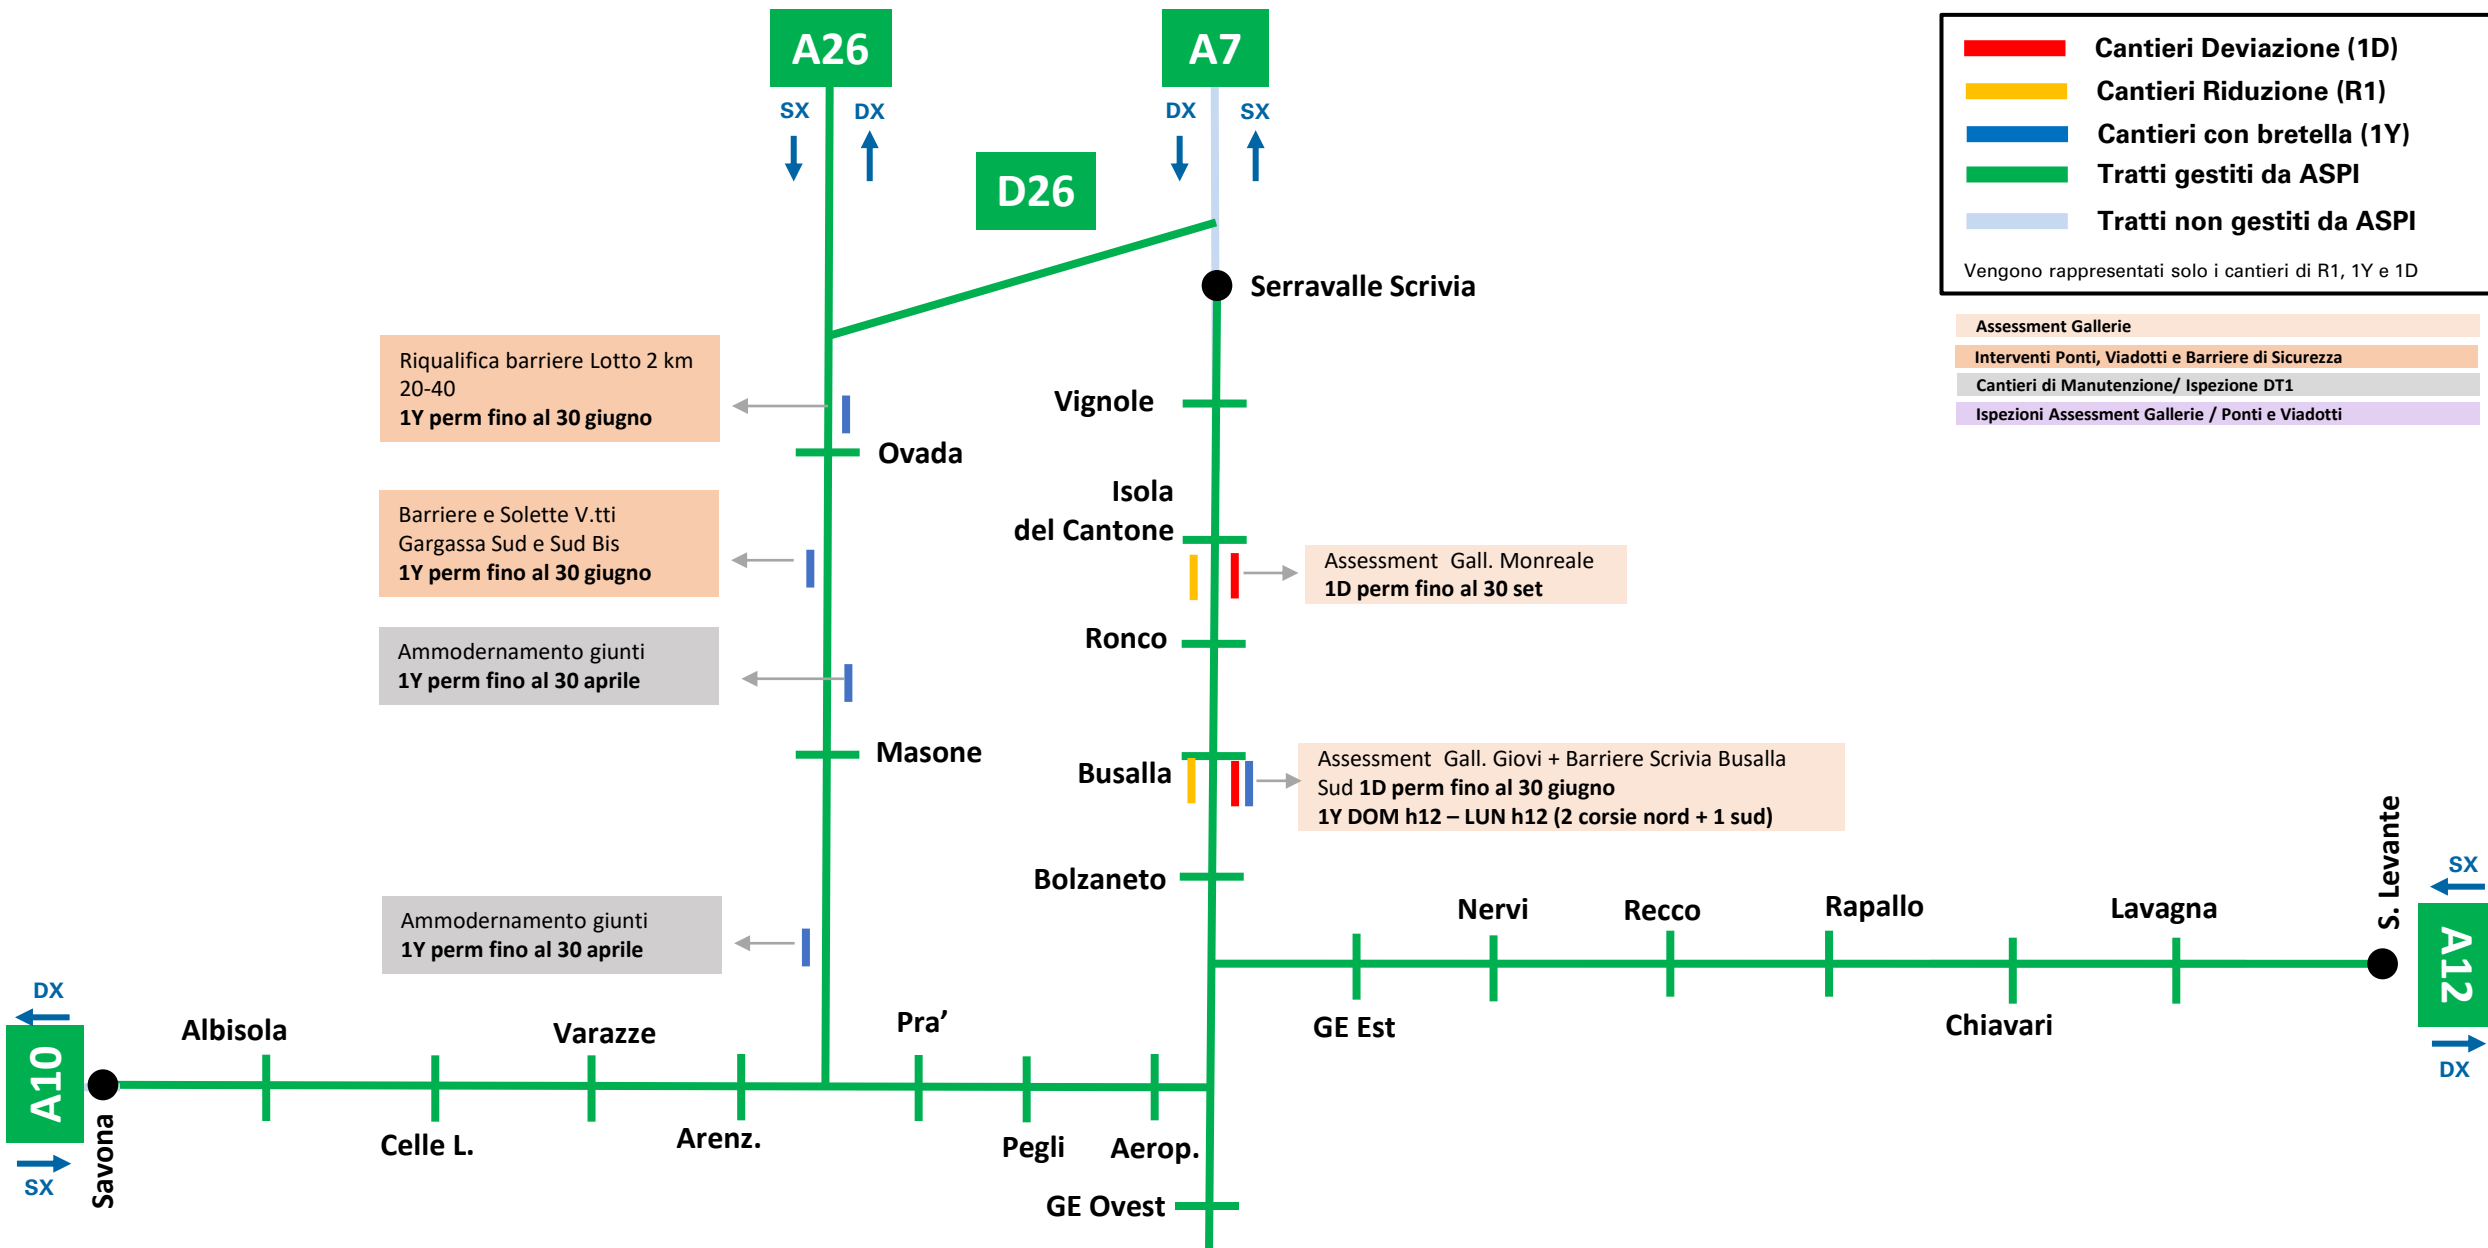

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 20 – domenica 26 aprile '26

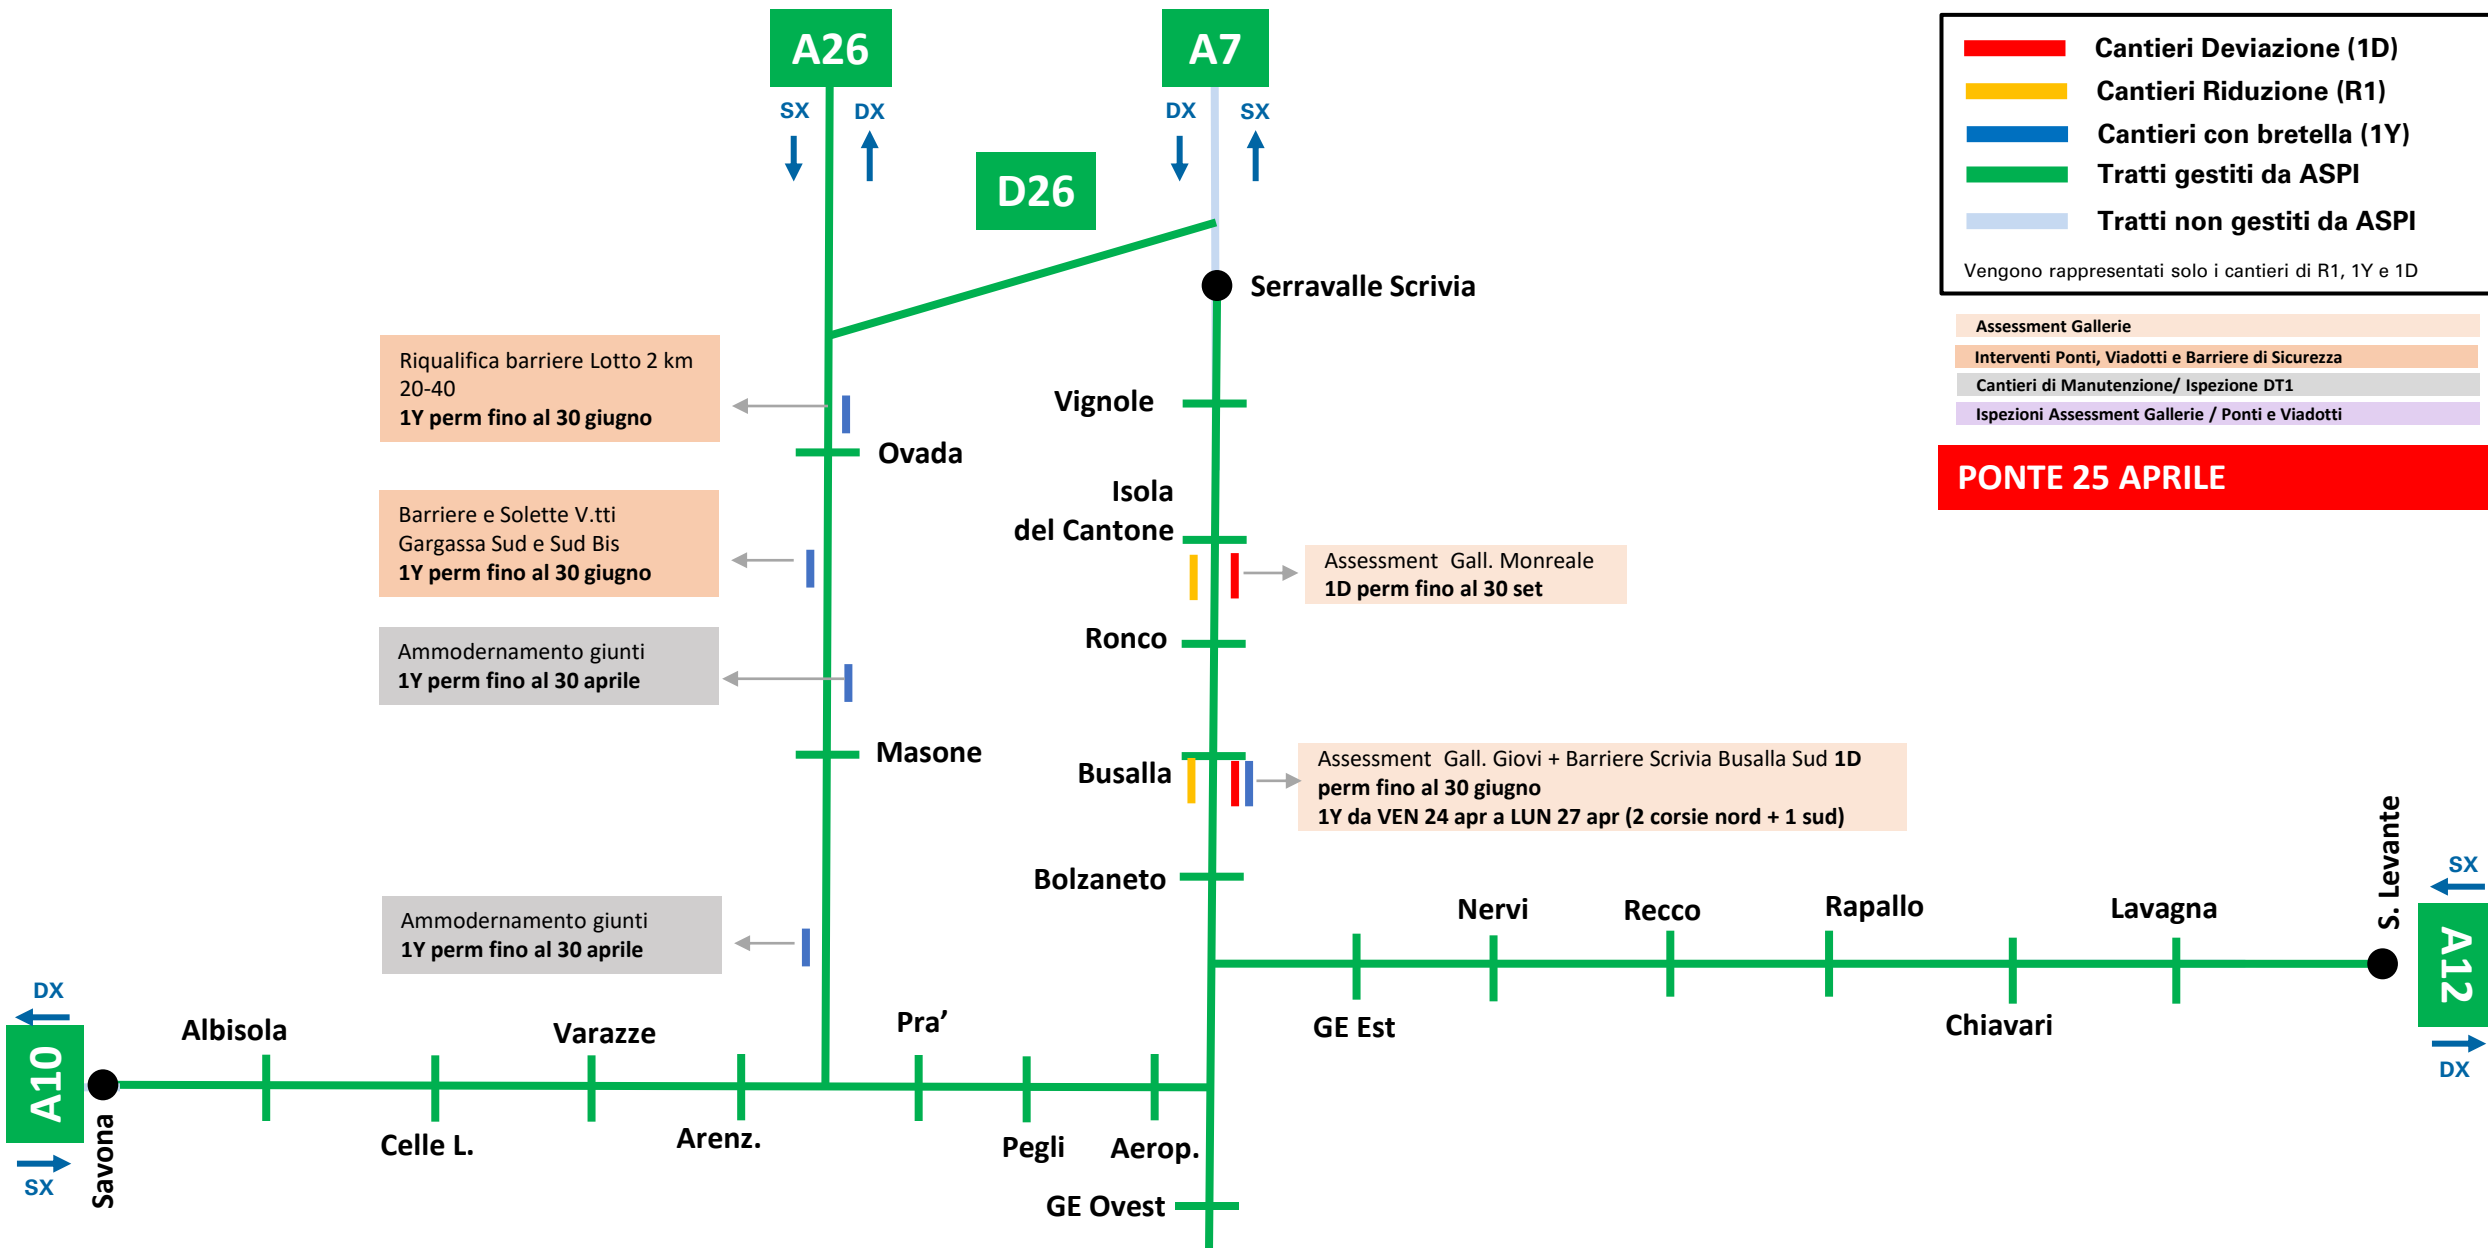


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 27 aprile – domenica 3 maggio '26

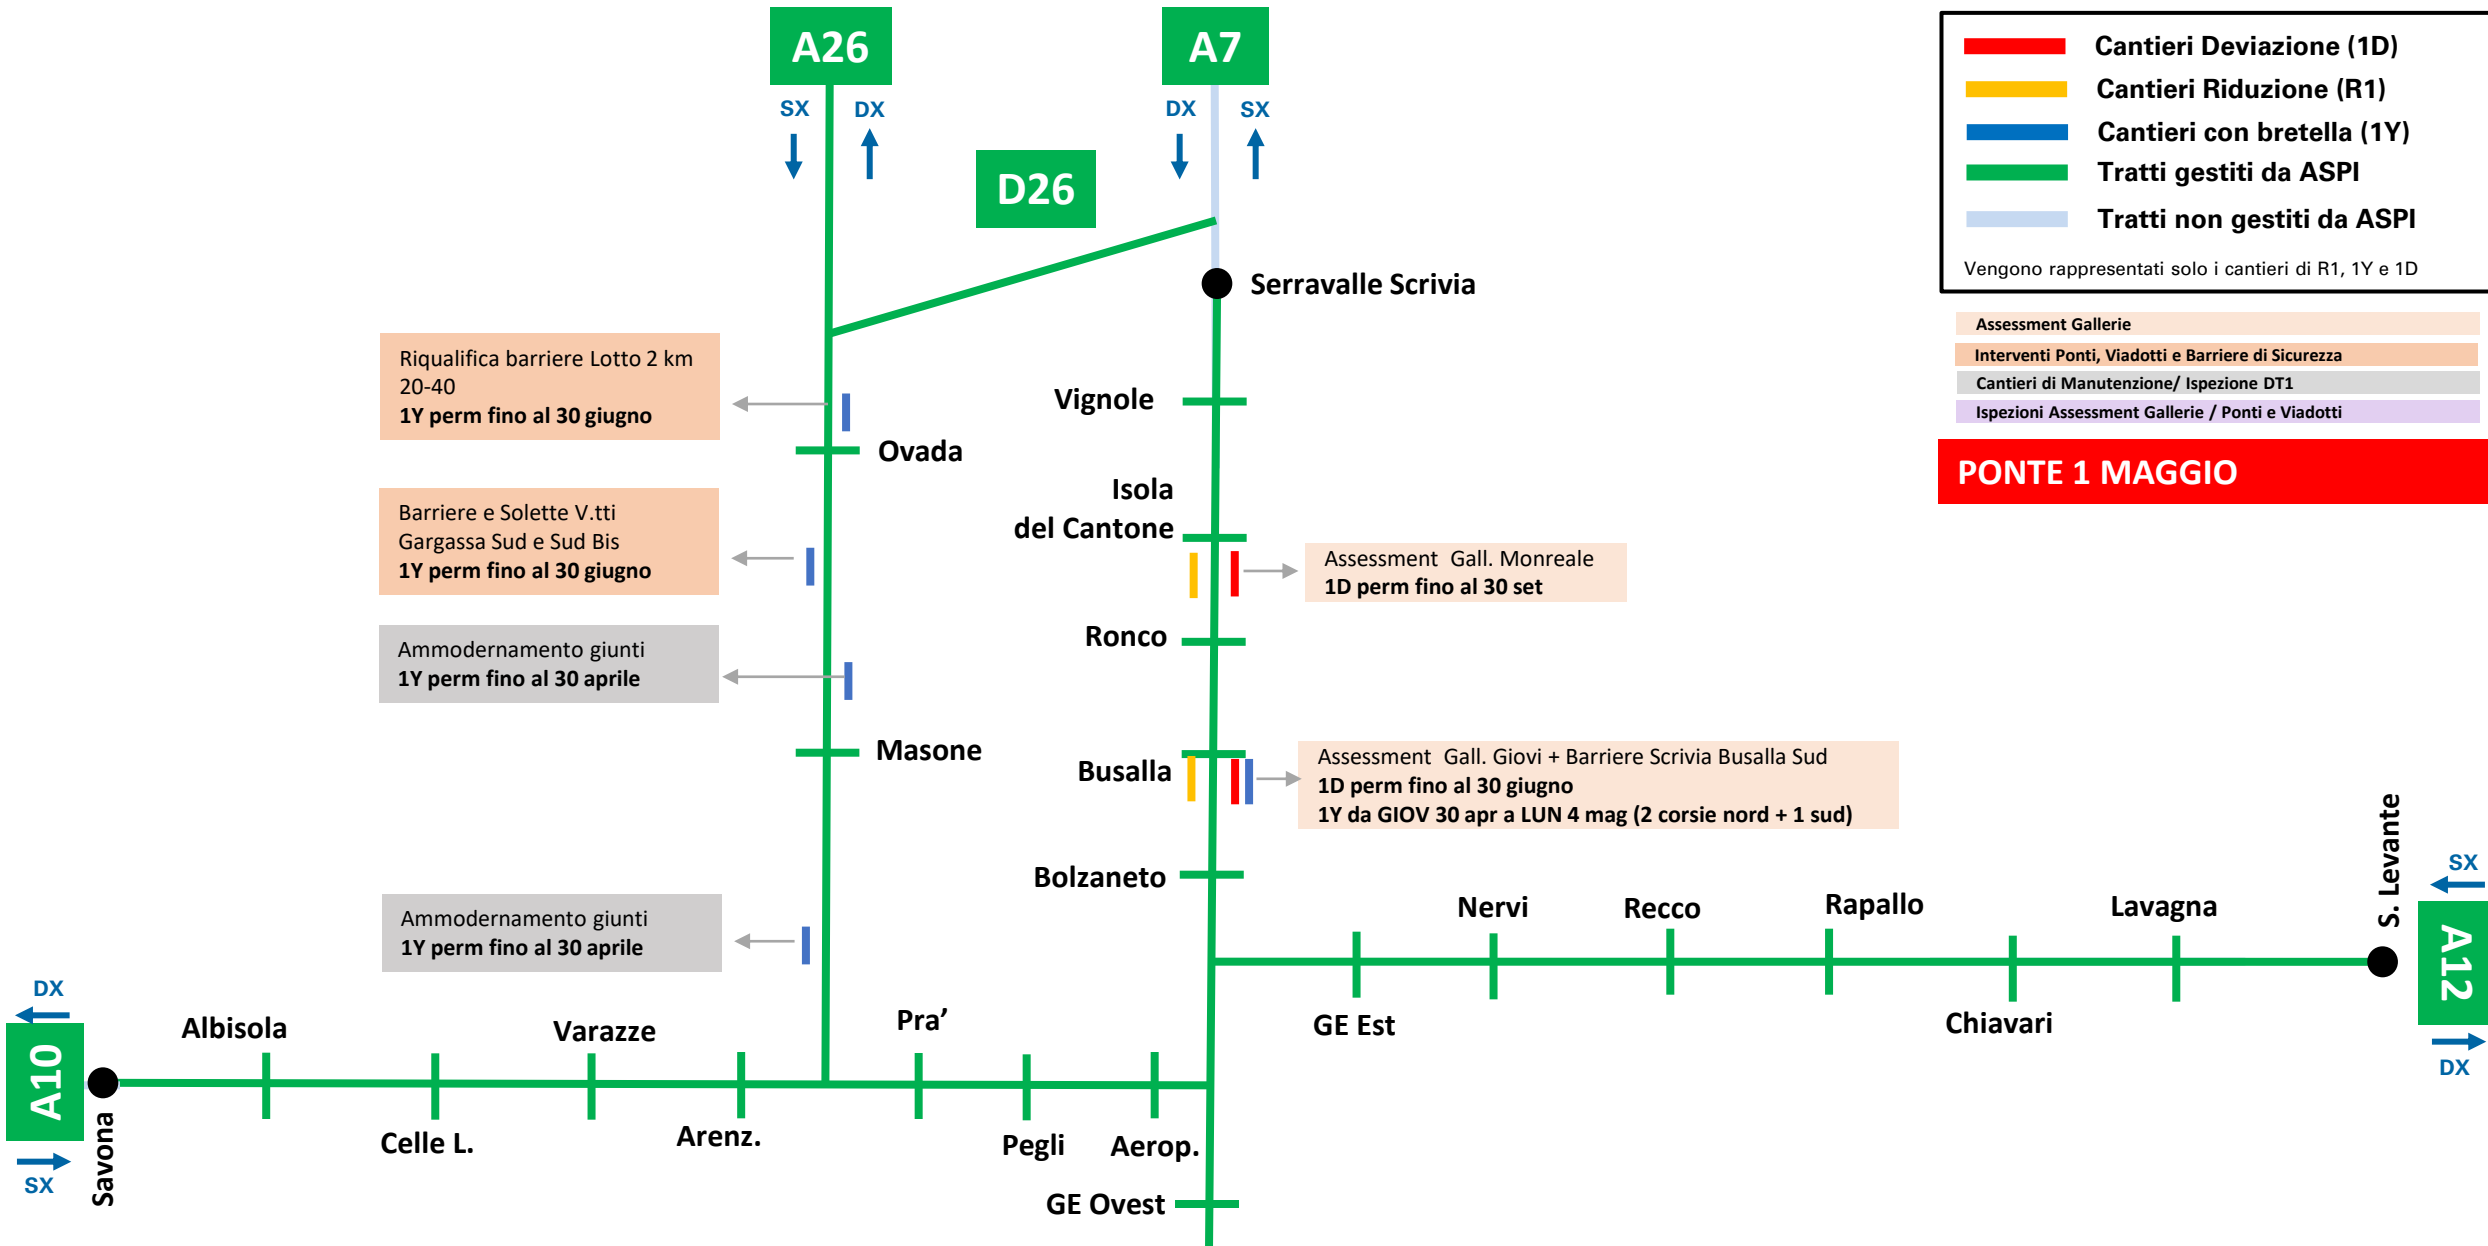


Piano cantieri: Maggio 2026


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 4 – domenica 10 maggio '26

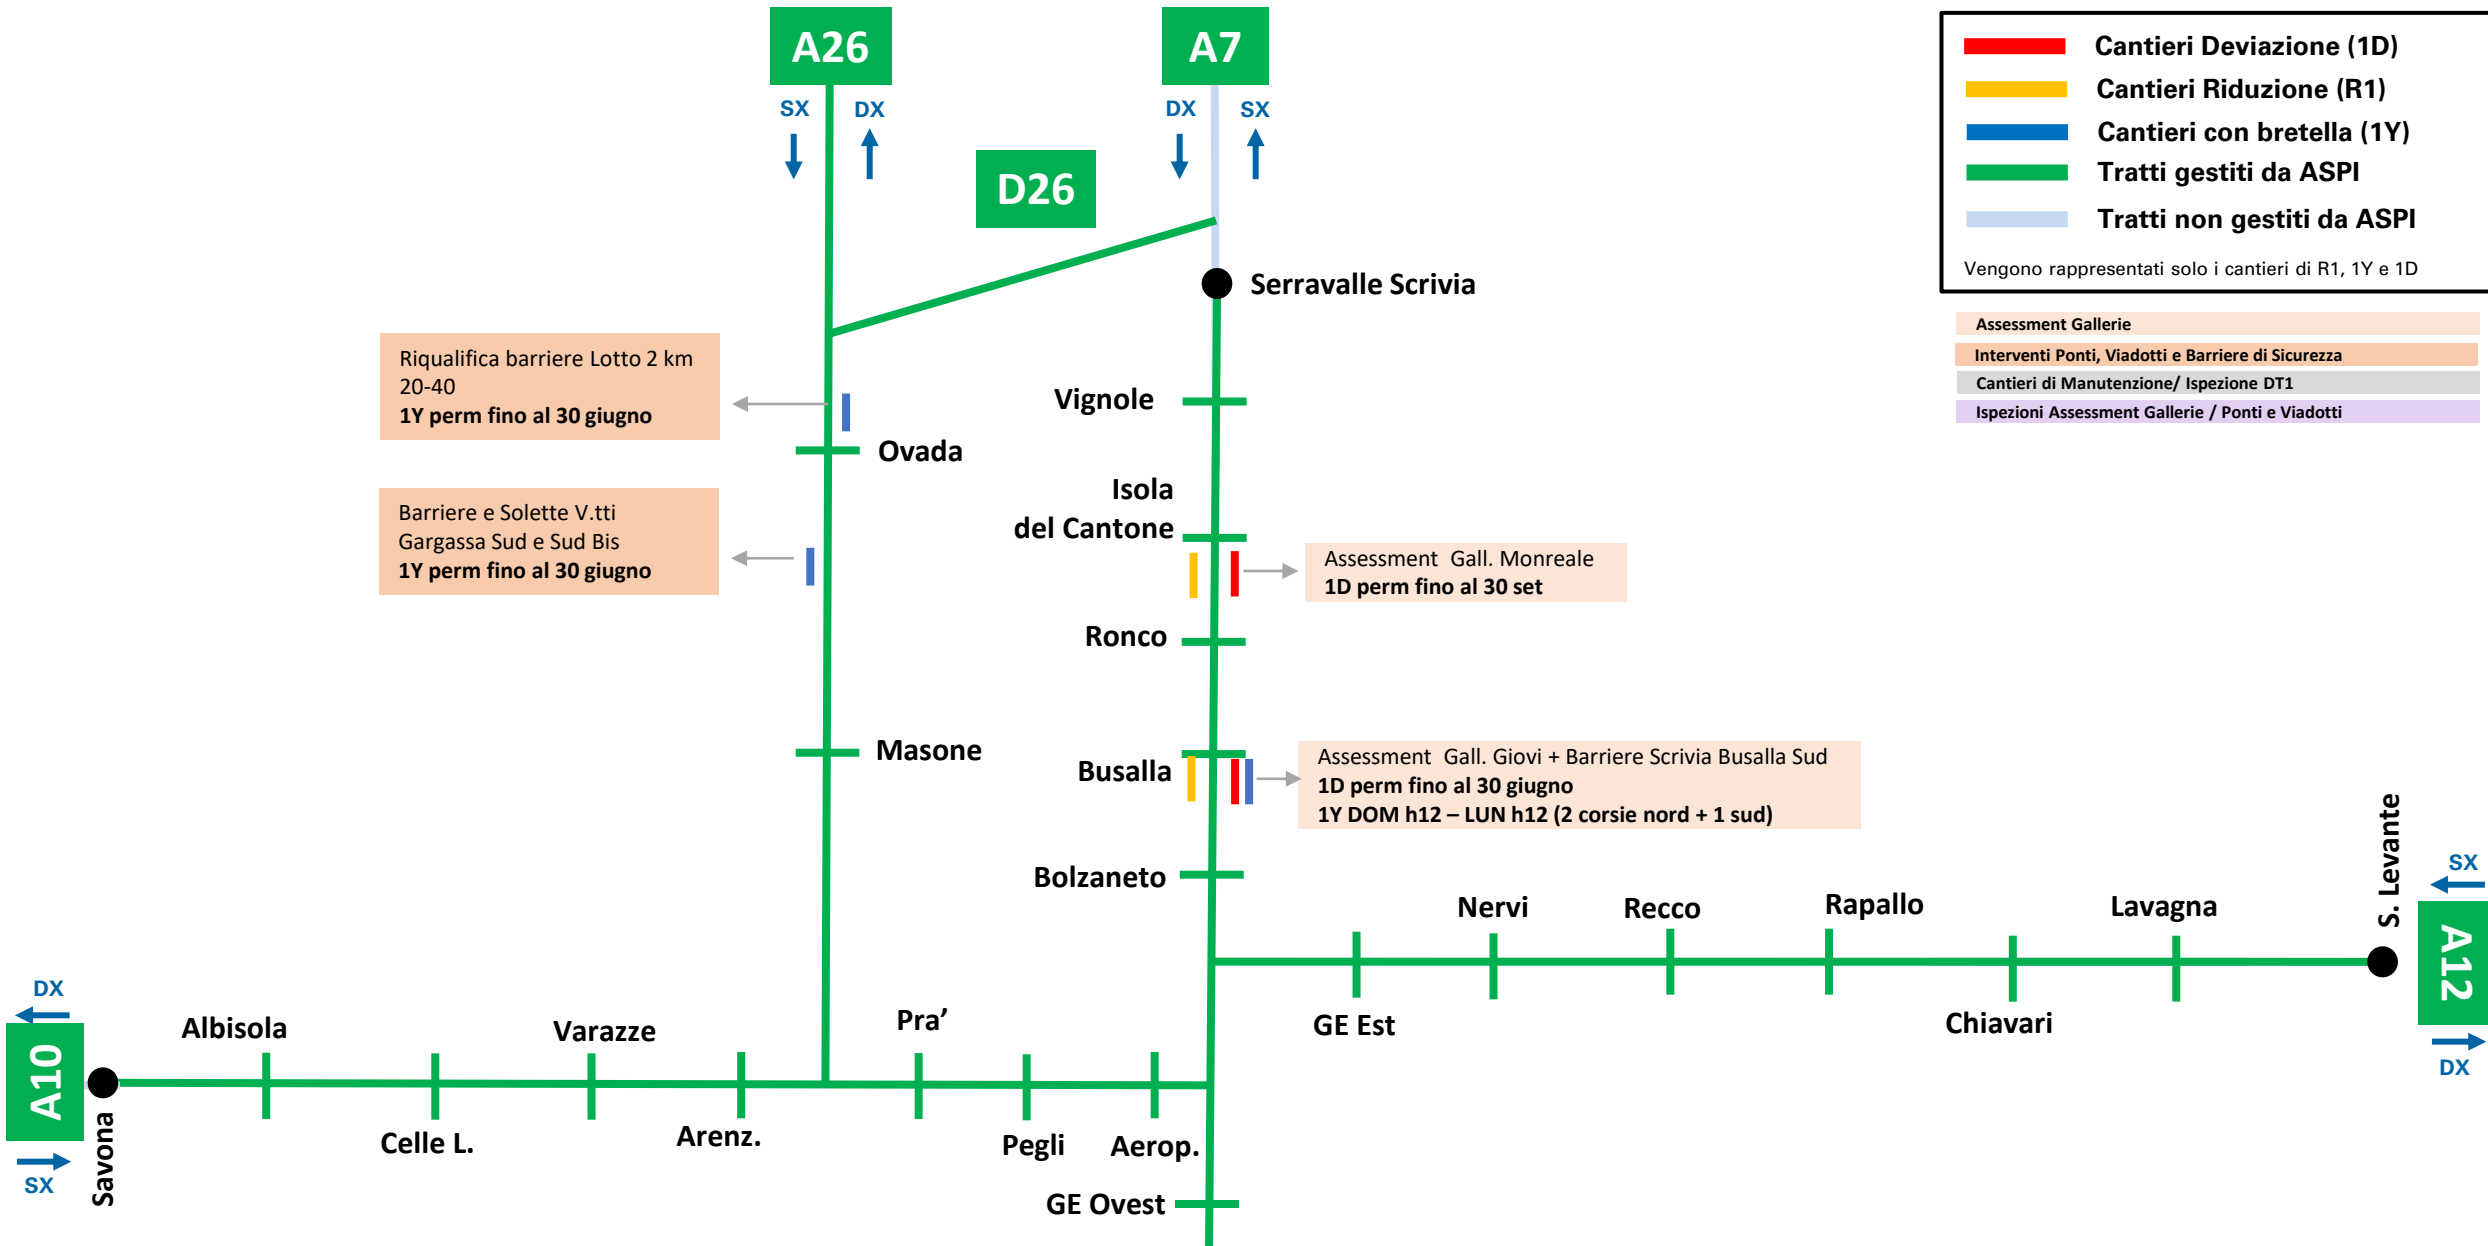


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 11 – domenica 17 maggio '26

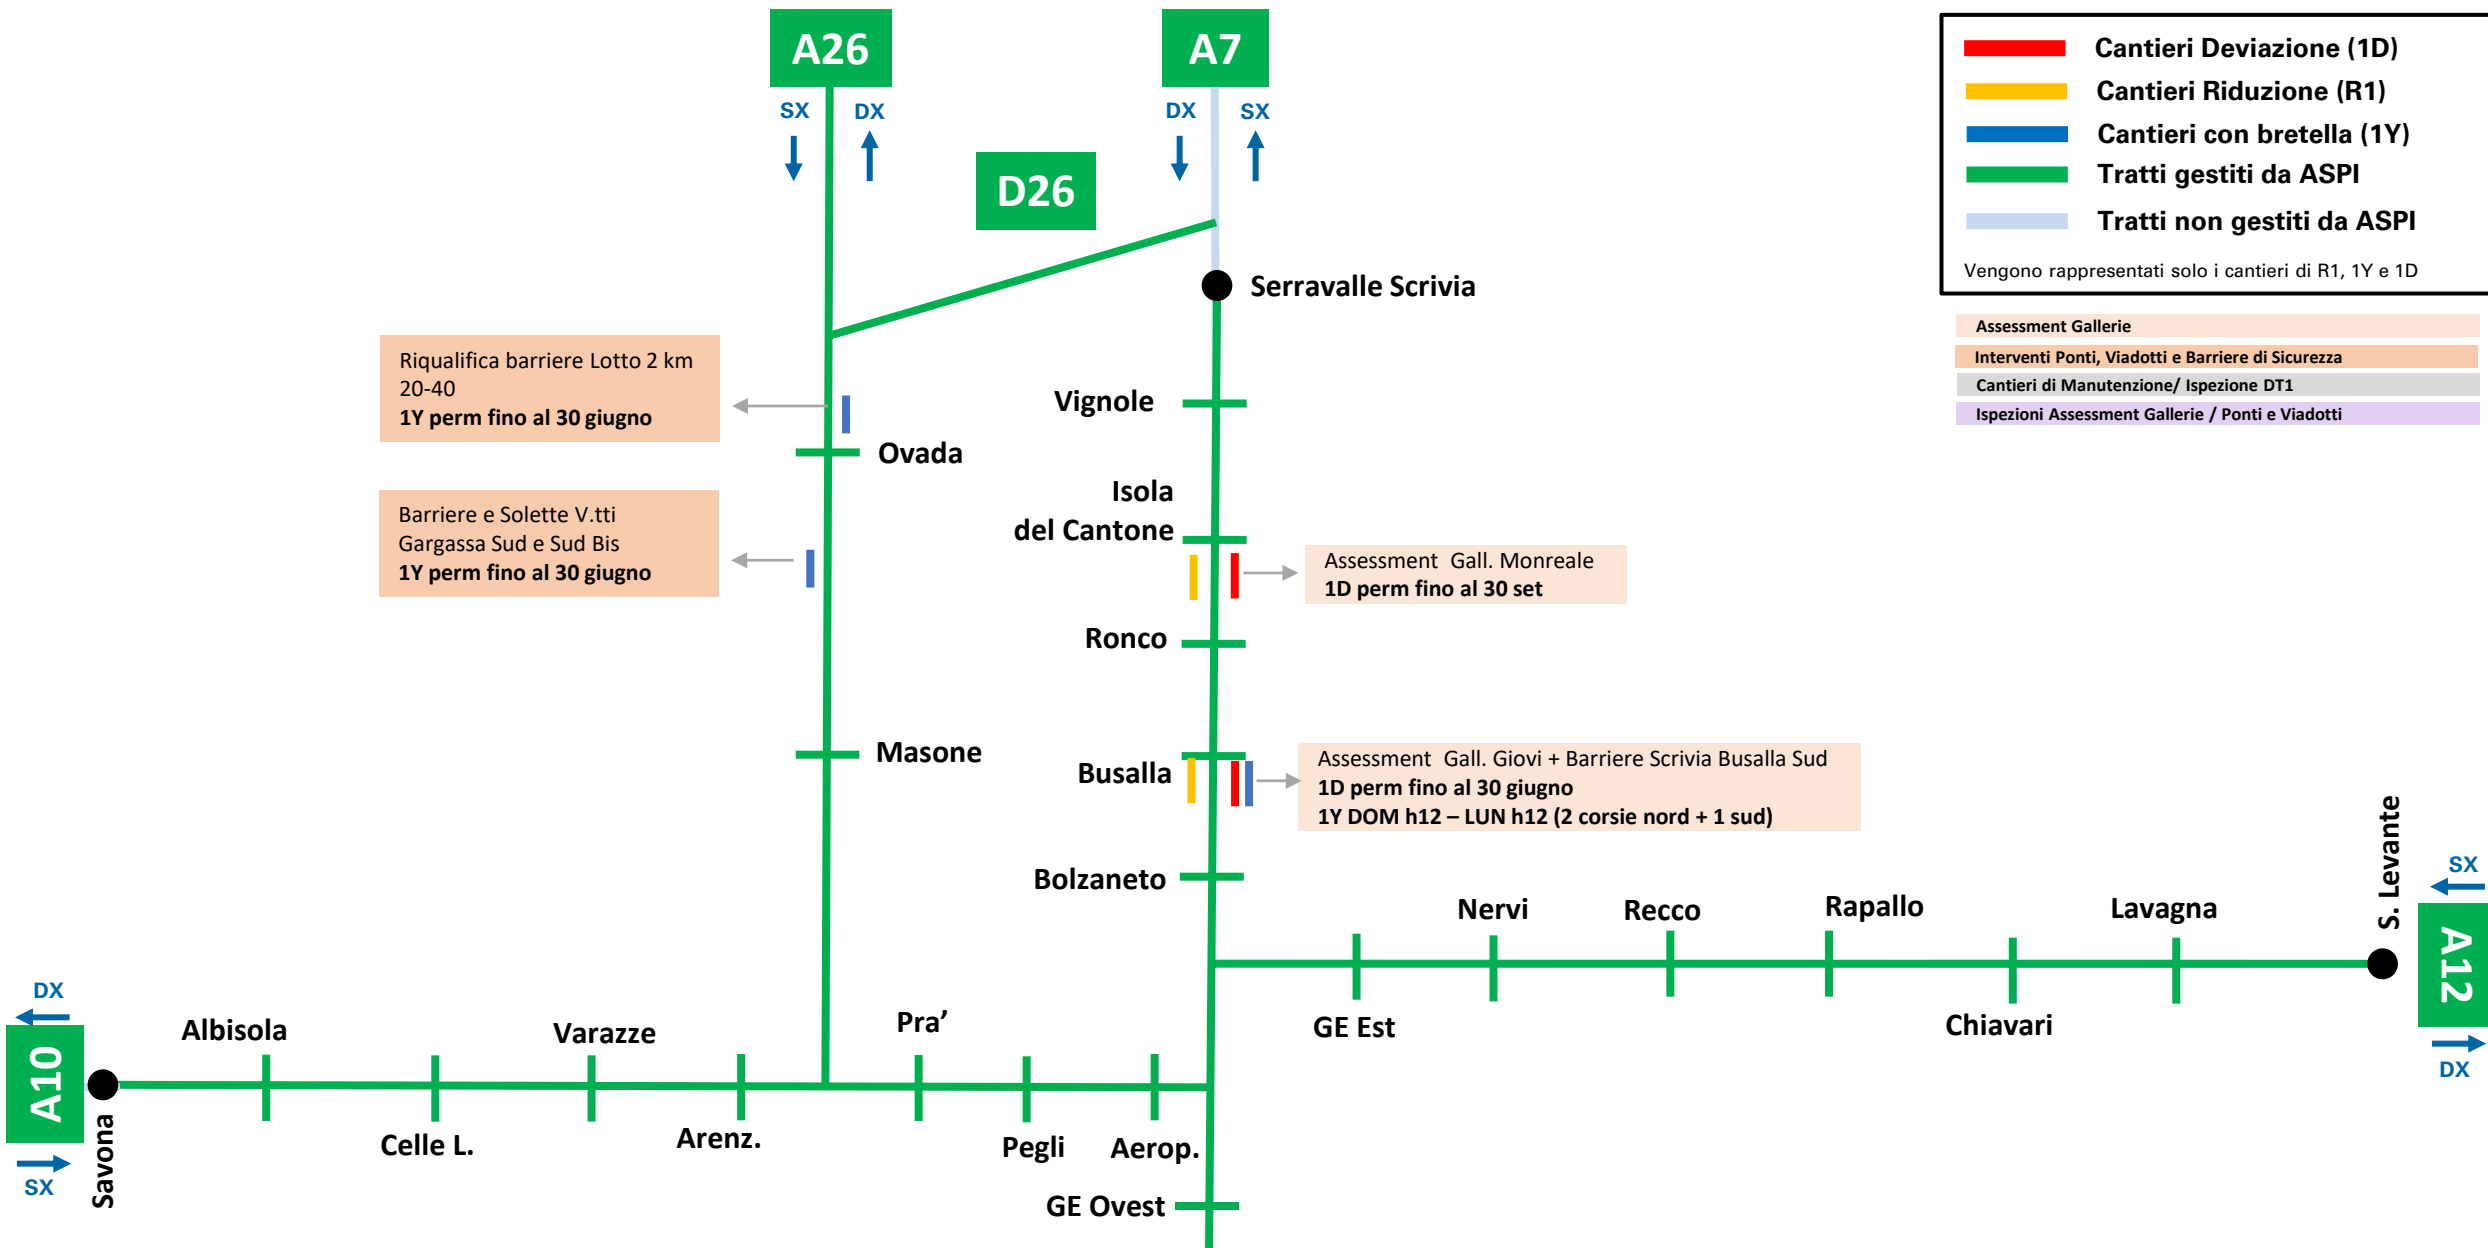

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 18 – domenica 24 maggio '26

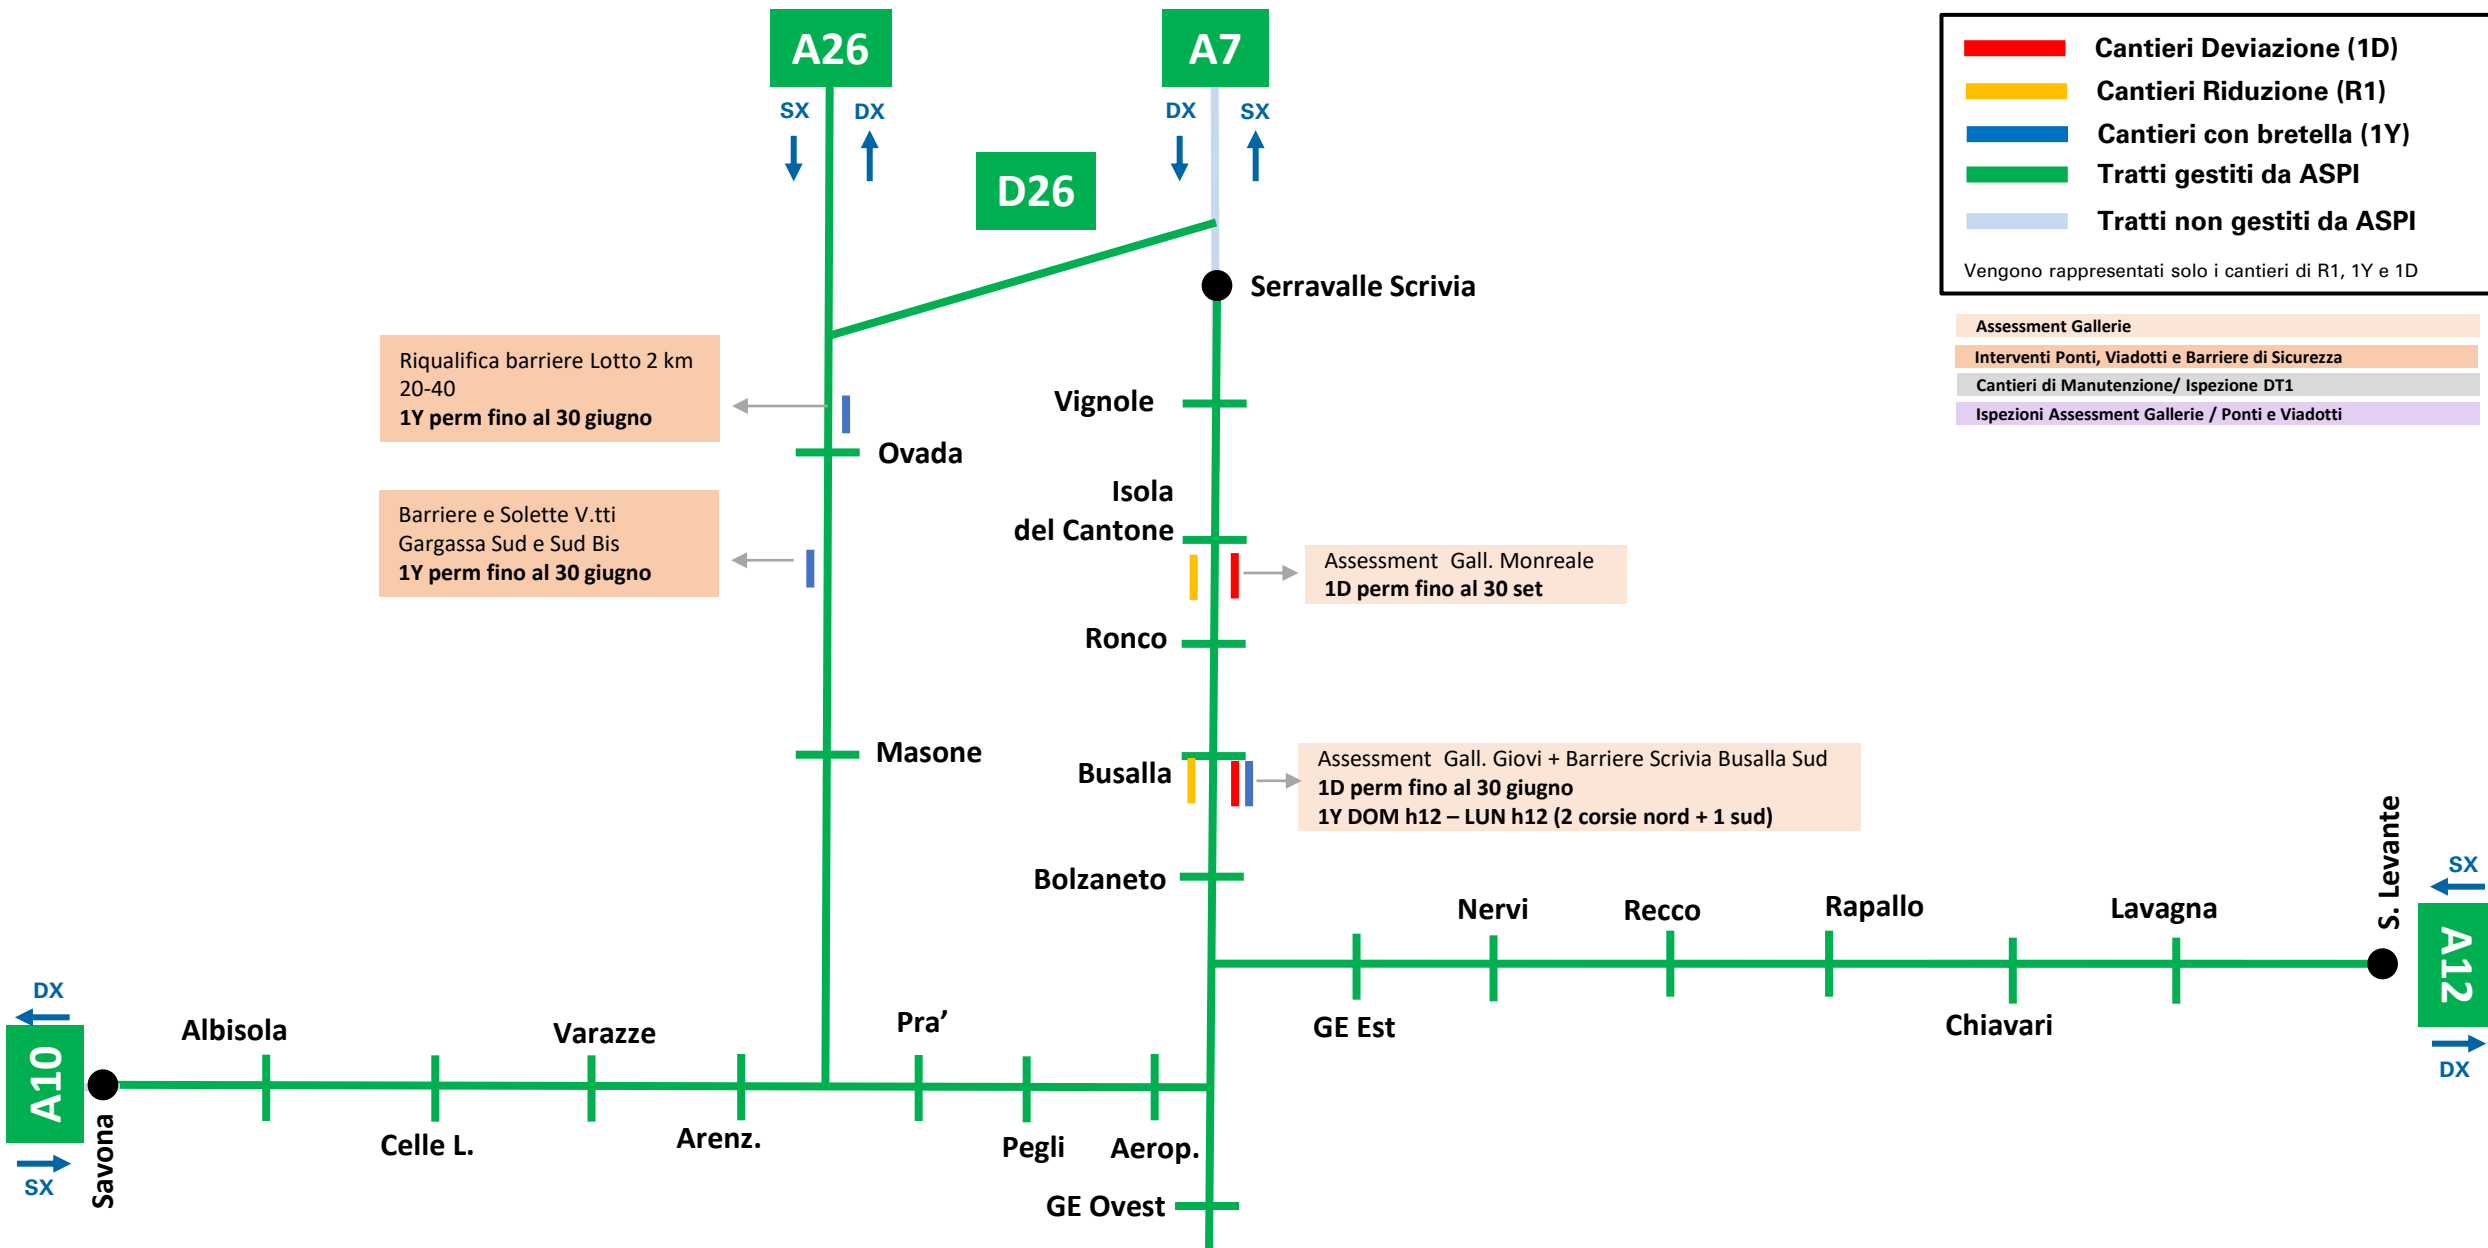


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 25 – domenica 31 maggio '26

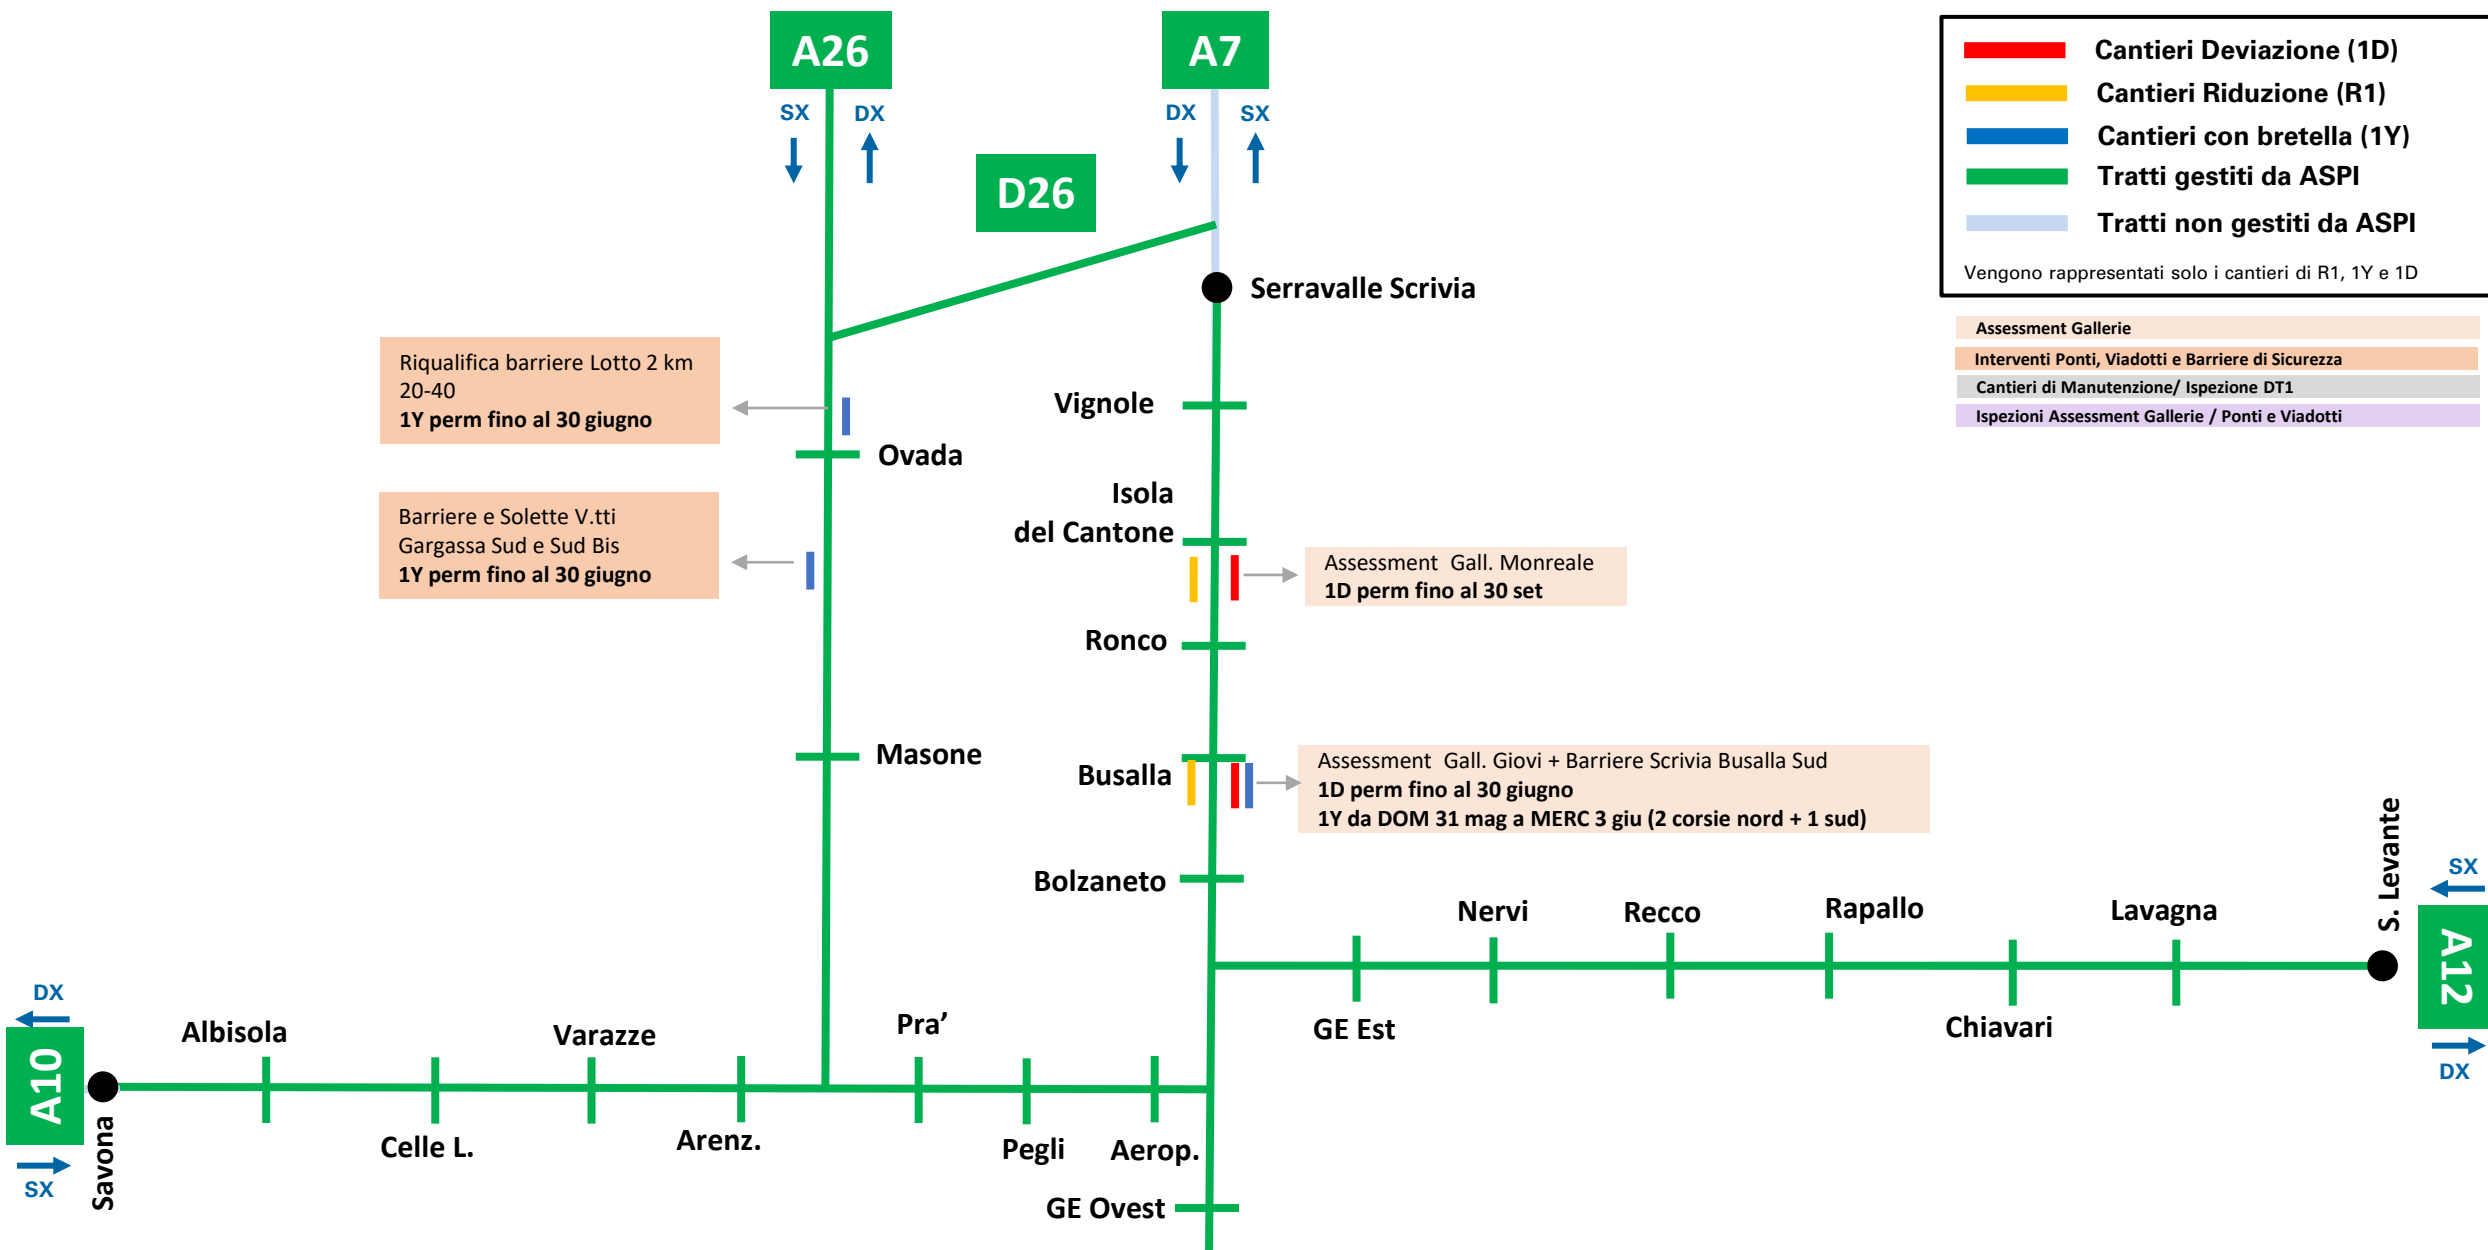


Piano cantieri: Giugno 2026


Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 1 – domenica 7 giugno '26

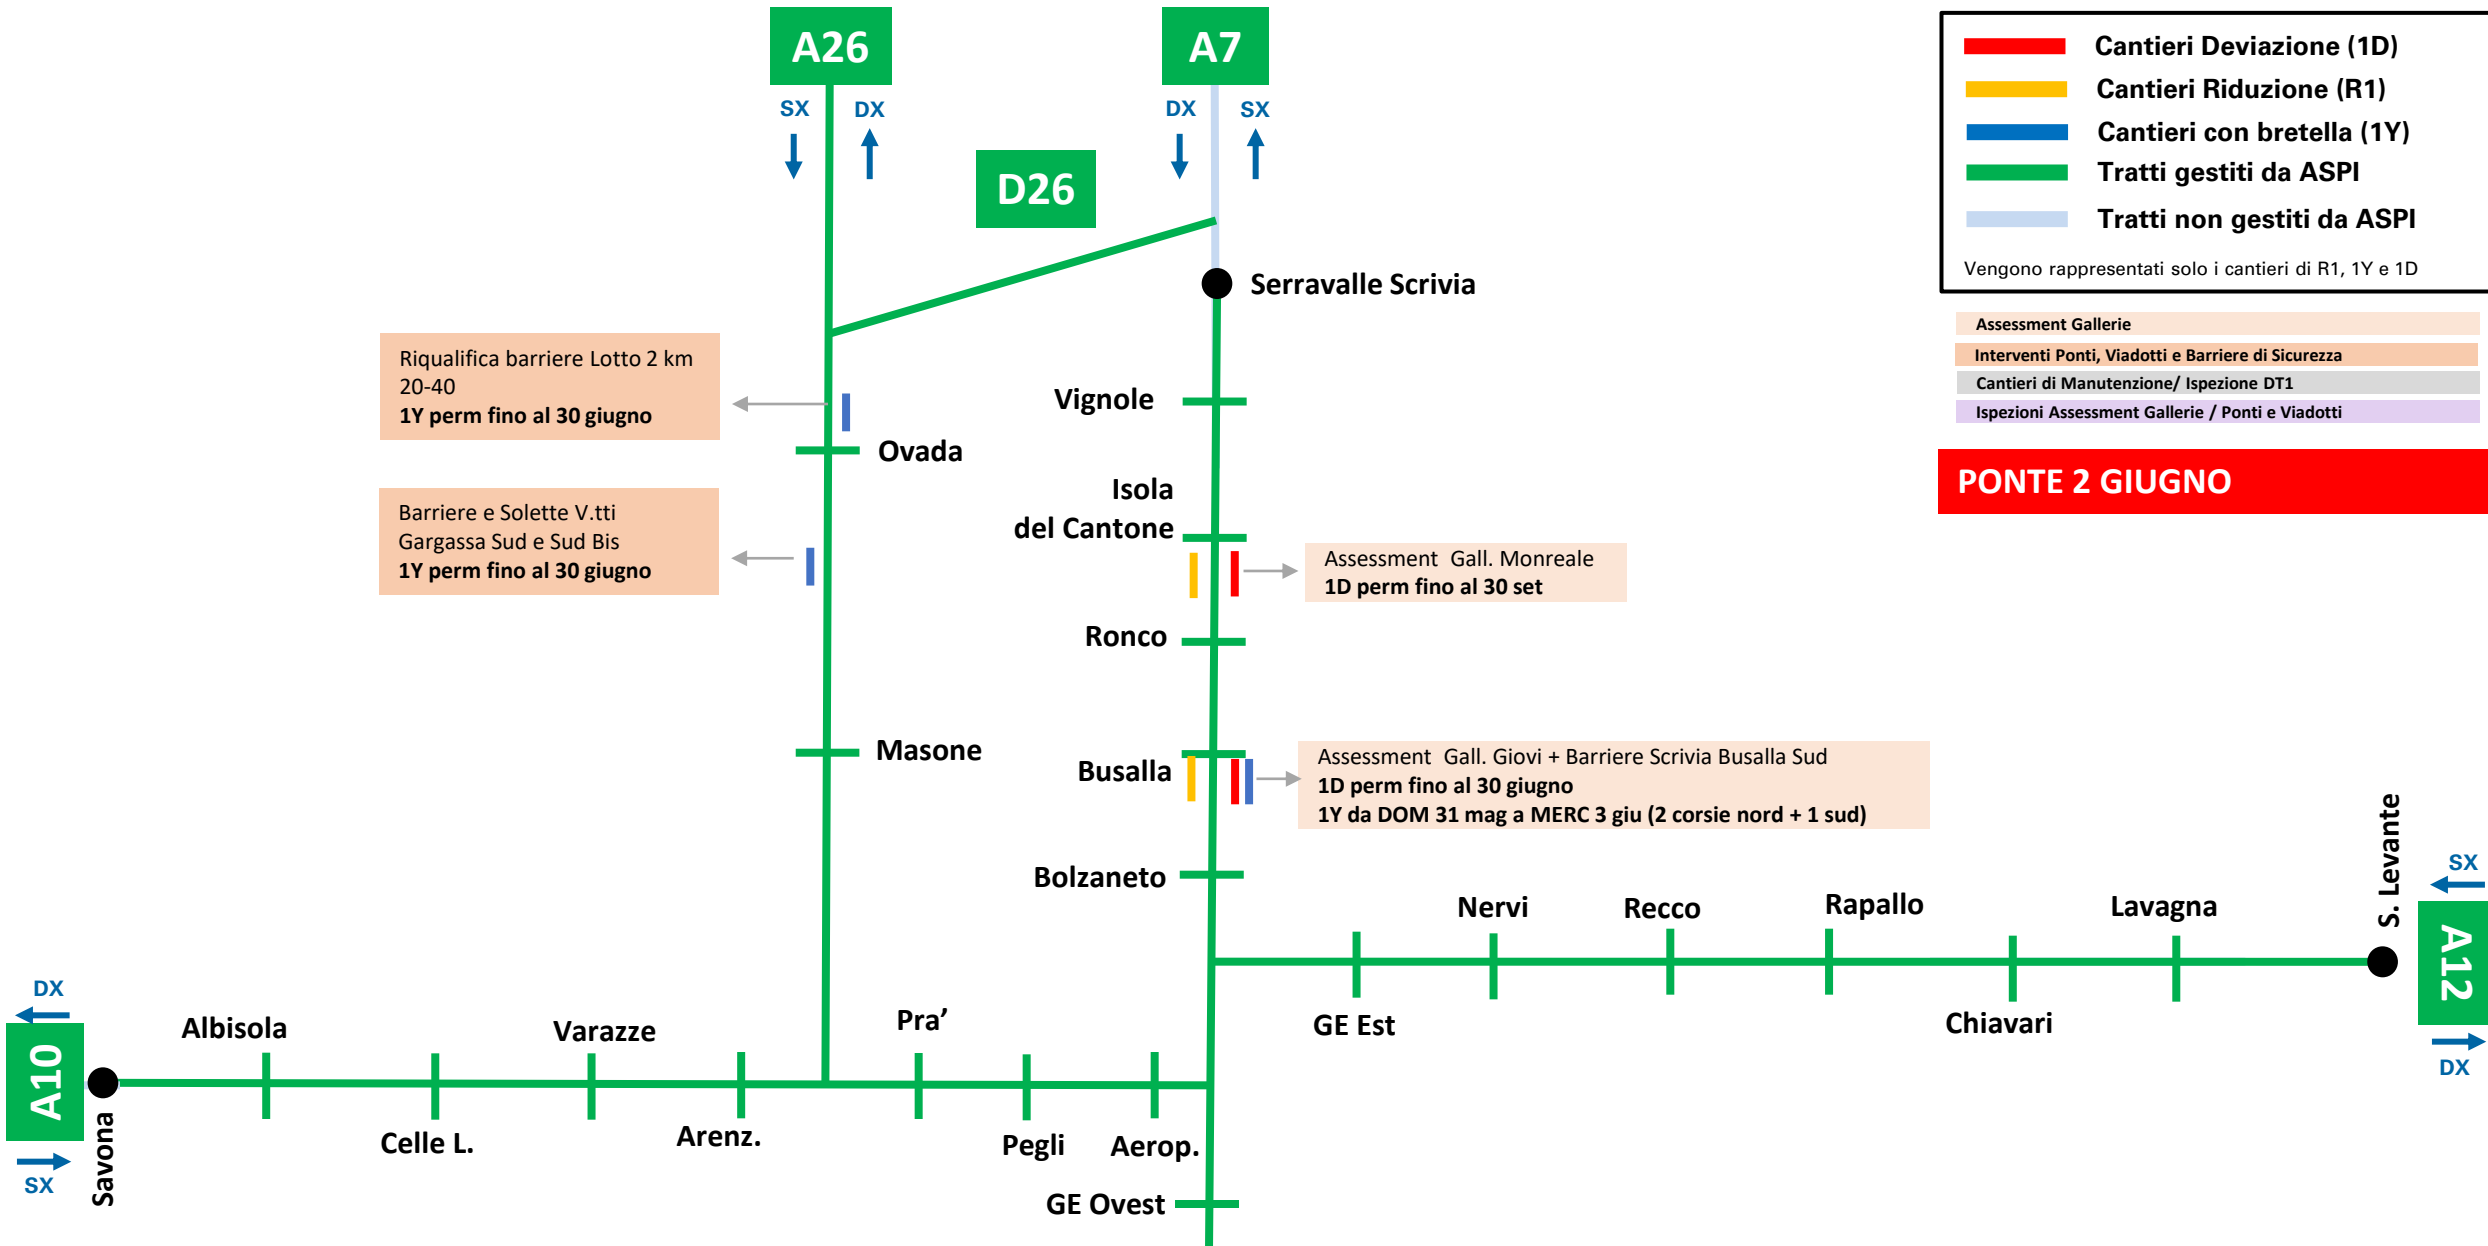

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 8 – domenica 14 giugno '26

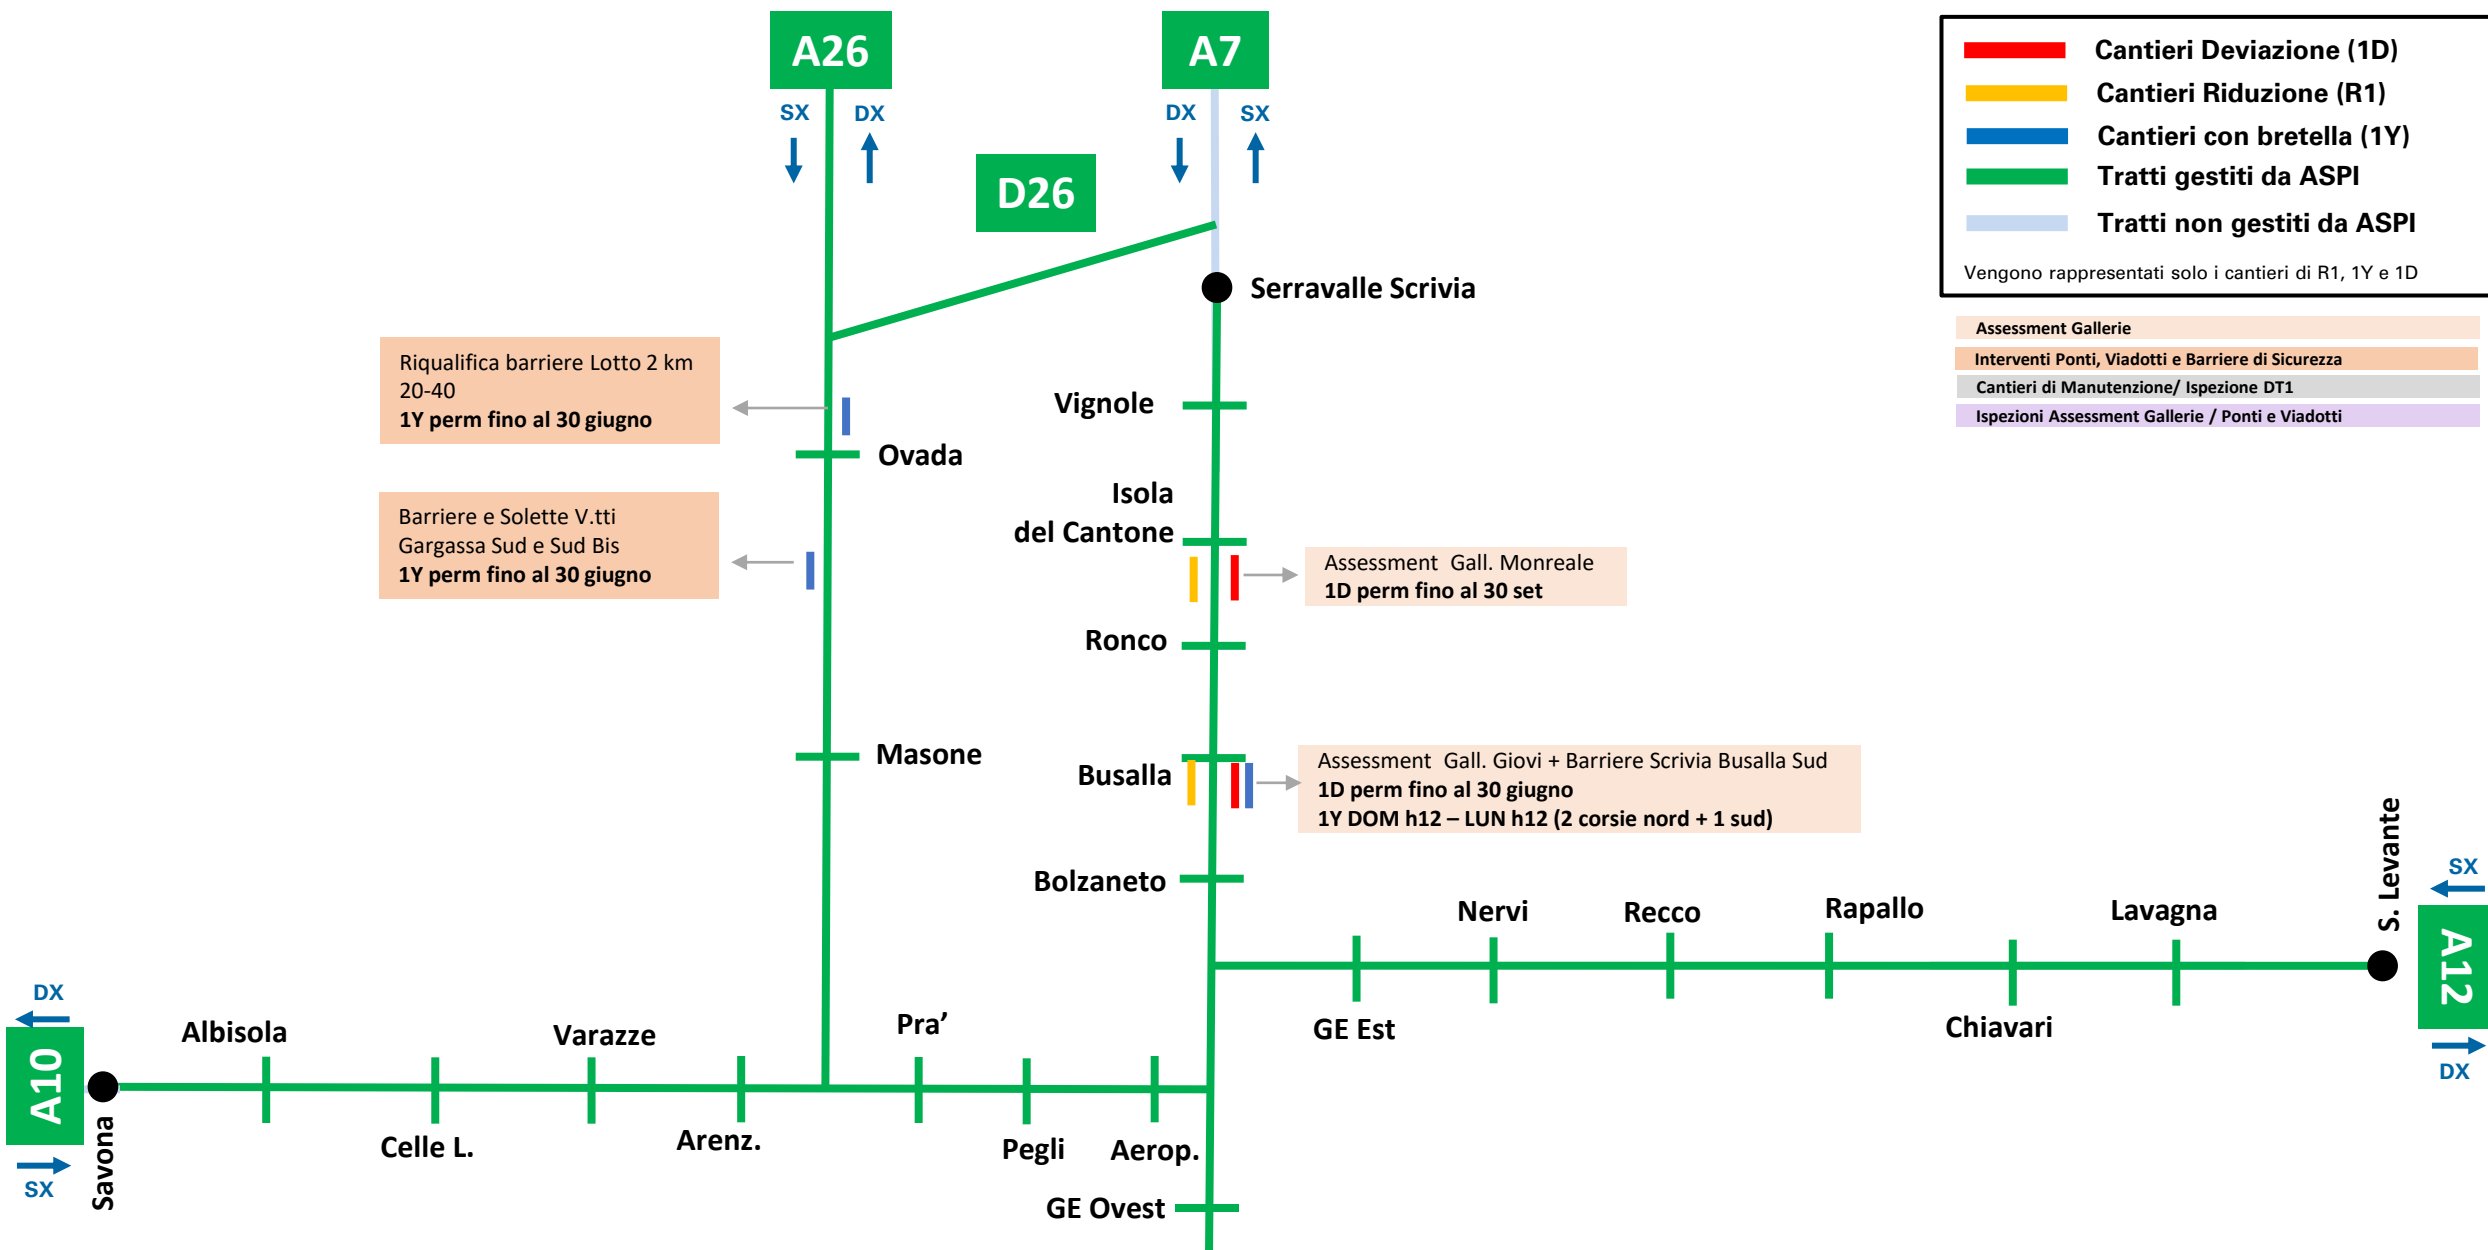

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 15 – domenica 21 giugno '26

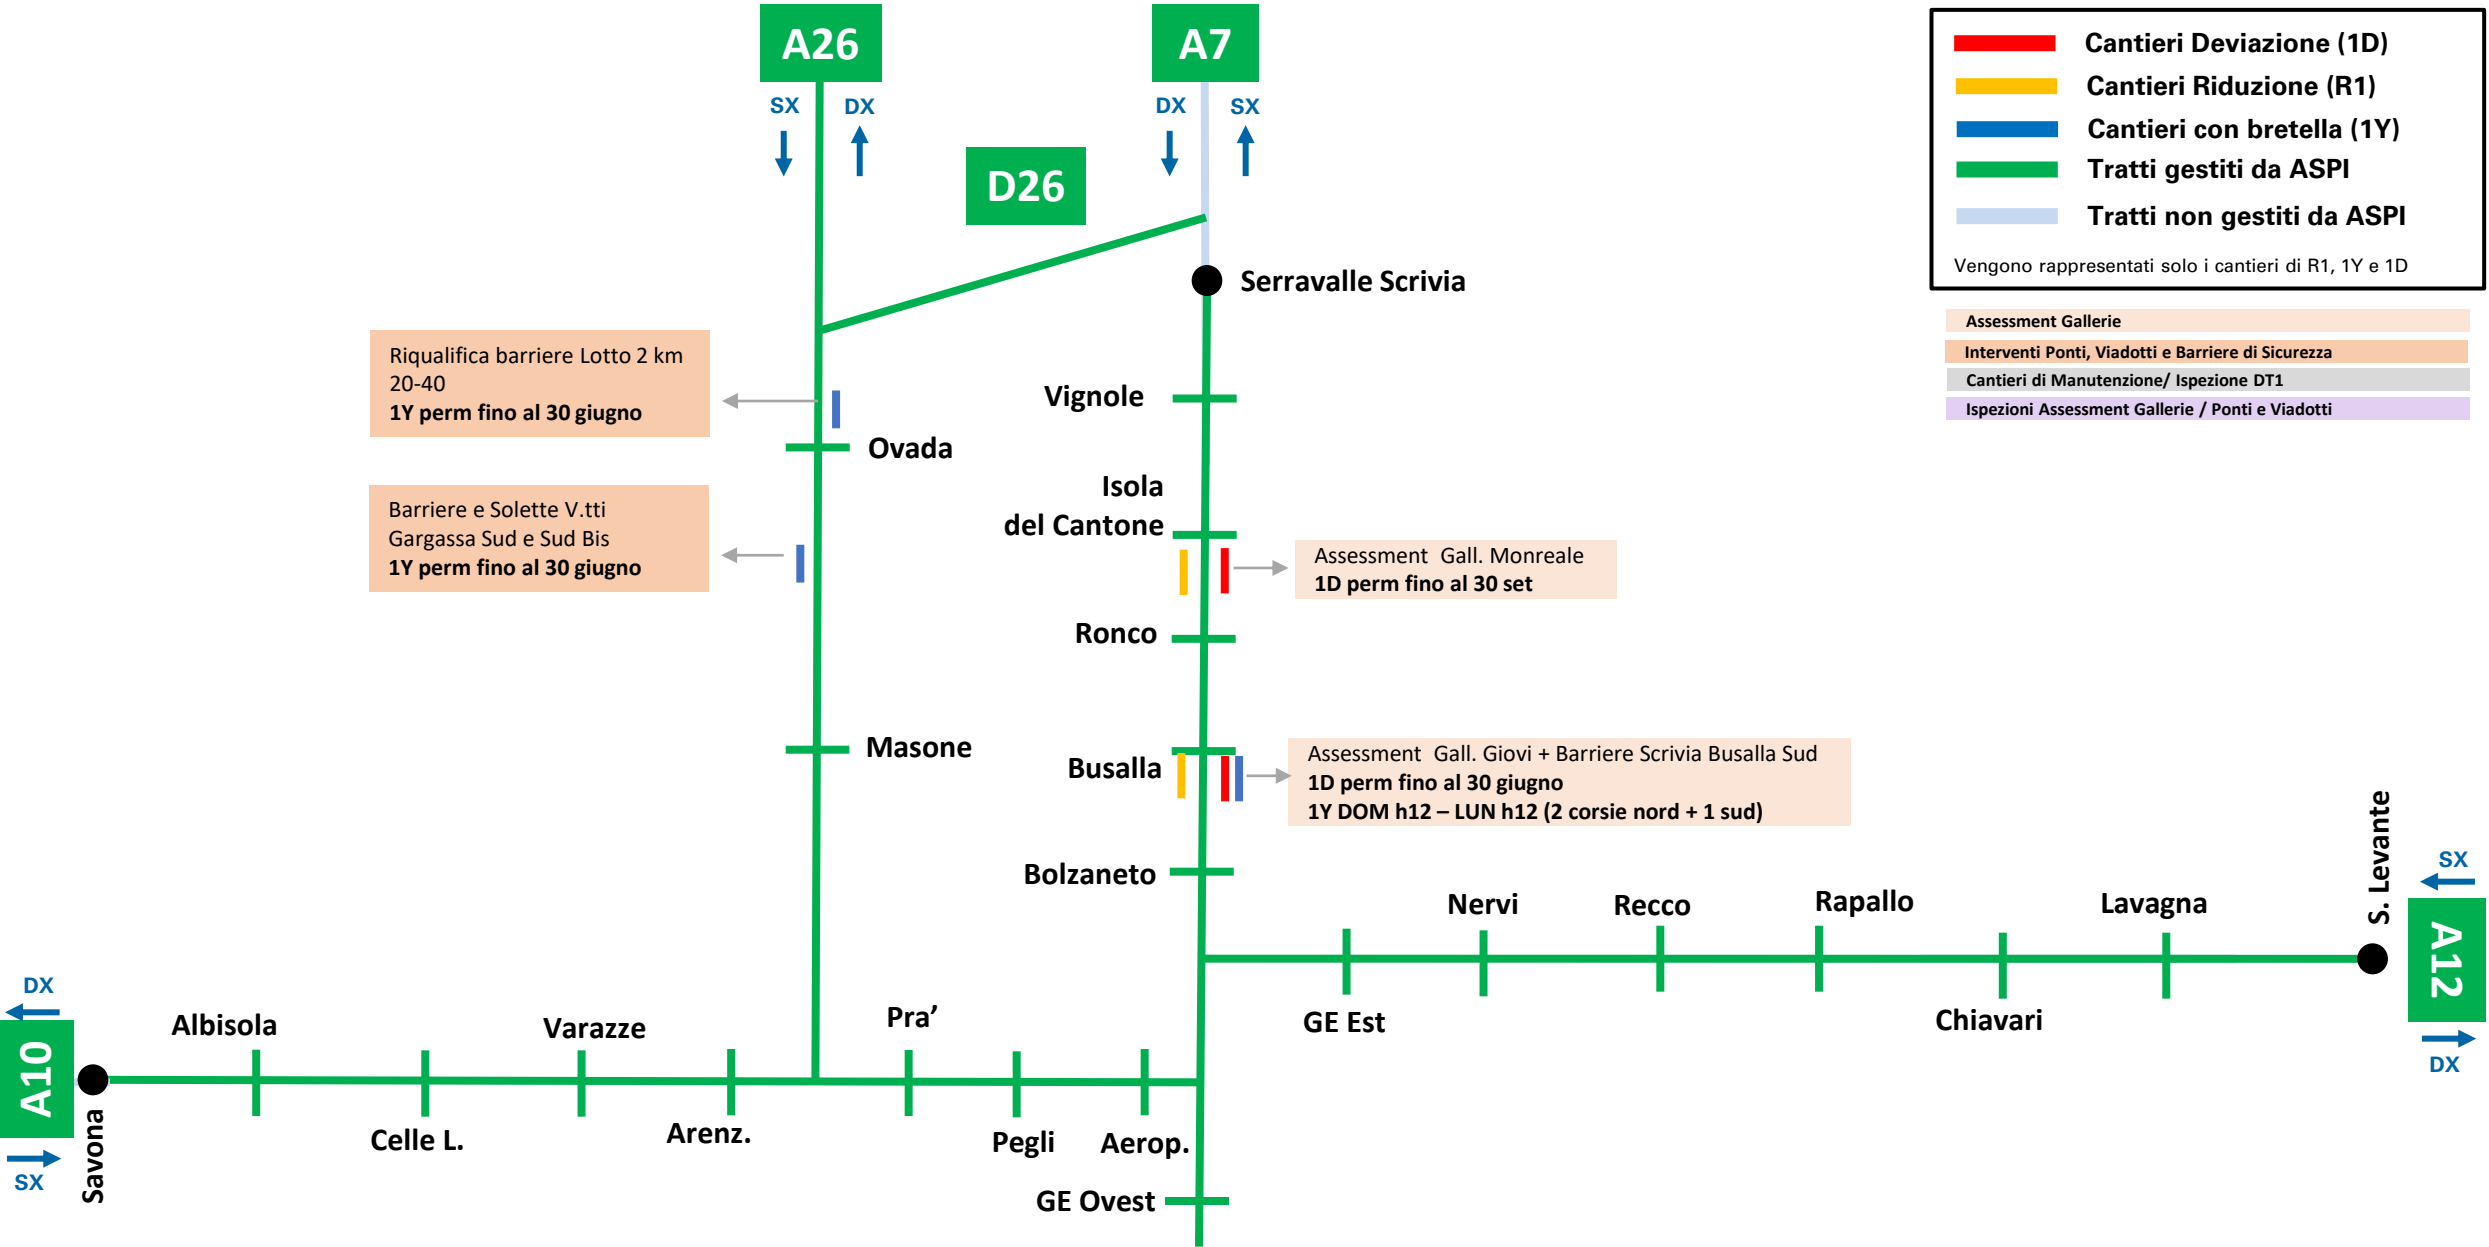

Piano dei cantieri in Liguria: lunedì 22 – domenica 28 giugno '26

