




Ragioneria
Generale
dello Stato

Presentazione delle **linee guida** sulla
conclusione degli **interventi PNRR**
e del **quadro sinottico** sul
raggiungimento dei **target UE**

27 aprile 2026

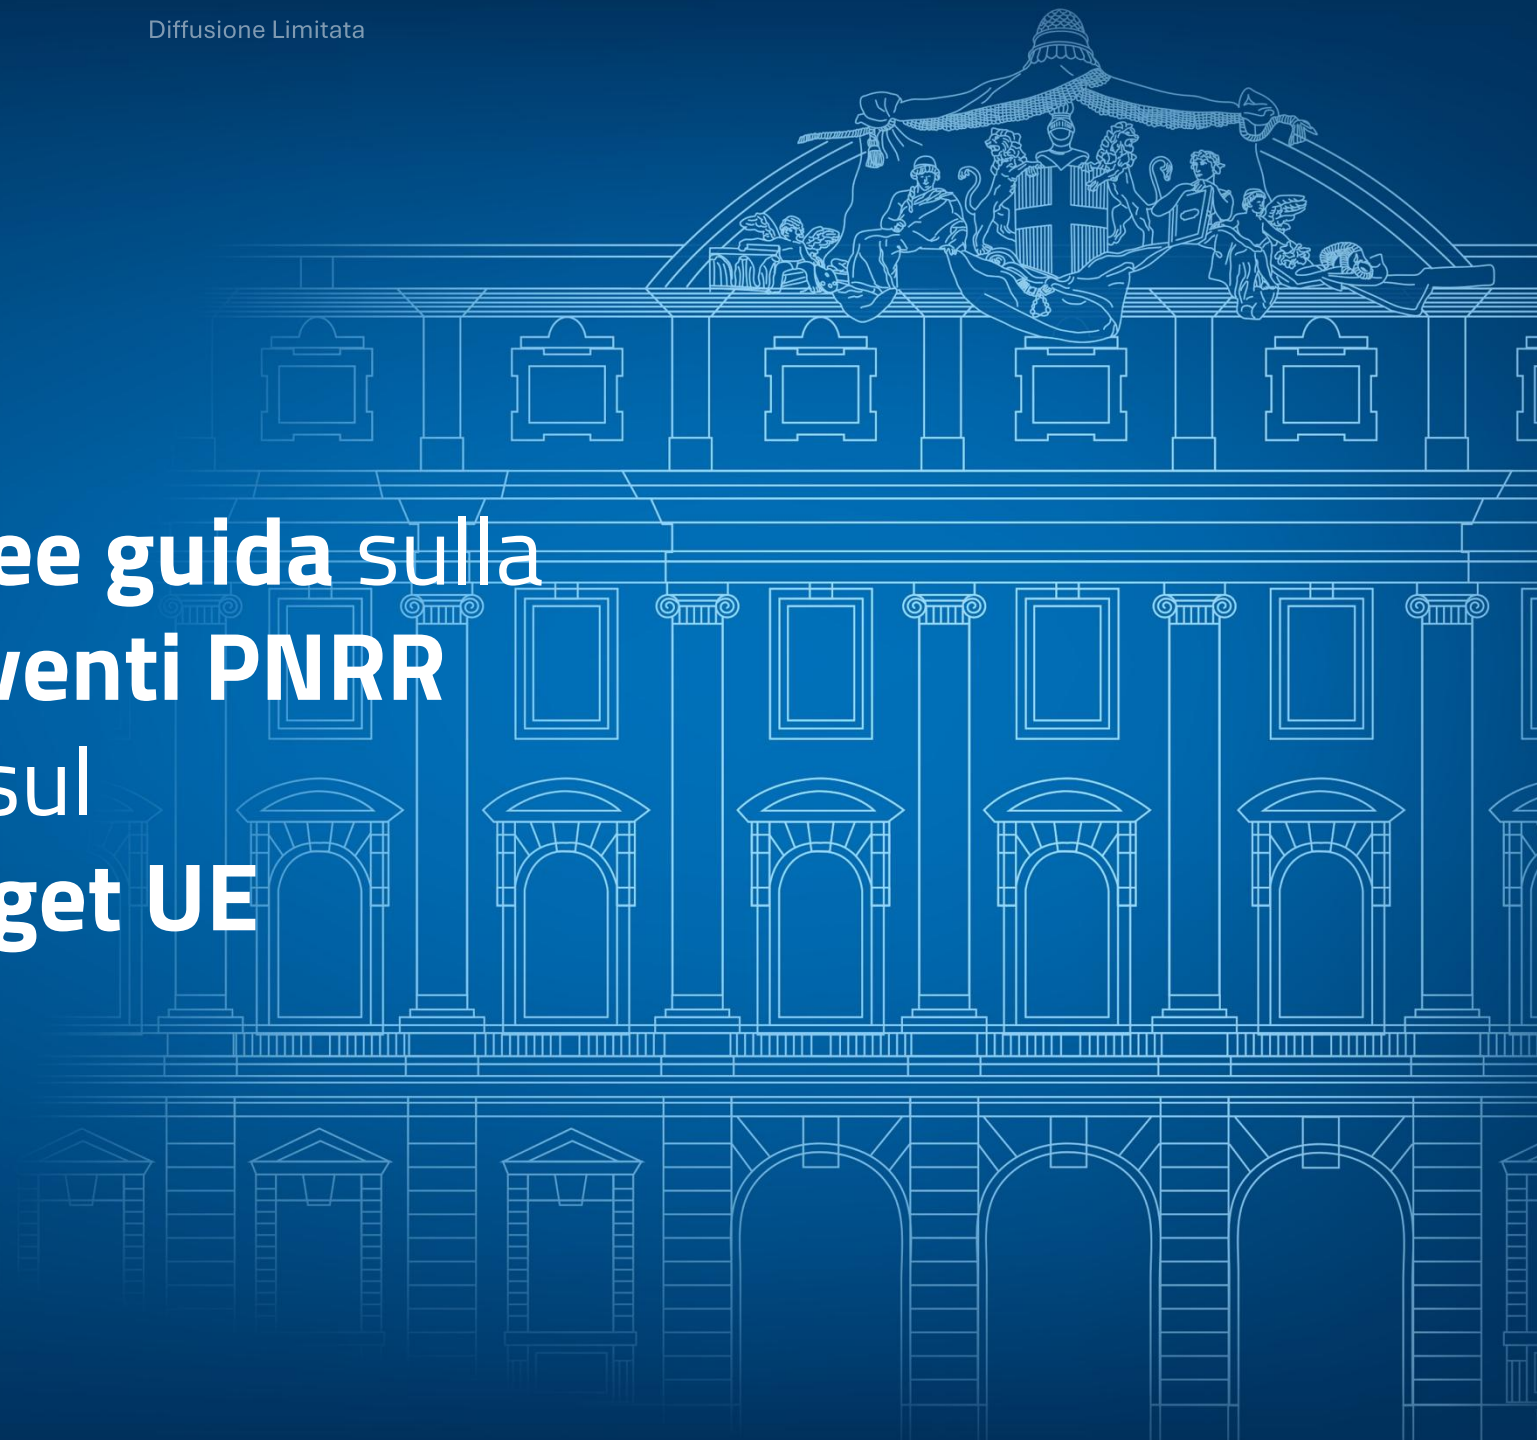

Agenda


01. Il PNRR: un Piano di *performance*

02. Linee guida sulla conclusione degli interventi PNRR

03. Quadro sinottico sul raggiungimento dei target UE

04. Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50

05. Conclusioni

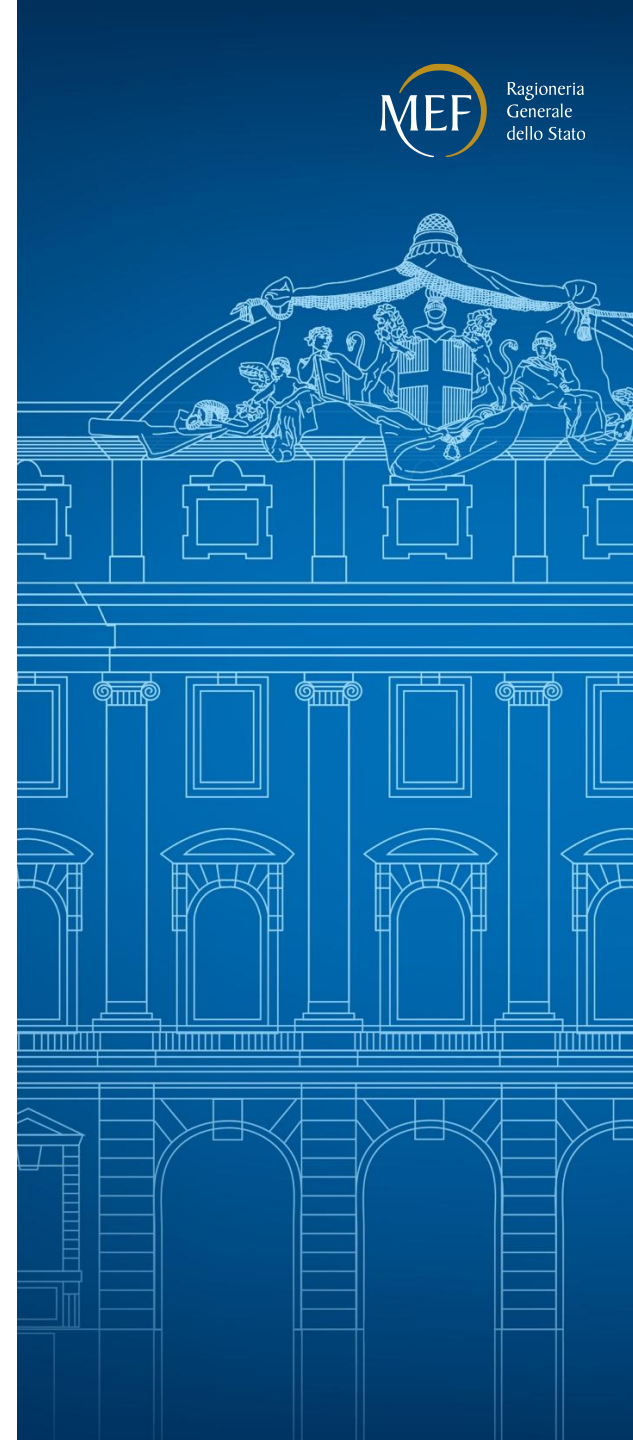



Ragioneria
Generale
dello Stato

01.

Il PNRR: un Piano di *performance*



Il PNRR: un piano di *performance*

Il PNRR è un **piano *performance-based***:



Il raggiungimento degli obiettivi assume un rilievo centrale ai fini dell'erogazione delle risorse.



In questo quadro, i **Soggetti Attuatori, sono chiamati a garantire il conseguimento dei risultati di progetto** e il corretto aggiornamento dei dati di avanzamento dei progetti sul **sistema ReGIS**.





COMUNE:
Morterone (LC)



RESIDENTI:
33



PROGETTO PNRR:
affidente alla PCM –
Dipartimento per la
Transizione Digitale



**FINANZIAMENTO
PNRR:**
47.427,00 €


...anche il piccolo progetto del piccolo comune contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PNRR!



Ragioneria
Generale
dello Stato

02.

Linee guida sulla conclusione degli interventi PNRR

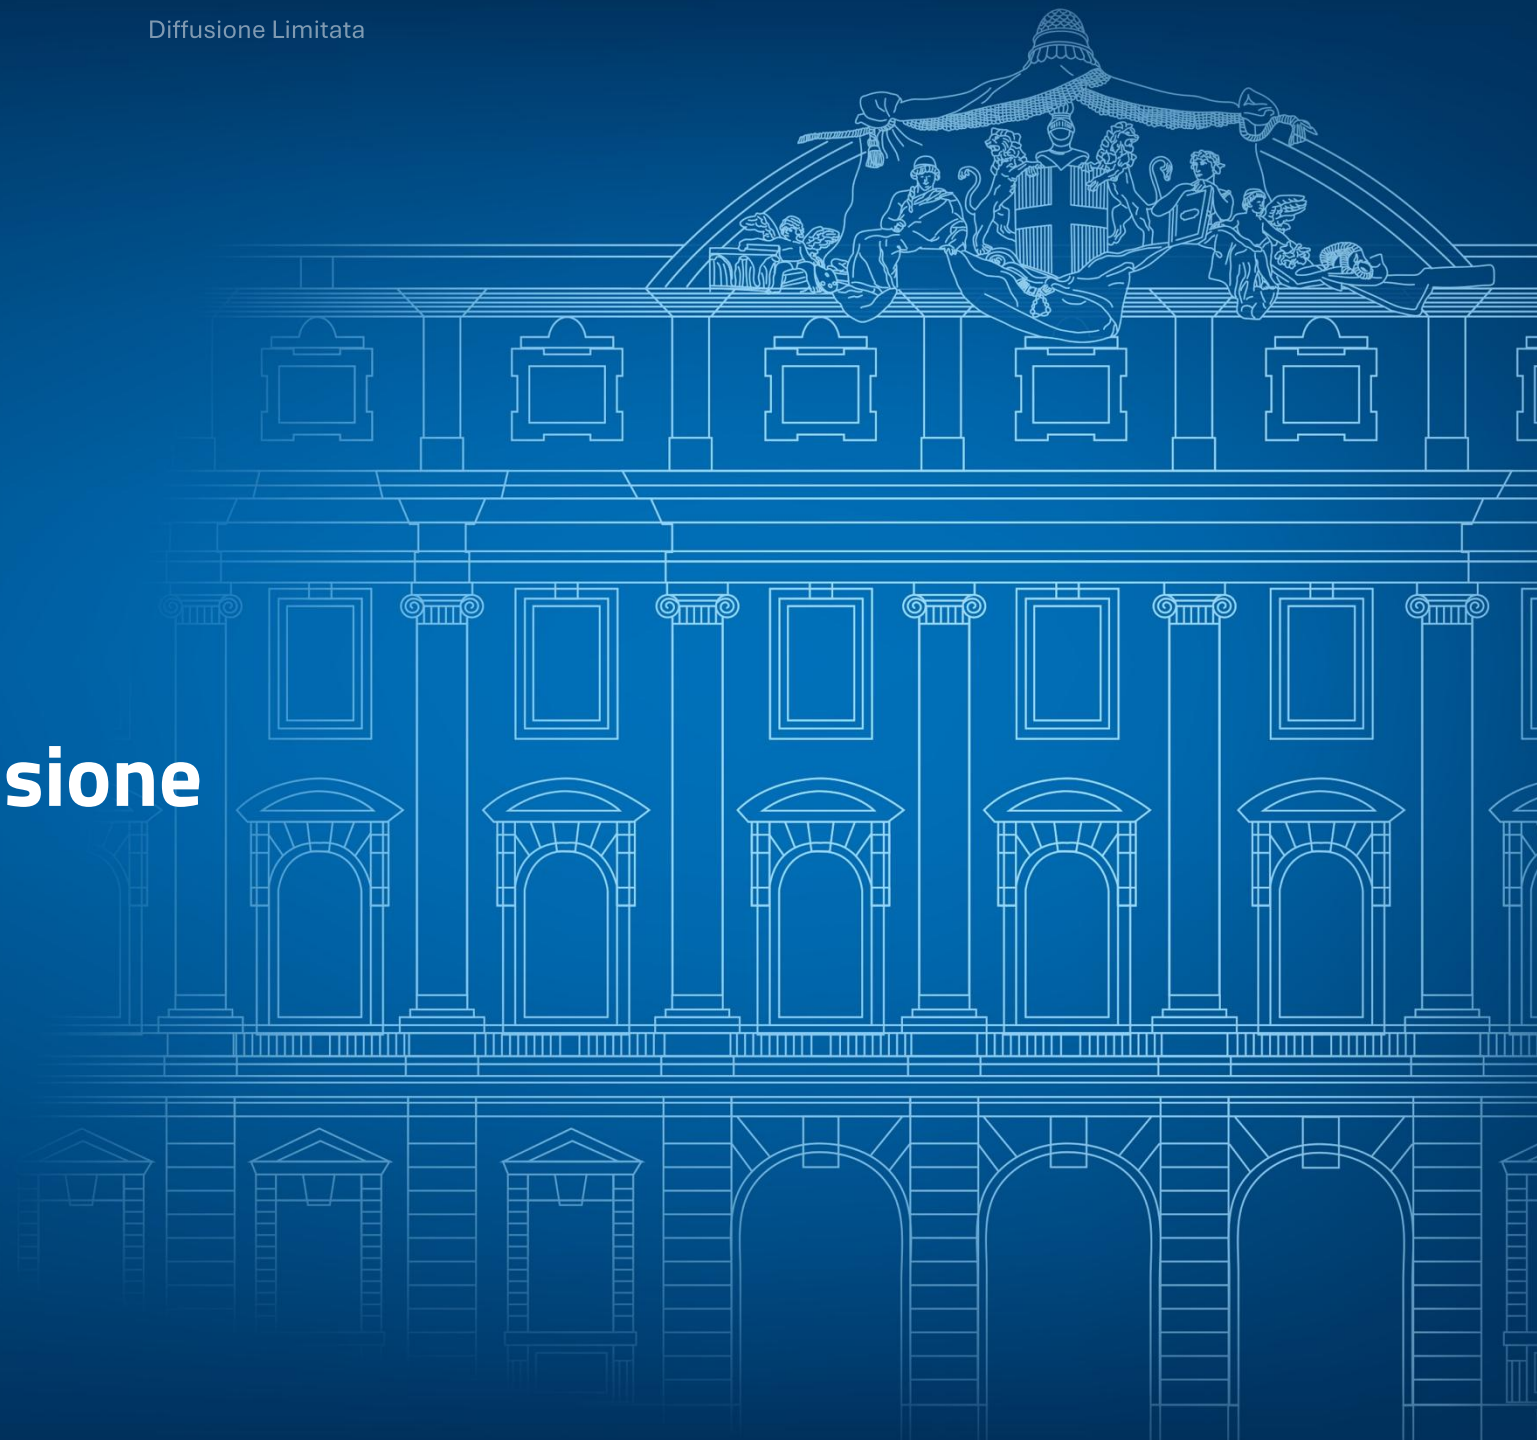

Linee Guida

[Link](#)



Scopo

Chiarimenti interpretativi e indicazioni operative uniformi in merito alle **modalità di conclusione degli interventi** e alle **evidenze documentali** richieste ai fini della dimostrazione e della rendicontazione del raggiungimento dei M&T del PNRR relativi ad interventi attuati dai Comuni e da loro associazioni.



Ambito di applicazione

Interventi per i quali **l'evidenza documentale è incentrata sul certificato di ultimazione dei lavori e/o sul certificato di regolare esecuzione/fornitura.**

Le Misure interessate sono riportate nell'Allegato **1, Sez. A +** ulteriori Misure sono riportate **nell'Allegato 1, Sez. B.**



Documenti da presentare




Lavori

- certificato di ultimazione dei lavori - *Allegato n. 2 - LG PNRR*;
- documento a comprova raggiungimento target (esempio km, mq, etc.,) il cui contenuto è indicato dalle Amministrazioni Titolari.



Servizi o forniture

- certificato di regolare esecuzione/fornitura - *Allegato n. 3 - LG PNRR*;
- certificato di verifica di conformità;
- **ovvero da ogni ulteriore documento previsto dalla normativa applicabile, idoneo ad attestare la ultimazione delle prestazioni.**
- documento a comprova raggiungimento target (esempio immatricolazioni, dispositivi, etc.,) il cui contenuto è indicato dalle Amministrazioni Titolari.

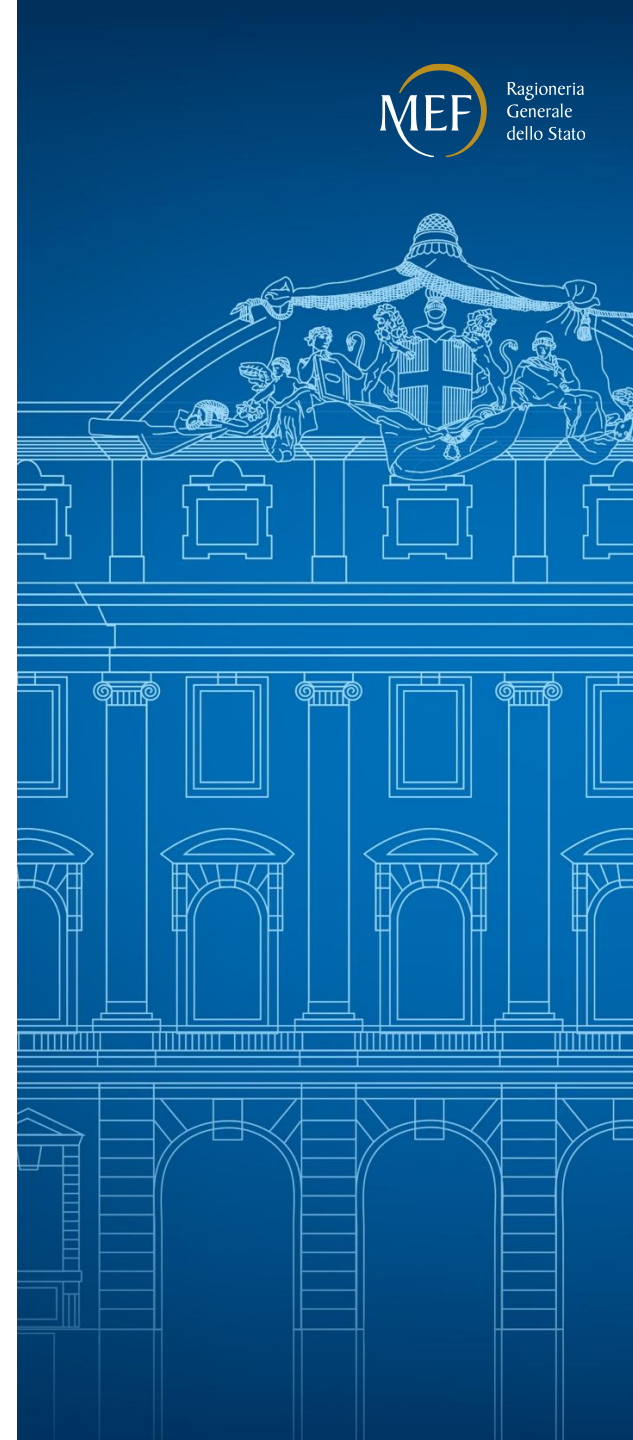



Certificato di ultimazione dei lavori – All. n.2 – LG PNRR [1/3]

REQUISITI MINIMI

- **Identificazione dell'intervento** (missione, componente, investimento);
- **Oggetto dell'appalto, sintetica descrizione e localizzazione dell'opera;**
- **Riferimenti contrattuali** (contratto, importo, CIG e/o CUP e/o CLP);
- **Data di emissione del certificato**, quale data rilevante ai fini della rendicontazione;
- **Sottoscrizione impresa affidataria, direttore dei lavori, visto del RUP.**



Eccezione

Sottoscrizione CUL [2/3]



Qualora **non sia possibile acquisire in un unico documento** tutte le informazioni necessarie e le tre sottoscrizioni, **il RUP può in ogni caso redigere una attestazione**, allegata alla documentazione di rendicontazione, recante le informazioni rilevanti (a titolo esemplificativo il verbale di fine lavori) e, ove necessario, idonea a integrare l'attestazione resa dall'operatore economico.



Certificato di regolare esecuzione/fornitura – All. n.3 LG PNRR [3/3]

REQUISITI MINIMI

- **Identificazione dell'intervento** (missione, componente, investimento);
- **Descrizione del servizio;**
- **Riferimenti contrattuali** (contratto, importo, CIG e/o CUP e/o CLP);
- **Data di emissione del certificato**, quale data rilevante ai fini della rendicontazione;
- **Sottoscrizione del RUP**, impresa affidataria e stazione appaltante.

Focus

Documentazione già presentata

- I certificati di ultimazione lavori e regolare esecuzione non devono essere ripresentati se:
 1. Sono già stati presentati e caricati sulla **piattaforma ReGiS** e contengono i **requisiti minimi** previsti dalle **linee guida**;
 2. Sono stati già trasmessi alla Commissione europea nell'ambito delle **procedure di rendicontazione** e rispetto ai quali non sono state **formulate osservazioni**;
 3. È già stato **presentato il certificato o l'attestazione di collaudo**, redatti secondo quanto previsto dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Se la documentazione già presentata **non contiene i requisiti minimi** deve essere **integrata** mediante la presentazione di idonea documentazione aggiuntiva recante i dati mancanti, **conformemente alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni.**





Focus: lavori residuali

CASI A TITOLO ESEMPIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:



60 gg per il completamento dei lavori residuali di modesta entità



Riferimenti normativi

Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, all'art. 1 "Attività e compiti del direttore dei lavori" lettera "t"

Categoria	Lavorazione	Riconducibilità a lavori di piccola entità
Finiture superficiali	Ritocchi di pitturazione, stuccature o sigillature	✓
Installazioni minori	Targhe, cartelli, paraspigoli	✓
Regolazioni impianti	Tarature, settaggi e regolazioni, sostituzione interruttori	✓
Sistemazioni esterne leggere	Ripristini puntuali, pulizia aree	✓
Interventi strutturali	Modifiche murarie o impiantistiche rilevanti, rifacimenti di intonaco, posa in opera di massetti, di strati impermeabilizzanti, di pavimentazioni, collocazione infissi, etc...	⊘
Lavori che incidono sulla sicurezza	Interventi su impianti non funzionanti, realizzazione barriere mancanti, etc...	⊘
Lavori che impediscono l'uso dell'opera	Interventi volti all'agibilità dei luoghi o all'attivazione di impianti, etc...	⊘



Scadenze 2026

Le misure che, secondo la Decisione di esecuzione del Consiglio del 30 marzo 2026 (CID), presentano una scadenza intermedia **T1/2026 (marzo 2026)**, ai fini della rendicontazione e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, tale scadenza deve **intendersi ricondotta al termine T2/2026 esclusivamente per le misure di cui Allegato 4.** (All. 4 LG).

Il termine **T2/2026** prevede che le operazioni di attuazione siano integralmente **completate entro il 30 giugno 2026.**

Il termine può essere spostato "IN VIA ECCEZIONALE" al massimo entro il **31 agosto 2026** su richiesta del soggetto attuatore e con autorizzazione delle **single Amministrazioni Titolari**

Per i progetti per i quali l'ammissione a finanziamento è intervenuta a seguito di **avvisi pubblici di selezione degli interventi adottati nel 2024 e 2025** le amministrazioni titolari possono autorizzare un termine **superiore al 30 giugno e comunque non superiore al 31 agosto 2026.** le **scadenze intermedie nazionali non producono effetti diretti ai fini della rendicontazione.**

[Link](#)





Recap

Termine ultimo adempimenti 2026



30 giugno 2026

**Termine ultimo di attuazione
degli interventi**

Entro 5 gg

dalla conclusione dei
lavori/servizi/forniture:
caricamento **certificato ultimazione
lavori** (All. 2) o **certificato di regolare
esecuzione / fornitura** (All.3)

+

**Documentazione a comprova del
raggiungimento del target**



Termine ultimo:
5 luglio

Entro 15 gg

dalla conclusione dei lavori:
**caricamento della
documentazione** ritenuta
necessaria dalle **AATT** ai fini
del **controllo** (es: DNSH)



Termine ultimo:
15 luglio

31 Agosto 2026

Completamento delle attività per
gli interventi per i quali
l'ammissione a finanziamento è
intervenuta a seguito di **avvisi
pubblici di selezione** degli
**interventi adottati nel 2024 e
2025**



Adempimenti sul SI ReGiS

Tile Anagrafica Progetto



Cronoprogramma



Fase di
**Esecuzione / Esecuzione lavori
dell'iter di progetto**

- ❖ **"certificato di fine lavori"** per certificato di fine lavori e certificato di verifica conformità o regolare esecuzione/fornitura);



Carica Allegato

Certificato di fine lavori

Raggiungimento Target

- ❖ **"raggiungimento target"** (per documentazione a comprova del conseguimento del target)





Ragioneria
Generale
dello Stato

03.

**Quadro sinottico
adempimenti chiusura
progetto**



Documentazione – ItaliaDomani

Home Il Piano ▼ Interventi ▼ Opportunità ▼ Notizie Catalogo Open Data **Strumenti ▼**  CERCA

In questa sezione sono presenti i principali documenti di approfondimento relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Sfoglia documenti per categoria



Documenti per i Comuni





Quadro sinottico – Chiusura progetto [1/2]



Misura	Submisura	Descrizione submisura	Amministrazione Titolare (AT)	Descrizione di ogni traguardo e obiettivo	Conseguimento CID (aggiornamento AT)		
					Trimestre	Anno	TIPOLOGIA
M2C1I3.1	M2C1I3.1	Isole verdi	MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	<p>Certificati di completamento dei lavori relativi a progetti integrati in 19 piccole isole che prevedano almeno tre diversi tipi di intervento tra quelli ammissibili elencati di seguito. Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ efficientamento energetico; ▪ creazione e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di ricarica della mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; ▪ costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; ▪ raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; ▪ costruzione/ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; ▪ sistemi di desalinizzazione; ▪ impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese, ad esempio, l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore e le energie marine rinnovabili (quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice); ▪ misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; ▪ interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture, che riguardano ad esempio i dispositivi di stoccaggio, l'integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, le smart grid, i sistemi innovativi di gestione e monitoraggio 	T2	2026	LAVORI



Quadro sinottico – Chiusura progetto [2/2]

Conseguimento target PNRR UE						Documentazione per controlli AT		Link documentazione	Note
Documentazione performance 1	Documentazione performance 2	Metodologia calcolo target	Sezione ReGiS – Caricamento	Modelli scaricabili	Termine caricamento	Documentazione	Termine caricamento		
Certificato fine lavori o certificato regolare esecuzione	-	-	<p>Fase di Esecuzione/Esecuzione lavori dell'iter di progetto</p> <p>Il SA seleziona le tipologiche "certificato di fine lavori" (per certificato di fine lavori e certificato di verifica conformità o regolare esecuzione/fornitura) e "raggiungimento target" (per documentazione a comprova del conseguimento del target).</p>	-	Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori/servizi/forniture	-	-	Sistema di Gestione e Controllo - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	<p>Resta ferma la validità dei certificati già acquisiti e caricati sulla piattaforma ReGiS che presentino i requisiti minimi indicati nelle LG Conclusione Interventi PNRR;</p> <p>Resta ferma la validità dei certificati già trasmessi alla Commissione europea nell'ambito delle procedure di rendicontazione e rispetto ai quali non sono state formulate osservazioni</p>



Ragioneria
Generale
dello Stato

04.

**Decreto-legge 19 febbraio
2026, n. 19, convertito in
legge 20 aprile 2026, n. 50**



Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50 [1/3]

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, **entro il decimo giorno di ciascun mese**, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento**, unitamente al relativo **stato di avanzamento finanziario e procedurale** rilevato alla fine del mese precedente, con **l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento**, ovvero **l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento**, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituitivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 10



Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50 [2/3]

Focus

I SSAA provvedono a rendere disponibile su ReGiS:



Entro il 10° giorno di ciascun mese il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento;

+



attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero **l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità**

ReGiS

Allegati dell'Anagrafica di Progetto selezionando 3 tipologiche:

- ❖ Attestazione ex articolo 1 del dl 19/2026 - completo conseguimento dell'obiettivo PNRR
- ❖ Attestazione ex articolo 1 del dl 19/2026 - mancato conseguimento dell'obiettivo PNRR
- ❖ Attestazione ex articolo 1 del dl 19/2026 - criticità nel conseguimento dell'obiettivo PNRR

Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito in legge 20 aprile 2026, n. 50 [3/3]

Tile
Anagrafica
Progetto



Allegati


Carica Allegato

Att.ne Completo Conseguimento Ob. PNRR

Att.ne Criticità Conseguimento Ob. PNRR

Att.ne Mancato Conseguimento Ob. PNRR

! (Warning icon)

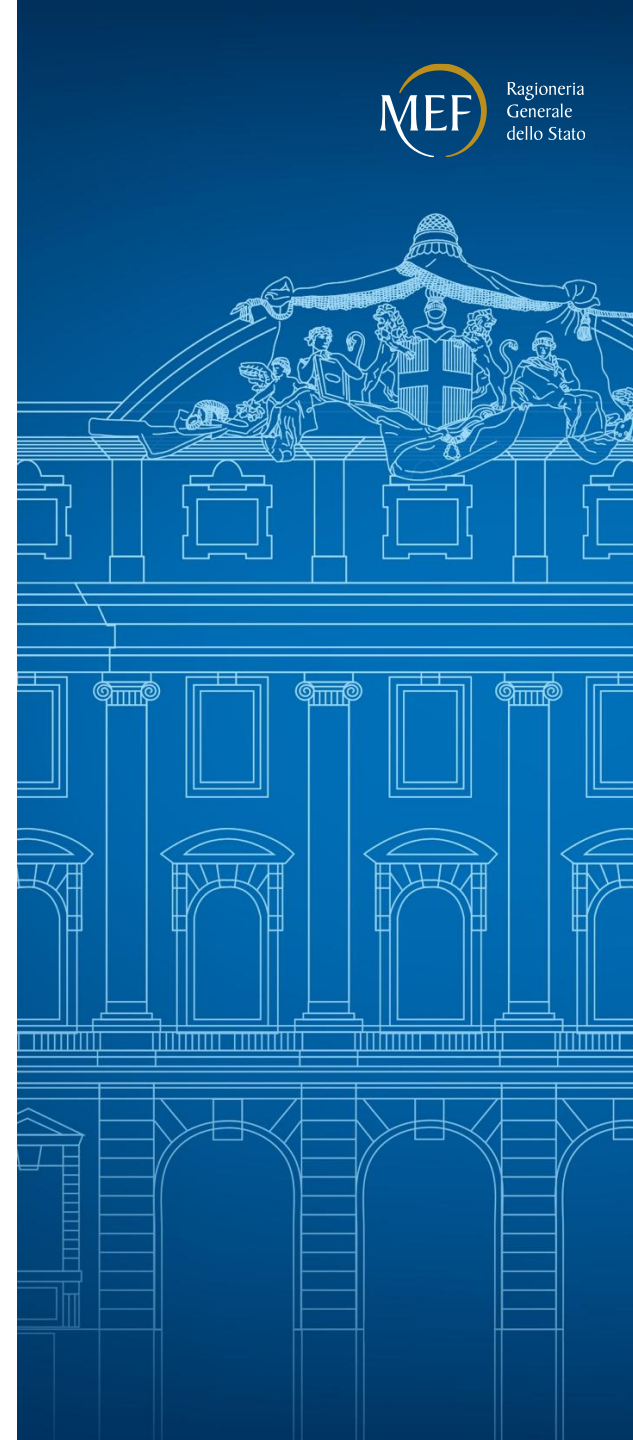



Ragioneria
Generale
dello Stato

04.

CONCLUSIONI



Prossimi passi





Ragioneria
Generale
dello Stato



GRAZIE!
